BLVC PLAN

Onderhoud en Markering Nieuwe Purmerweg & Purmerweg



Opdrachtgever : Gemeente Amsterdam
Opdrachtnemer : Dura Vermeer Infra Regio Noord West
Coördinatienummer : 20195557
Projectnaam : Onderhoud en markering Nieuwe Purmerweg
Projectnummer : 45197100
Documentnr. : 45197100-00004
Status : Definitief

Autorisatie:	Opsteller:	Acceptatie door opdrachtgever:
Naam		
Datum	30 september 2019	30 september 2019
Handtekening		

Versiebeheer

Revisie	Datum	Wijzigingen ten opzicht van vorige revisie	Reden wijziging
1	30-09-2019	Definitief	

Distributielijst

	Naam	Functie	Bedrijf
01	Sjoerd Vink	Werkvoorbereider	Dura Vermeer
02	Marco Dudink	Hoofd Uitvoerder	Dura Vermeer
03	Bastiaan van Leeuwen	Uitvoerder	Dura Vermeer
04	Kees van der Valk	Projectleider	Gemeente Amsterdam

Bijbehorende documenten

Documentnummer	Documentennaam
45197100 - TVM Afzetting Fase 1	Verkeersplan Afzetting Fase 1
45197100 - TVM Afzetting Fase 2	Verkeersplan Afzetting Fase 2
45197100 - TVM Afzetting Fase 3	Verkeersplan Afzetting Fase 3
45197100 - TVM Afzetting Fase 4	Verkeersplan Afzetting Fase 4
45197100 - Omleidingsroute	Omleidingstekening doorgaand verkeer.

Inhoudsopgave

VERSIEBEHEER **1**

1 INLEIDING **3**

1.1 Aanleiding 3
1.2 Doel 3

2 PROJECTBESCHRIJVING **4**

2.1 Werkzaamheden 4
2.2 Planning 4

3 OMGEVINGSSCAN **5**

3.1 Verkeer netwerken 5

4 FASERINGSPLAN **6**

4.1 1e nacht – Fase 1 (15 oktober – 16 oktober) 6
4.2 1e nacht – Fase 2 (15 oktober – 16 oktober) 6
4.3 1e nacht – Fase 3 (15 oktober – 16 oktober) 6
4.4 1e nacht – Fase 4 (15 oktober – 16 oktober) 7
4.5 2e nacht (16 oktober – 17 oktober) 7
4.1 3e nacht (17 oktober – 18 oktober) 7

5 COMMUNICATIE **8**

5.1 Doelgroepen 8
5.2 Communicatieboodschap 8
5.3 Communicatiemiddelen 8
5.4 Communicatiekalender 8
5.5 Contactpersonen 8

1 Inleiding

1.1 Aanleiding

In verband met de huidige slechte staat van zowel de wegconstructie als de belijning van de Purmerweg & Nieuwe Purmerweg zijn deze aan vervanging toe. De Purmerweg & Nieuwe Purmerweg bevinden zich in Tuindorp-Nieuwendam en zijn onderdeel van Amsterdam Noord.

Om de bereikbaarheid van het omliggende gebied en de leefbaarheid voor de aan- en omwonenden zo min mogelijk te beïnvloeden worden de werkzaamheden in de nacht uitgevoerd.

1.2 Doel

Het doel van een BLVC-plan is het onderzoeken, beschrijven en in kaart brengen van de maatregelen die nodig zijn om een goede balans te creëren tussen veilig en efficiënt bouwen en het handhaven van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van de directe omgeving. Tevens is het bedoeld om bestuurders, belanghebbenden en geïnteresseerden te laten zien dat Maatregelen zorgvuldig en in overleg met de belanghebbenden zijn voorbereid. Ten slotte is het doel de aannemer bestekvoorwaarden (dan wel uitgangspunten) te geven met betrekking tot BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie).

2 Projectbeschrijving

2.1 Werkzaamheden

I.v.m. asfaltschades worden op een aantal locaties op de Nieuwe Purmerweg & Purmerweg de asfaltdeklaag vervangen. Nadat het asfalt vervangen is wordt er nieuwe thermoplastische markering aangebracht.

In onderstaande figuur is de ligging van het projectgebied in het rood aangegeven.

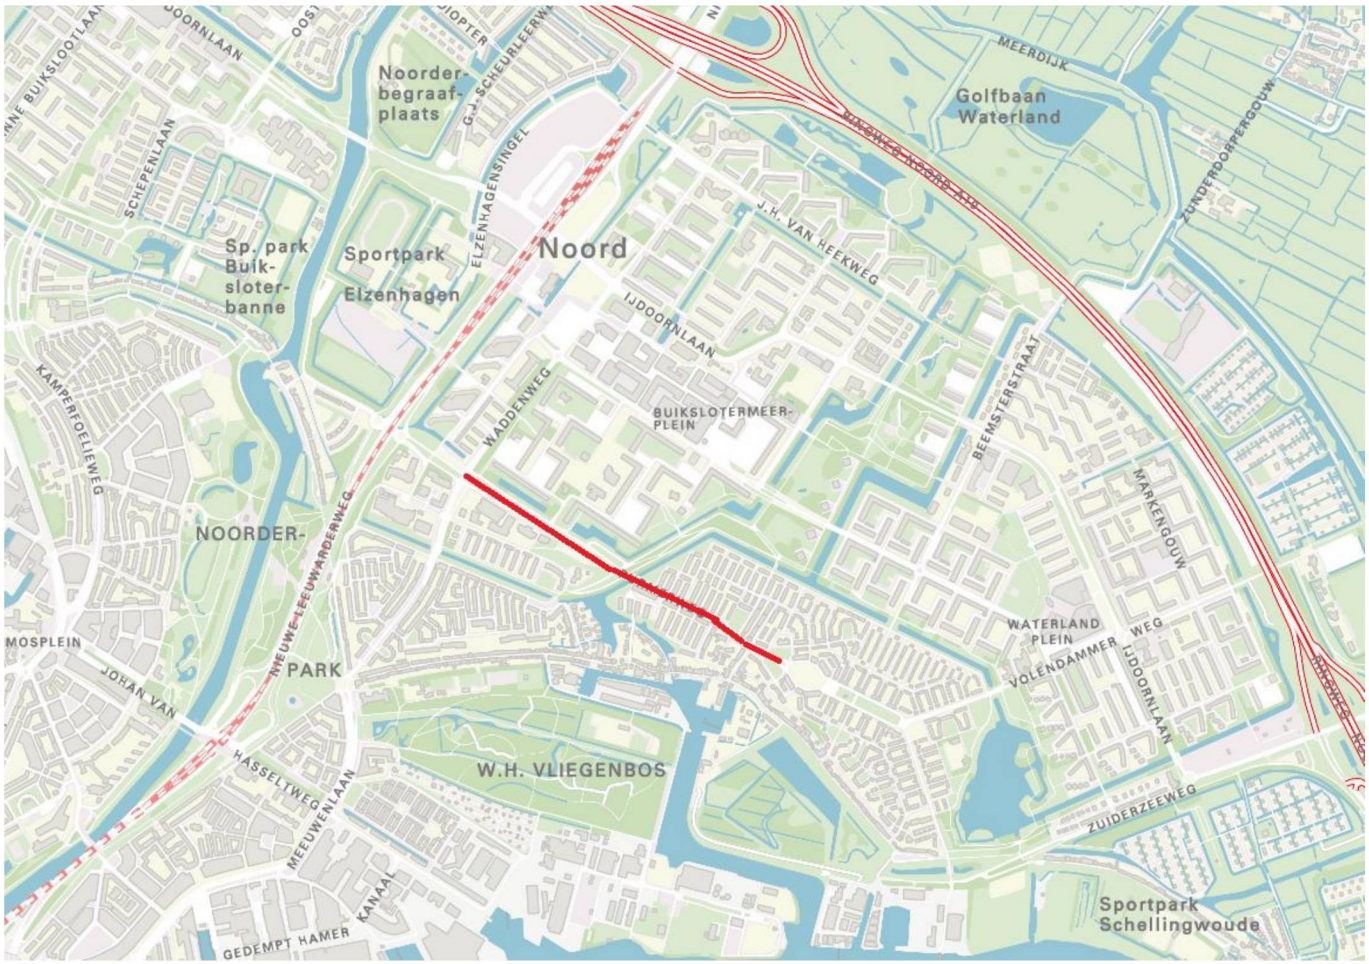

De werkzaamheden die onder andere uitgevoerd zullen worden, zijn:

- Plaatsen afzettingen en omleidingsborden;
- Verwijderen huidige markering;
- Herstelwerkzaamheden aan asfalt;
- Het aanbrengen van nieuwe thermoplastische markering;
- Het aanbrengen van verkeersdrempels.

2.2 Planning

De werkzaamheden worden in 3 nachten uitgevoerd. De eerste nacht is van 15 op 16 oktober, de tweede nacht is van 16 op 17 oktober & de laatste nacht is van 17 op 18 oktober.

3 Omgevingsscan

3.1 Verkeer netwerken

Auto	
De rijbanen van de Nieuwe Purmerweg & Purmerweg maken geen onderdeel uit van plusnet auto	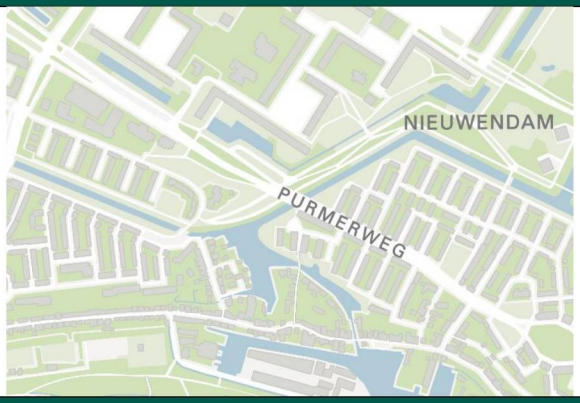
Fiets	
De Nieuwe Purmerweg & Purmerweg maken deel uit van Plusnet fiets, maar aan het fietspad worden geen werkzaamheden uitgevoerd	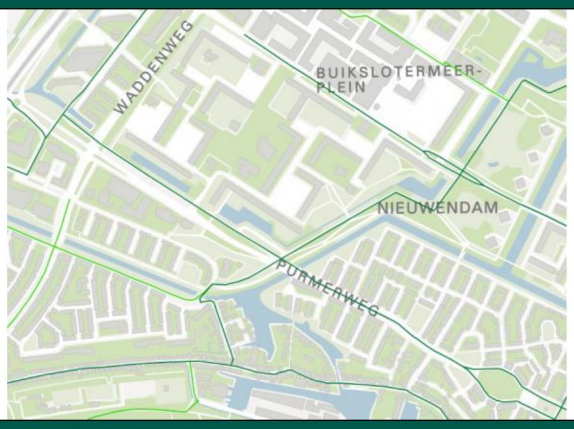
Voetganger	
Het voetpad is geen onderdeel van het Plusnet Voetgangers.	
OV	
De Nieuwe Purmerweg & Purmerweg maken deel uit van Plusnet Bus. Buslijn 35 en nachtbus 291 rijden over deze wegen.	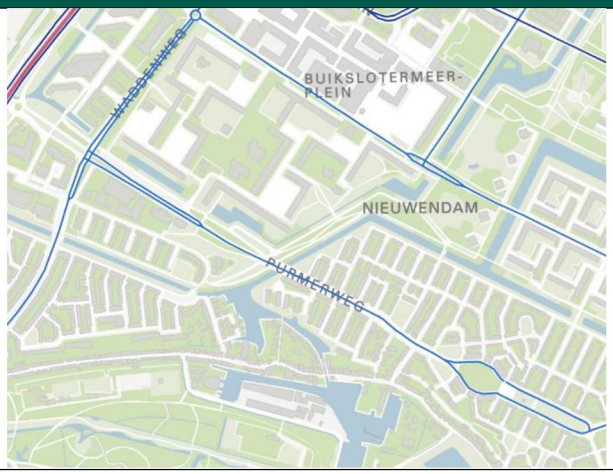

4 Faseringsplan

De werkzaamheden worden in 3 nachten uitgevoerd, waarbij er per nacht diverse faseringen zijn.

4.1 1e nacht – Fase 1 (15 oktober – 16 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Het vervangen van asfaltschades & verwijderen van bestaande markeringen
Werkterrein	Rijbaan Nieuwe Purmerweg & Purmerweg richting Purmerplein.
Planning	15 oktober 19:00 uur tot 22.00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor buslijn 35 worden er afzettingen geplaatst zodat deze ongestoord doorgang heeft.
Nood- en hulpdiensten	Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

4.2 1e nacht – Fase 2 (15 oktober – 16 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Het vervangen van asfaltschades & verwijderen van bestaande markeringen
Werkterrein	Rijbaan Nieuwe Purmerweg & Purmerweg richting Waddenweg.
Planning	15 oktober/16 oktober 22:00 uur tot 01.00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor buslijn 35 worden er afzettingen geplaatst zodat deze ongestoord doorgang heeft.
Nood- en hulpdiensten	Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

4.3 1e nacht – Fase 3 (15 oktober – 16 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Het vervangen van asfaltschades & verwijderen van bestaande markeringen
Werkterrein	Rijbaan Purmerweg richting Purmerplein.
Planning	16 oktober 01.00 uur tot 03:00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor nachtbuslijn 291 wordt er een om en om regeling getroffen om langs het werkterrein te rijden. Hier zal minimale hinder door ontstaan.
Nood- en hulpdiensten	Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

4.4 1e nacht – Fase 4 (15 oktober – 16 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Het vervangen van asfaltschades & verwijderen van bestaande markeringen
Werkterrein	Rijbaan Purmerweg richting Waddenweg.
Planning	16 oktober 03.00 uur tot 05:00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor nachtbuslijn 291 wordt er een om en om regeling getroffen om langs het werkterrein te rijden. Hier zal minimale hinder door ontstaan.
Nood- en hulpdiensten	Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

4.5 2e nacht (16 oktober – 17 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Het aanbrengen van thermoplastische markeringen
Werkterrein	Rijbaan Nieuwe Purmerweg & Purmerweg
Planning	16 oktober / 17 oktober 19.00 uur tot 05:00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor nachtbuslijn 291 wordt m.b.v. een rijdende afzetting om het werkterrein heen geleid.
Nood- en hulpdiensten	Nood- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

4.1 3e nacht (17 oktober – 18 oktober)

Beschrijving werkzaamheden	
Werkzaamheden	Reservenacht
Werkterrein	Rijbaan Nieuwe Purmerweg & Purmerweg
Planning	17 oktober / 18 oktober 19.00 uur tot 05:00 uur.
Gevolgen	
Auto	Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de IJdoornlaan. Bestemmingsverkeer kan via de IJdoornlaan en Purmerplein omrijden tot in de woonwijken.
Fiets	Fietsers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
Voetganger	Voetgangers ondervinden geen hinder aan de werkzaamheden.
OV	Voor nachtbuslijn 291 wordt m.b.v. een rijdende afzetting om het werkterrein heen geleid.
Nood- en hulpdiensten	Noord- en hulpdiensten ondervinden geen hinder van de werkzaamheden. Deze kunnen altijd langs het werkterrein rijden.

5 Communicatie

5.1 Doelgroepen

De bewoners aan de Purmerweg.

5.2 Communicatieboodschap

In verband met de onderhoudswerkzaamheden wordt de Nieuwe Purmerweg en Purmerweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer wordt langs het werk geleid.

5.3 Communicatiemiddelen

Vooraankondiging met verkeersborden & een Bewonersbrief..

5.4 Communicatiekalender

Schriftelijk en digitaal	Wanneer	Doelgroep	Verantwoordelijke
Bewonersbrief	Start werkzaamheden	Bewoners	Communicatie V&OR
Vooraankondiging (gele borden) aan begin fietspad	2 weken voor start werkzaamheden	Gebruikers	Aannemer Dura Vermeer

5.5 Contactpersonen

Functie	Naam	Telefoonnummer	Email
Omgevingsmanager			
Projectleider gemeente			
Toezichthouder			
Uitvoerder aannemer			
Politie			
Brandweer			
GVB	Afd. tijdelijke verkeersmaatregelen	020 460 6421	verkeersregie@gvb.nl
Stadsdeelregisseur			

Bijlage(n)

Bijlage Nummer	Documentnummer	Documentennaam
Bijlage 1	45197100 - TVM Afzetting Fase 1	Verkeersplan Afzetting Fase 1
Bijlage 2	45197100 - TVM Afzetting Fase 2	Verkeersplan Afzetting Fase 2
Bijlage 3	45197100 - TVM Afzetting Fase 3	Verkeersplan Afzetting Fase 3
Bijlage 4	45197100 - TVM Afzetting Fase 4	Verkeersplan Afzetting Fase 4
Bijlage 5	45197100 - Omleidingsroute	Omleidingstekening doorgaand verkeer.

Bijlage 1: Verkeersplan Afzetting Fase 1

uitgezonderd
uussen

Definitieve bebording, in strijd met tijdelijke maatregel, moet worden afgeplakt.

Legenda

- Barrier
- Klemmfix
- Afzethek
- Kegel
- Baakschild
- Oml. auto
- Oml. fiets
- Oml. voetg.
- Oml. OV
- Oml. werkverk.
- Oml. Laad/los
- Werkterrein /geen functie

Gemeente Amsterdam
Stadswerken
Afdeling: Infra en Service

Bezoekadres:
Theemsweg 28
1043 BJ Amsterdam

Postbus 94648
1090 GP Amsterdam

Opdrachtgever	:	Dura Vermeer
Project	:	Nieuwe Purmerweg
Onderdeel	:	afzetting
Fase	:	1

Behoort bij:

Naam	Paraaf	Datum Wijziging

Schaal: n.v.t.	Printdatum: 23-9-2019			
TVM-Projectnummer: 8747	Medewerker realisatie projecten:	Tekeningnr:	Wijziging:	Aantal tekeningen:

\\swappams0090.basis.lan\tvmproductie$\tvmgrafisch\lopende_projecten\8747_NIEUWE_PURMERWEG\DGN\fase1.afz.dgn

Bijlage 2: Verkeersplan Afzetting Fase 2

uitgezonderd bussen

uitgezonderd bussen

30

30

Definitieve bebording, in strijd met tijdelijke maatregel, moet worden afgeplakt.

Legenda

- Barrier
- Klemmfix
- Afzethek
- Kegel
- Baakschild
- Oml. auto
- Oml. fiets
- Oml. voetg.
- Oml. OV
- Oml. werkverk.
- Oml. Laad/los
- Werkterrein /geen functie

Bezoekadres:
Theemsweg 28
1043 BJ Amsterdam
Postbus 94648
1090 GP Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Stadswerken
Afdeling: Infra en Service

Opdrachtgever	:	Dura Vermeer
Project	:	Nieuwe Purmerweg
Onderdeel	:	afzetting
Fase	:	2

Behoort bij:	Naam	Paraaf	Datum Wijziging

Schaal:	Printdatum:			
n.v.t.	23-9-2019			
TVM-Projectnummer:	Medewerker realisatie projecten:	Tekeningnr:	Wijziging:	Aantal tekeningen:
8747				

\\swappams0090.basis.lan\tvmproductie$\tvmgrafisch\lopende_projecten\8747_NIEUWE_PURMERWEG\DGN\fase2.afz.dgn

Bijlage 3: Verkeersplan Afzetting Fase 3

Nieuwe Purmerweg
Purmerweg
Grote Diestraat
Grote Die
Kleine Die
Kleine Diestraat
Hoogeveldstraat
Molenstraat
Waverveldstraat
Hoornestraat
Nieuwendammerdijk
Nieuwendammerstraat
Nieuwendammerham
Nieuwendammerham Molenpad
Nieuwendammerham Stuwpad
Nieuwendammerham Sluispad
Pereboomsloot
Grote Haven
Breede Kerkepad
Kerkepad
Hemmpad
Molenpad
Molenlaan
Molenstraat
Nellenkoolstraat
Nieuwendammerstraat
Oppenbeekpad
Berkhoutlaan
Berkhoutplein
Erfelaanstraat
Hodijkstraat
Scheermeerstraat
Meeuwenlaanstraat
Meeuwenlaanplein
Waterpangpad
Waterpangweg
Schoolsteeg
Schoolstraat
Kwadijkpad
Buitenoostermerdijk
Dekkersmeerstraat
Dekkersmeerplein
Herendrukkerstraat
Ijsendammerstraat
Kwadijkstraat
Purmerplein
Purmerpad
Schermerstraat
Schermeerstraatsteeg
Meeuwenlaan
Meeuwenplein
Wagenmakerstraat
Scheermeerstraatsteeg
Pereboomsloot
Nieuwendammerdijk
Nieuwendammerham
Nieuwendammerham Molenpad
Nieuwendammerham Stuwpad
Nieuwendammerham Sluispad
Kleine Die
Grote Die

Bijlage 4: Verkeersplan Afzetting Fase 4

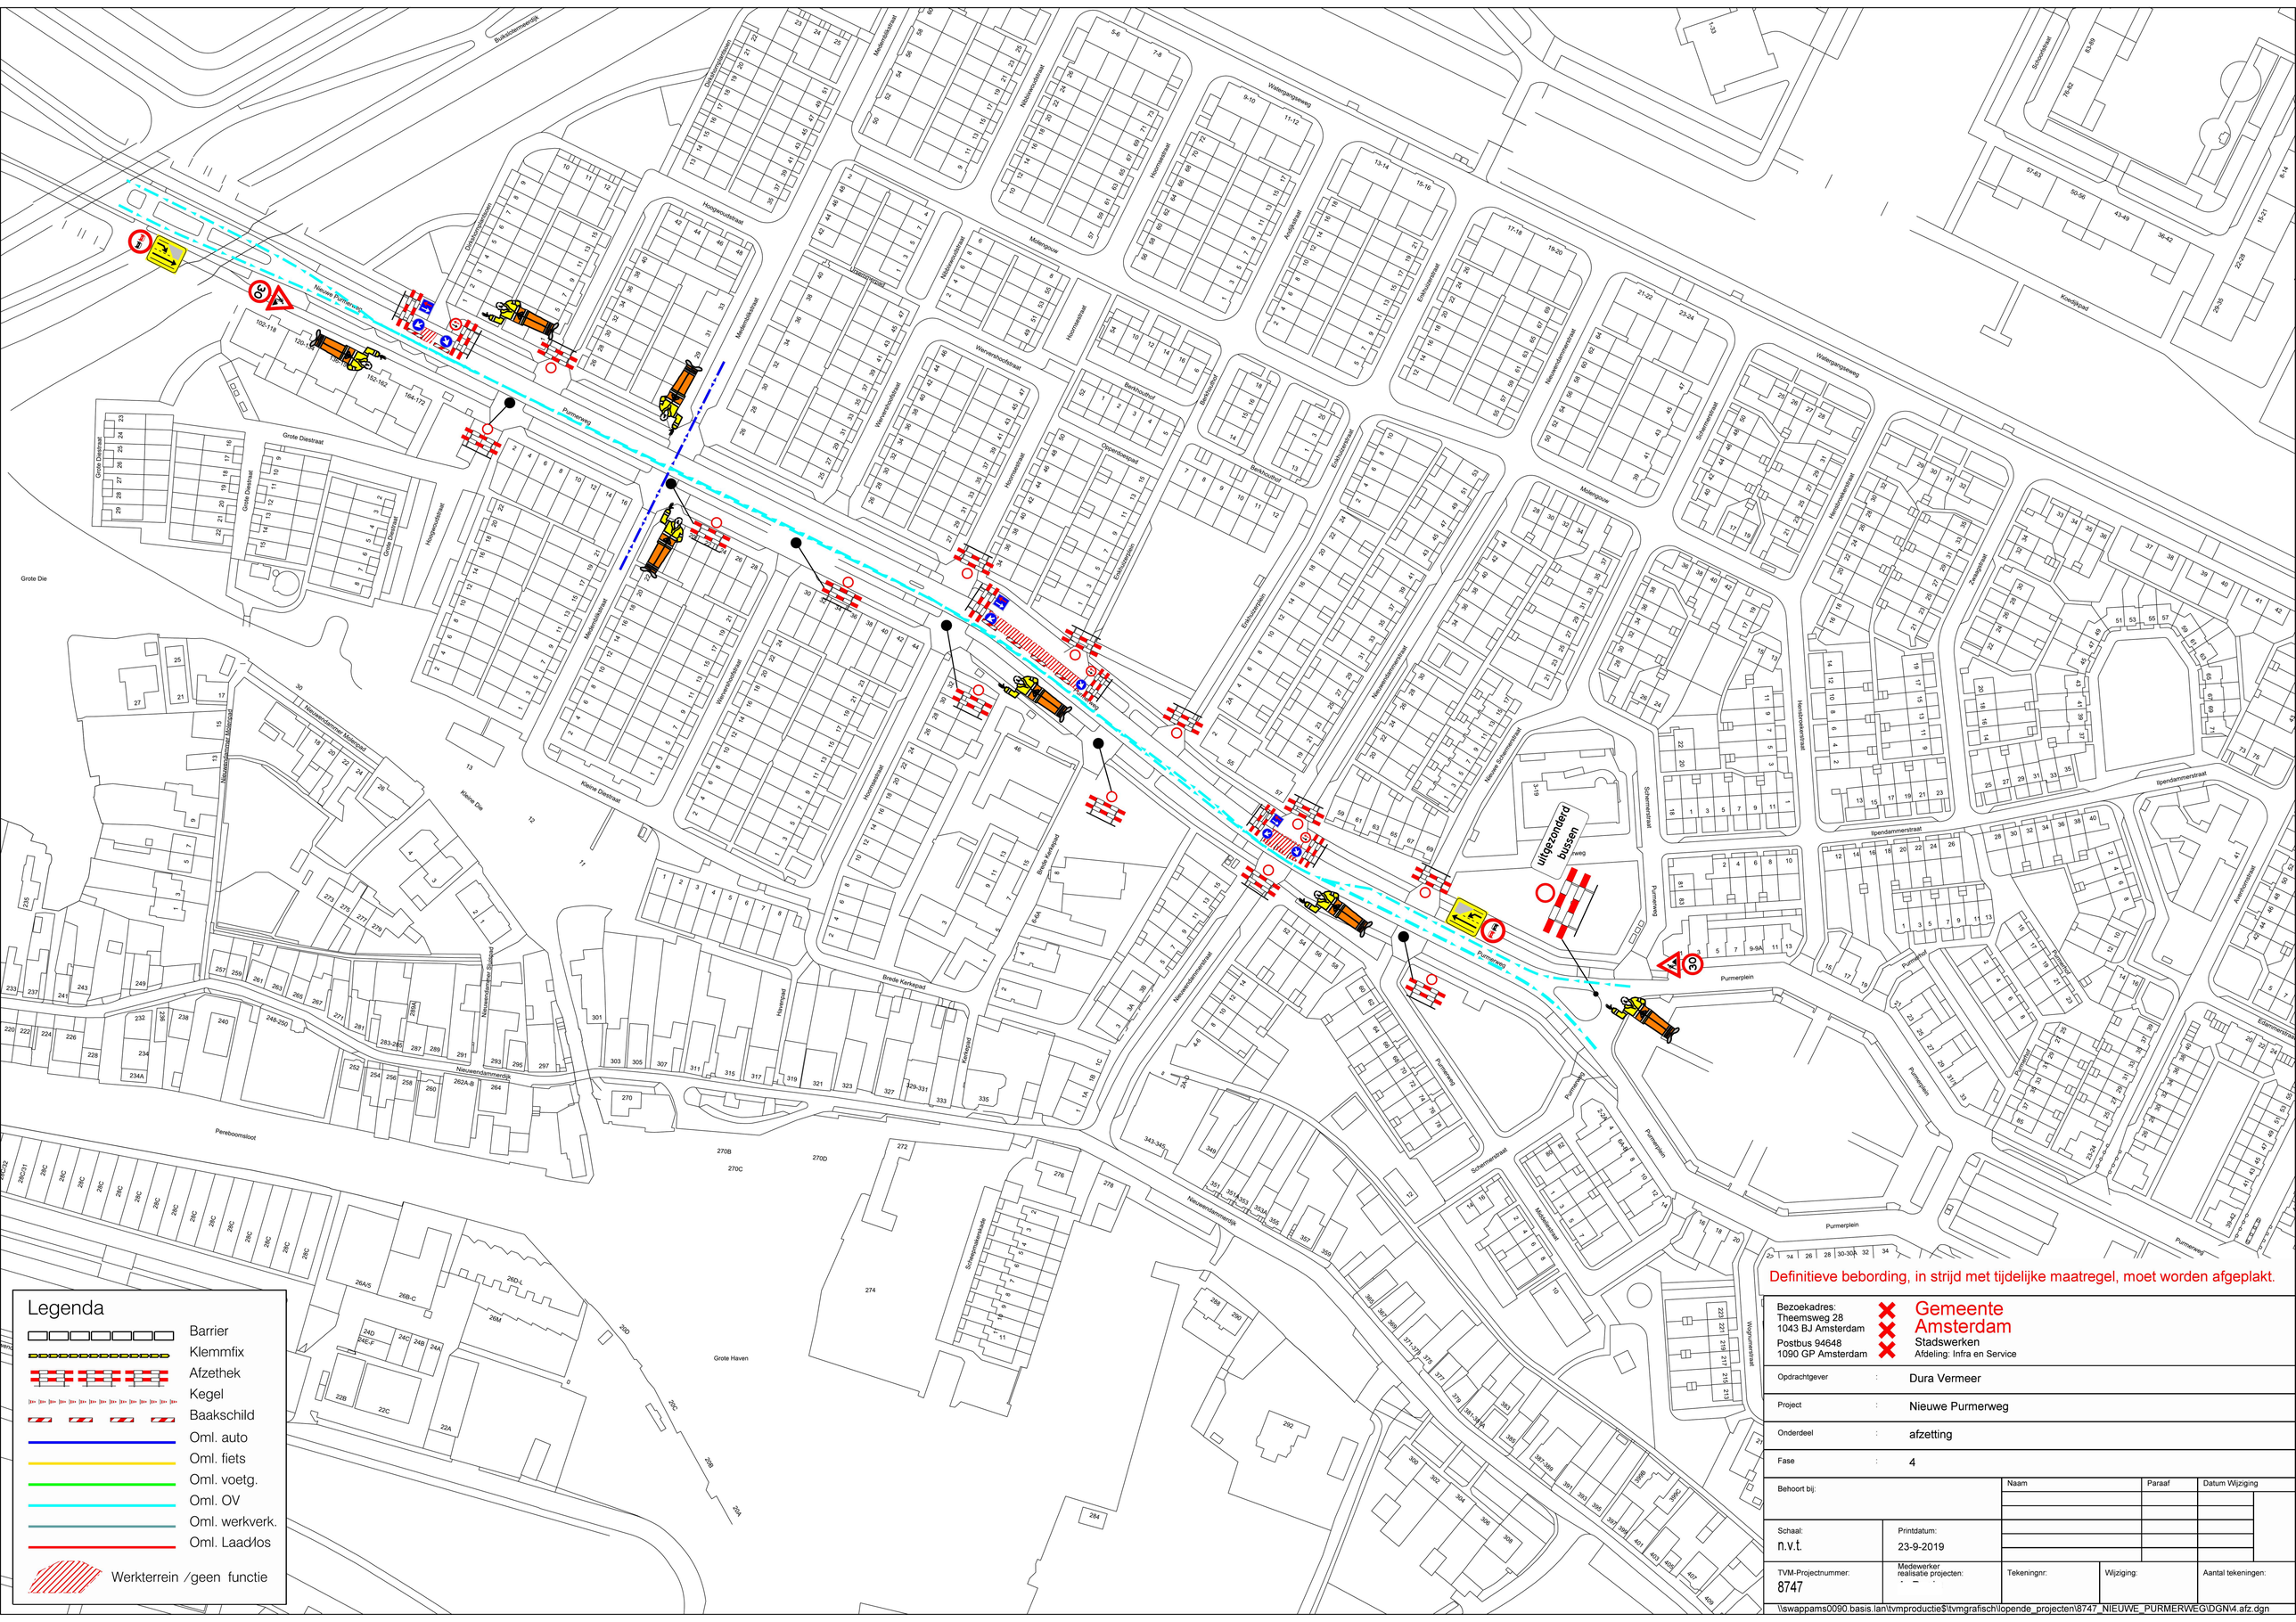
Nieuwe Purmerweg
Purmerweg
Purmerplein
Nieuwendammerdijk
Nieuwendammerstraat
Molenpad
Molenlaan
Molenstraat
Hoornestraat
Hoornedijk
Hoogendijkstraat
Wervershoofdstraat
Werversdijkstraat
Erfdijkstraat
Erfdijkpad
Erfdijkstraatje
Oppenbaspad
Berkhoutlaan
Berkhoutpad
Hoofdstraat
Nieuwendammerstraatje
Schermerstraat
Schermerdijk
Schermerstraatje
Nieuwe Schermerstraat
Nieuwe Schermerdijk
Nieuwe Schermermolenpad
Nieuwe Schermermolenstraat
Nieuwe Schermermolenstraatje
Nieuwe Schermermolendijk
Nieuwe Schermermolenlaan
Nieuwe Schermermolenplein
Nieuwe Schermermolenplantsoen
Nieuwe Schermermolenhof
Nieuwe Schermermolenpark
Nieuwe Schermermolenkade
Nieuwe Schermermolenweg

Bijlage 5: Omleidingstekening

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Purmerplein volg: P

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Purmerplein volg: P

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Purmerplein volg: P

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Waddenweg volg: W

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Waddenweg volg: W

omleiding

Nieuwe Purmerweg afgesloten

Waddenweg volg: W

omleiding

Legenda

- Barrier
- Klemmfix
- Afzethek
- Kegel
- Baakschild
- Oml. auto
- Oml. fiets
- Oml. voetg.
- Oml. OV
- Oml. werkverk.
- Oml. Laad/los
- Werkterrein /geen functie

Definitieve bebording, in strijd met tijdelijke maatregel, moet worden afgeplakt.

Bezoekadres:
Theemsweg 28
1043 BJ Amsterdam
Postbus 94648
1090 GP Amsterdam

Gemeente Amsterdam
Stadswerken
Afdeling: Infra en Service

Opdrachtgever	:	Dura Vermeer
Project	:	Nieuwe Purmerweg
Onderdeel	:	omleiding
Fase	:	

Behoort bij:		Naam	Paraaf	Datum Wijziging
Schaal: n.v.t.	Printdatum: 11-9-2019			
TVM-Projectnummer: 8747	Medewerker realisatie projecten:	Tekeningnr:	Wijziging:	Aantal tekeningen:

\\swappams0090.basis.lan\tvmproductie$\tvmgrafisch\lopende_projecten\8747_NIEUWE_PURMERWEG\DGN\omleiding.dgn
