Kolommen KA — voorblad wijz. F

merk	lengte	hoogte	dikte	niveau bg	1e	2e	3e	hold	def.	totaal	inhoud per elem.	gewicht totaal	vorm wijz.	vorm def.	wapening tek.nr.	wapening wijz.	wapening def.
	mm	mm	mm							aantal	m^3	ton					
KA10	4050	400	400	3					3	3	0,65	4,88		B	KA10-W		A
KA11	4050	400	400	1					1	1	0,65	1,63		B	KA10-W		A
KA12	4050	400	400	2					2	2	0,65	3,25		B	KA10-W		A
KA20	4110	400	400	2					2	2	0,66	3,30		B	KA10-W		A
KA21	4110	400	400	1					1	1	0,66	1,65		B	KA10-W		A
KA22	4110	400	400	1					1	1	0,66	1,65		B	KA22-W		A
KA23	4110	400	400	3					3	3	0,66	4,95		B	KA10-W		A
KA30	3280	400	400	1					1	1	0,52	1,30		B	KA10-W		A
KA40	3200	400	400		2				2	2	0,51	2,55		B	KA10-W		A
KA41	3200	400	400		1				1	1	0,51	1,28		D	KA10-W		A
KA42	3200	400	400				3		3	3	0,51	3,83		B	KA10-W		A
KA43	3200	400	400		1				1	1	0,51	1,28		B	KA10-W		A
KA44	3200	400	400		1				1	1	0,51	1,28		C	KA10-W		A
KA45	3200	400	400		1				1	1	0,51	1,28		B	KA10-W		A
KA46	3200	400	400			2			2	2	0,51	2,55		B	KA10-W		A
KA50	3130	400	400			1			1	1	0,50	2,55		B	KA10-W		A
KA51	3130	400	400			1			1	1	0,50	1,25		B	KA10-W		A
KA52	3130	400	400			1			1	1	0,50	1,25		B	KA10-W		A
KA53	3130	400	400			1			1	1	0,50	1,25		B	KA10-W		A
				14	6	6	3		29	29	16,65	41,6					
				14	6	6	3			stuks	totaal m^3	totaal ton					

Prefab Skeletbouw Nederland
Postbus 426 | 3740 AK Baarn

uitg.	datum	omschrijving
H		
G		
F	19-12-06	Definitief vorm en wapening
E	08-12-06	Voorlopig
D	07-12-06	Voorlopig
C	06-12-06	Voorlopig
B	22-11-06	Voorlopig
A	08-11-06	Voorlopig

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Oud-Zuid
Constructie geen bezwaar
Datum : 28-11-'06
Paraaf : S.G.

opdrachtgever	KBM Katwijk
project	VZA Amsterdam
onderdeel	Prefab kolommen 400 x 400 mm

Van Eijk Adviesburo voor Civiele Technieken
Arubastraat 2
1058 VE AMSTERDAM
Telefoon 020 - 616 16 62
Telefax 020 - 616 17 37

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
de Bondt Eindhoven bv Postbus 7020; 5605 JA EINDHOVEN
Tel.: (0402) 500700 E-mail: eindhoven@avecodebondt.nl
Fax: (0402) 500701 Web: www.avecodebondt.nl

061756

VB-KA

ordernummer | tekening

Prefab Skeletbouw Nederland

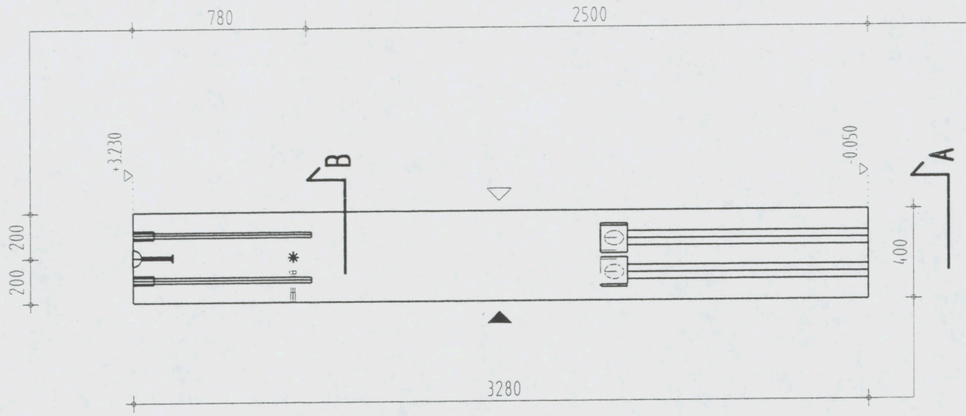

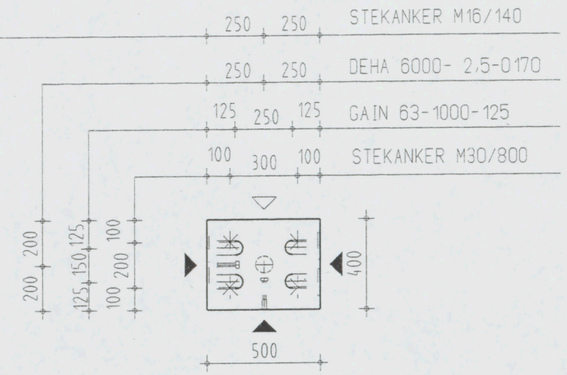

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁ V Malzijde (vuilwerk)
◁ A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁ R Stortzijde (Gerold)
◁ S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	656	L
Gewicht	1640	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FE8500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KB
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KB10-w
Blad: KB10

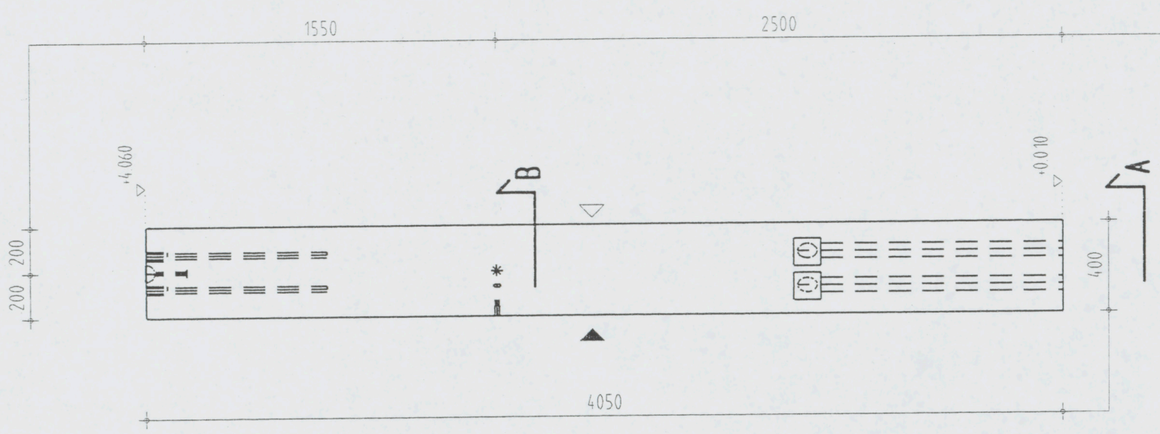

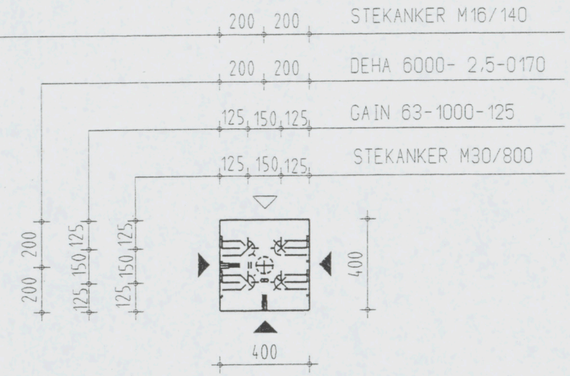

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◀	Vellingkanten 10*10 mm	
◁	Malzijde (schoonwerk)	
◁ V	Malzijde (vuilwerk)	
◁ A	Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)	
◁	Stortzijde (onbehandeld)	
◁ R	Stortzijde (Gerold)	
◁ S	Stortzijde (Spanen)	
	Spouwankers - st/m2	

Inhoud	648	L
Gewicht	1620	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA10

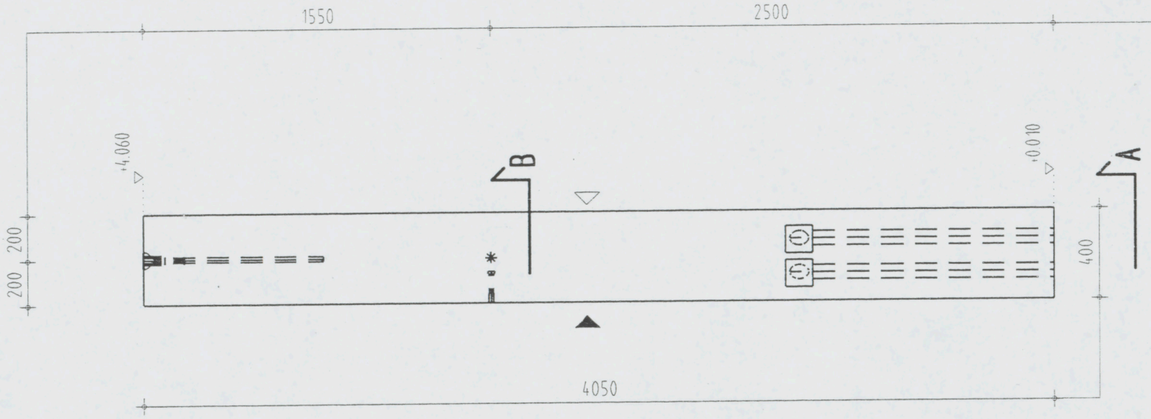

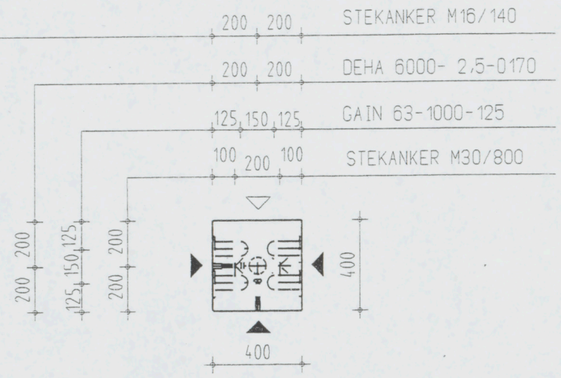

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
2 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	648 L
Gewicht	1620 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA11

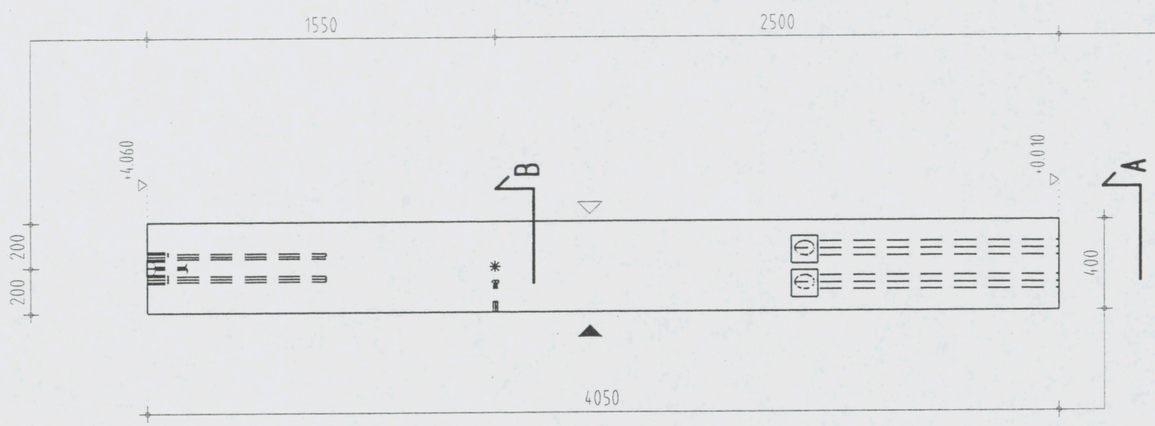

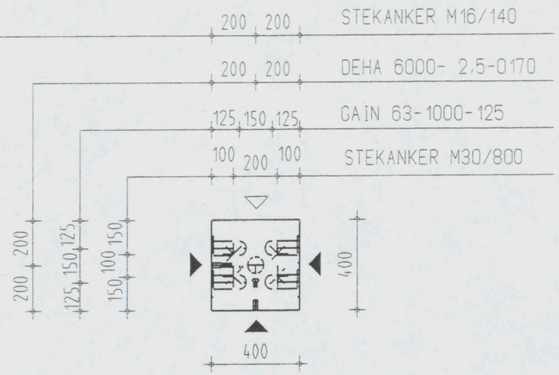

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	848 l
Gewicht	1620 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FE8500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA 12

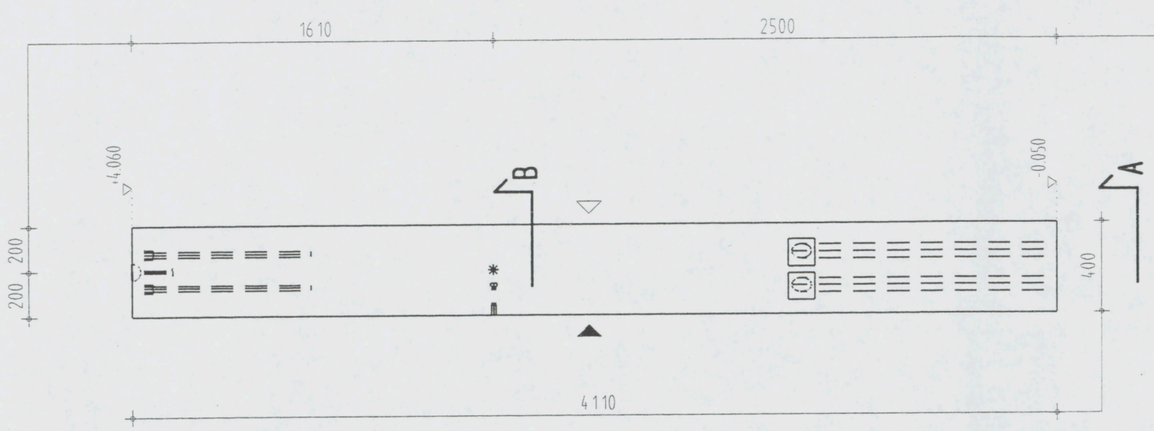

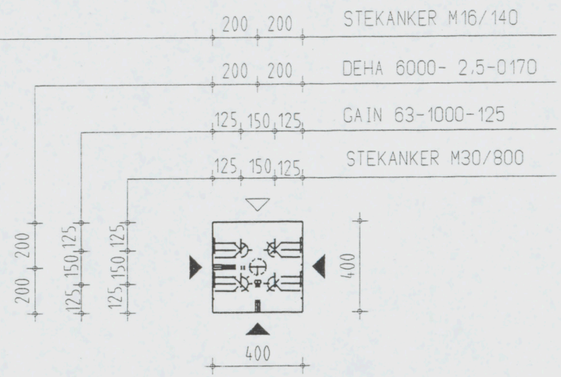

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◀ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	658	L
Gewicht	1645	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA20

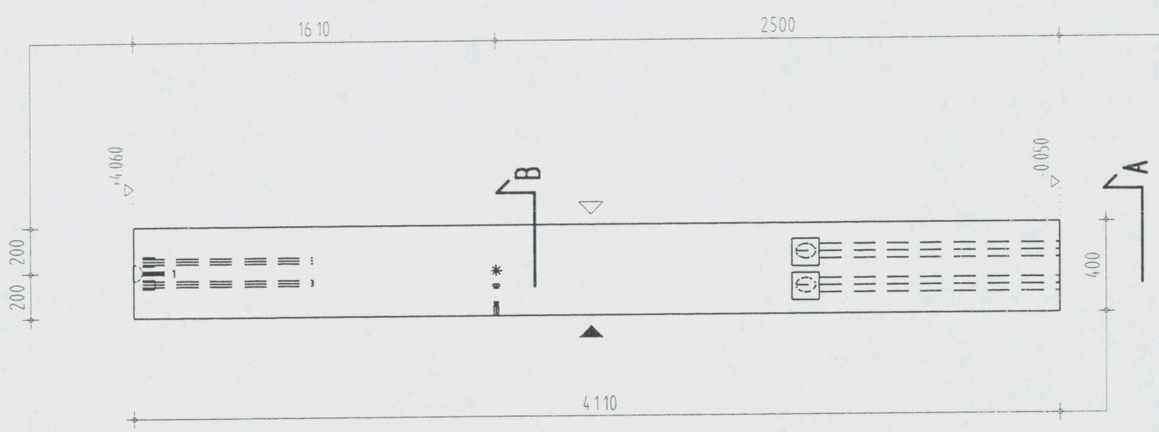

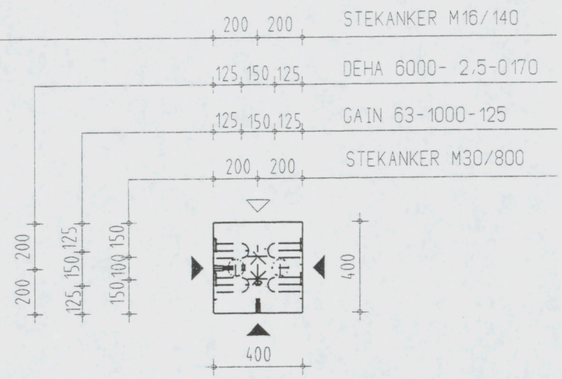

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
2 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
2 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁ V Malzijde (vuilwerk)
◁ A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁ R Stortzijde (Gerold)
◁ S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	658	L
Gewicht	1645	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA21

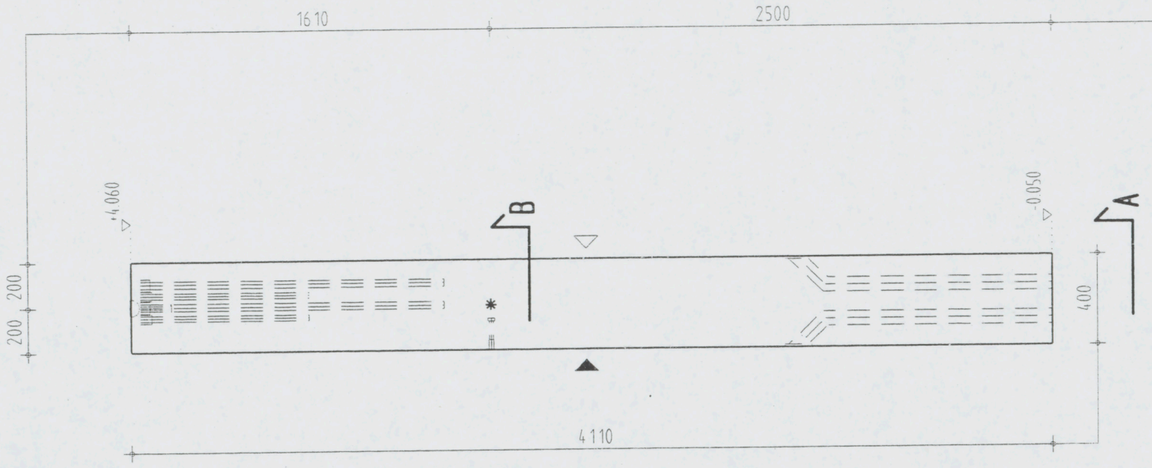

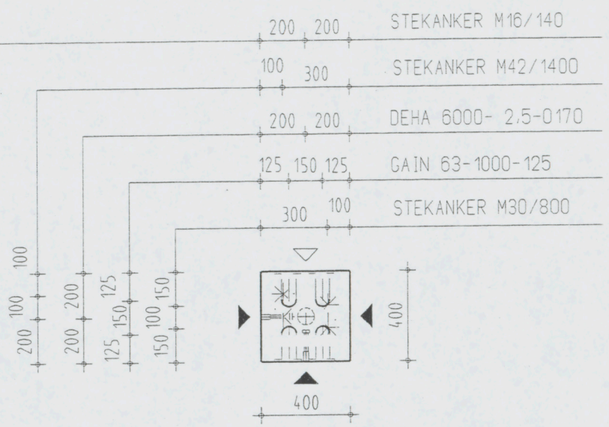

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1x DEHA 6000- 2.5-0170
4x GAIN 63-1000-125
2x STEKANKER M16/140
2x STEKANKER M30/800
2x STEKANKER M42/1400

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◀ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerald)
◁S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers – st/m2

Inhoud	658 L
Gewicht	1645 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	–

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	22-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA22-W
Blad: KA22

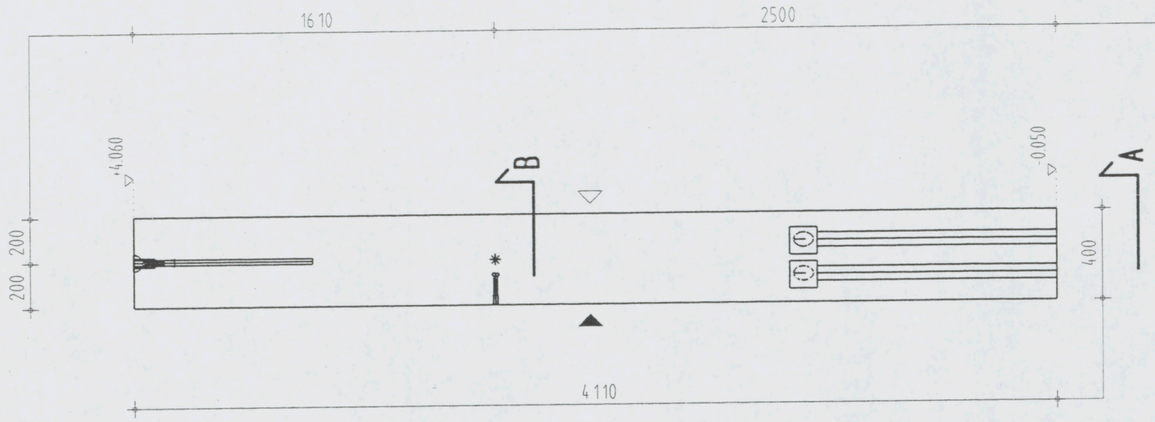

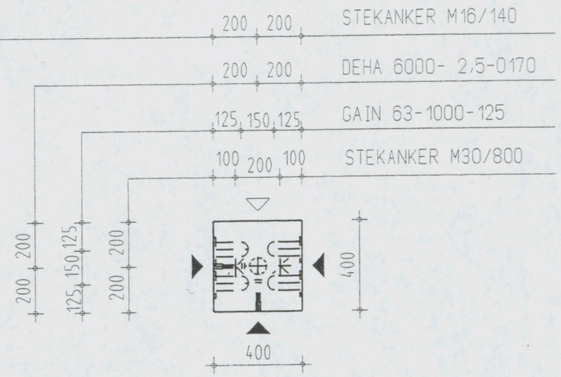

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
2 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◀ Vellingkanten 10+10 mm
△ Malzijde (schoonwerk)
△V Malzijde (vuilwerk)
△A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
△ Stortzijde (onbehandeld)
△R Stortzijde (Gerold)
△S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	658 L
Gewicht	1645 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FE8500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

	wijz	datum	get.	gec
F				
E				
D				
C				
B	19-12-06	J.S.		
A	06-12-06	L.S.		
X	08-11-06	A.K.		

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA23

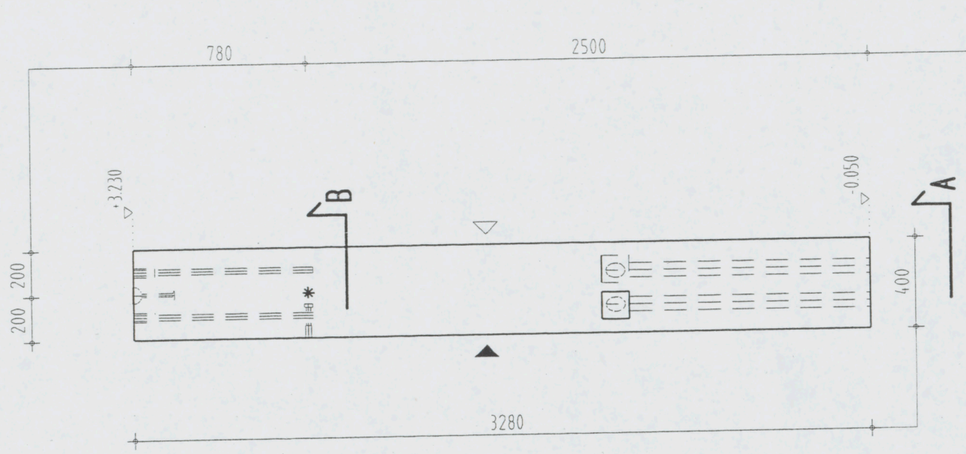

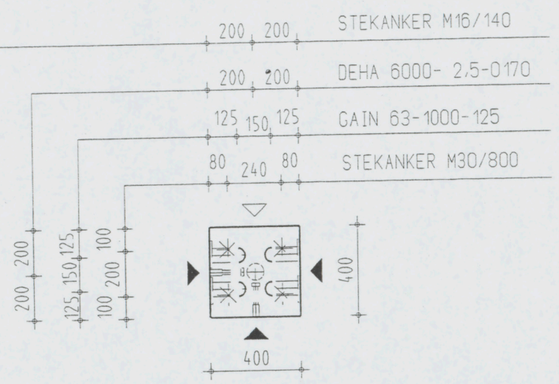

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◀ Vellingkanten 10*10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁ V Malzijde (vuilwerk)
◁ A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁ R Stortzijde (Gerold)
◁ S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	525 L
Gewicht	1313 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA30

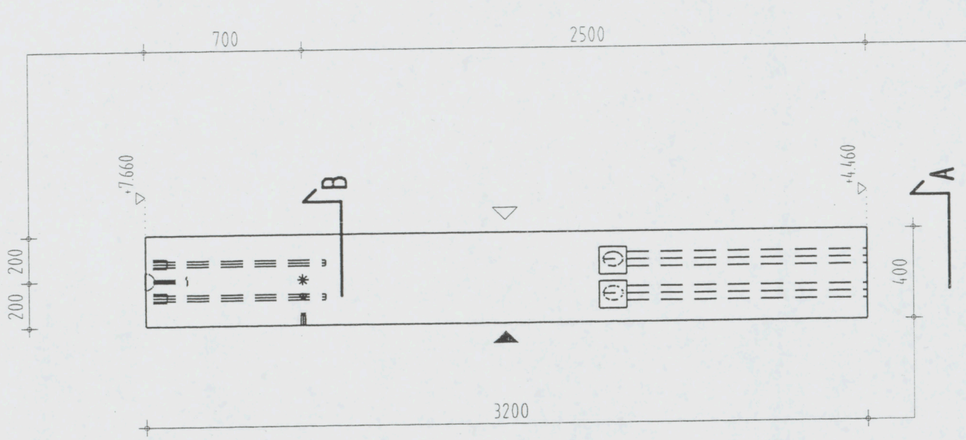

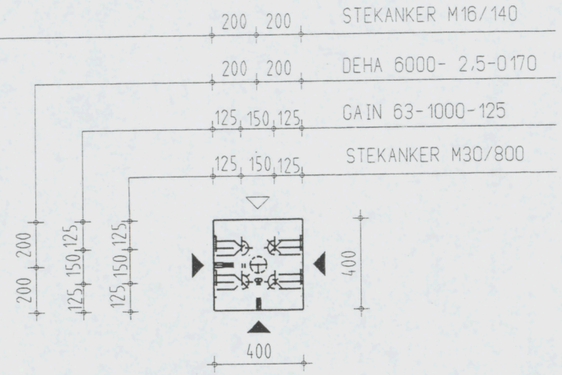

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

- Vellingkanten 10*10 mm
- Malzijde (schoonwerk)
- V Malzijde (vuilwerk)
- A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
- Stortzijde (onbehandeld)
- R Stortzijde (Gerold)
- S Stortzijde (Sparen)
- Spouwankers - st/m2

Inhoud	5.12	L
Gewicht	1280	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA40

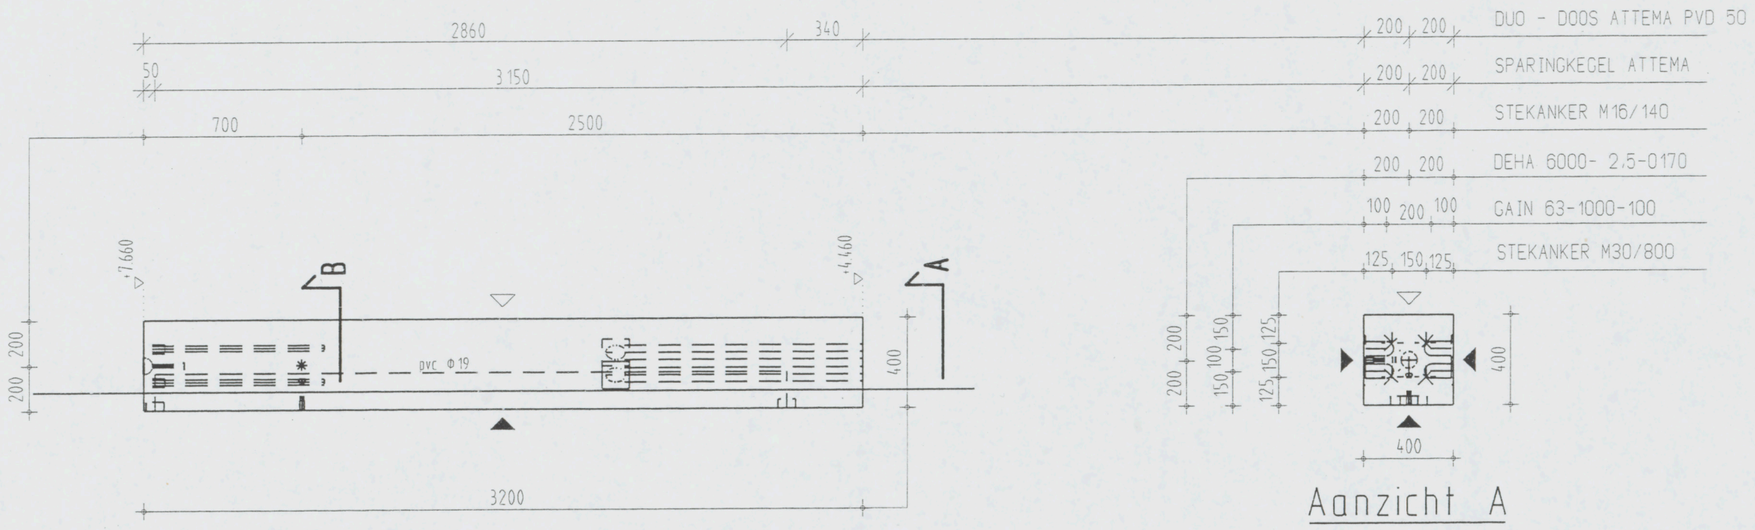

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1x DEHA 6000- 2,5-0170
4x GAIN 63-1000-100
2x STEKANKER M16/140
4x STEKANKER M30/800
1x SPARINGKEGEL ATTEMA
1x DUO - DOOS ATTEMA PVD 50

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◀	Vellingkanten 10+10 mm
◁	Malzijde (schoonwerk)
◁V	Malzijde (vuilwerk)
◁A	Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁	Stortzijde (onbehandeld)
◁R	Stortzijde (Gerold)
◁S	Stortzijde (Sponen)
	Spouwankers - st/m2

Inhoud	512	L
Gewicht	1280	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D	19-12-06	J.S.	
C	08-12-06	J.S.	
B	07-12-06	A.K.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA41

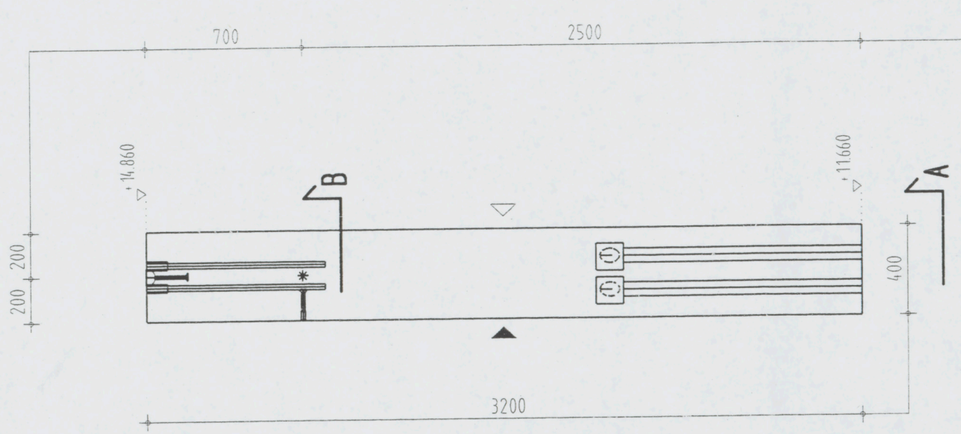

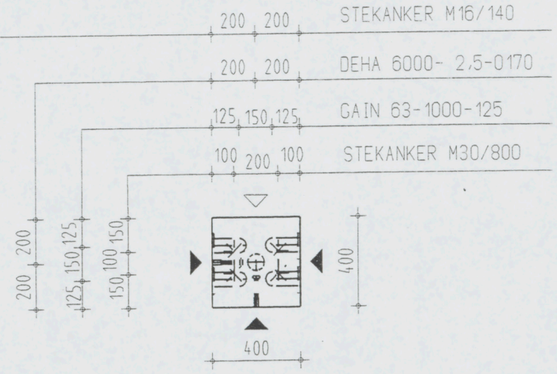

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	512 L
Gewicht	1280 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA42

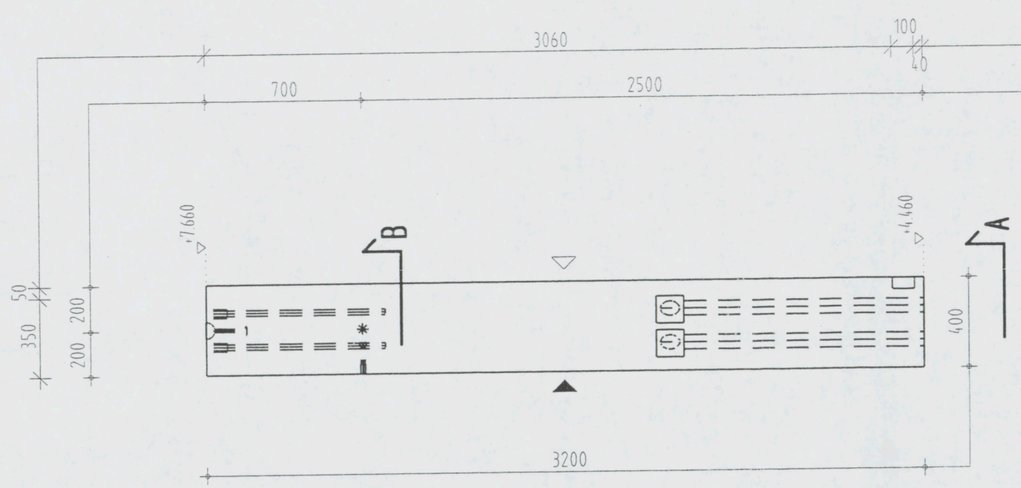

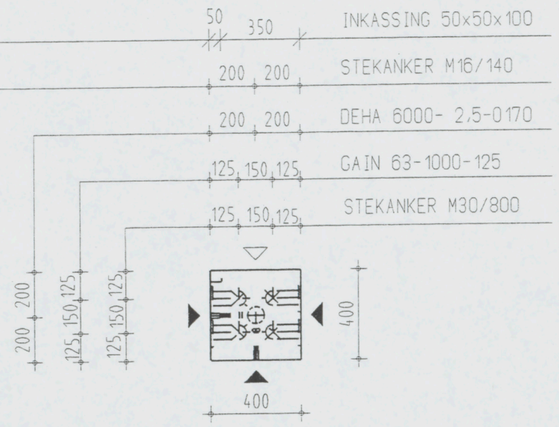

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10*10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁ V Malzijde (vuilwerk)
◁ A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁ R Stortzijde (Gerald)
◁ S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	5.12 L
Gewicht	1280 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

F				
E				
D				
C				
B	19-12-06	J.S.		
A	06-12-06	L.S.		
X	08-11-06	A.K.		
wijz	datum	get.	gec.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Princ.wap. KA10-W
Blad KA43

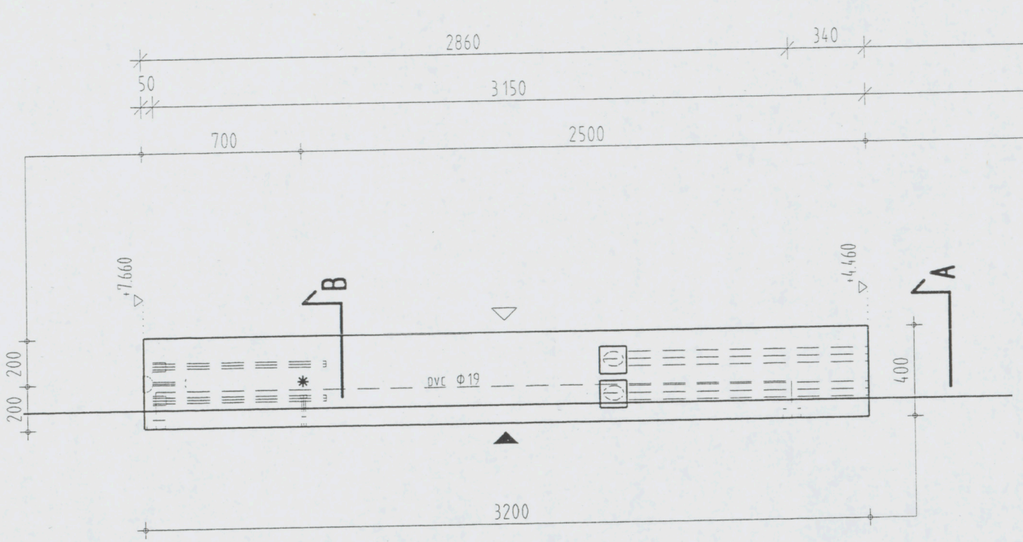

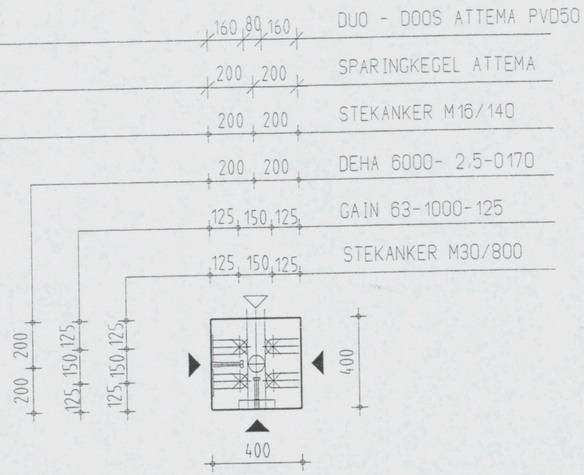

Aanzicht A

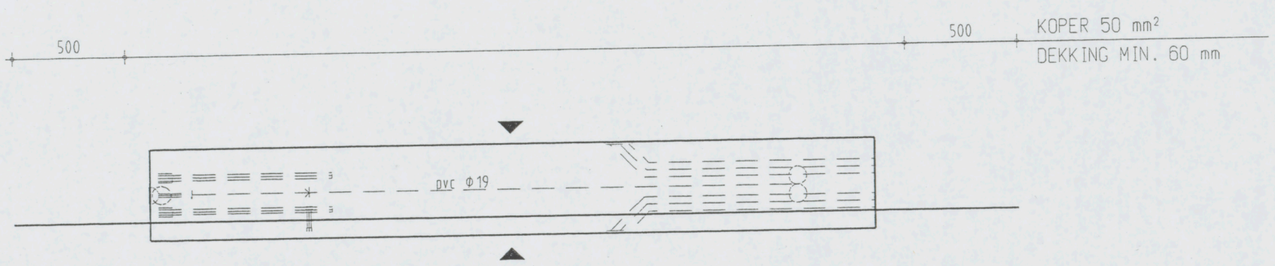

Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800
1 x SPARINGKEGEL ATTEMA
1 x DUO - DOOS ATTEMA PVD50

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10*10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	5.12 L
Gewicht	1280 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FE B500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

F				
E				
D				
C	19-12-06	J.S.		
B	07-12-06	A.K.		
A	06-12-06	L.S.		
X	08-11-06	A.K.		
wijz	datum	get.	gec.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA44

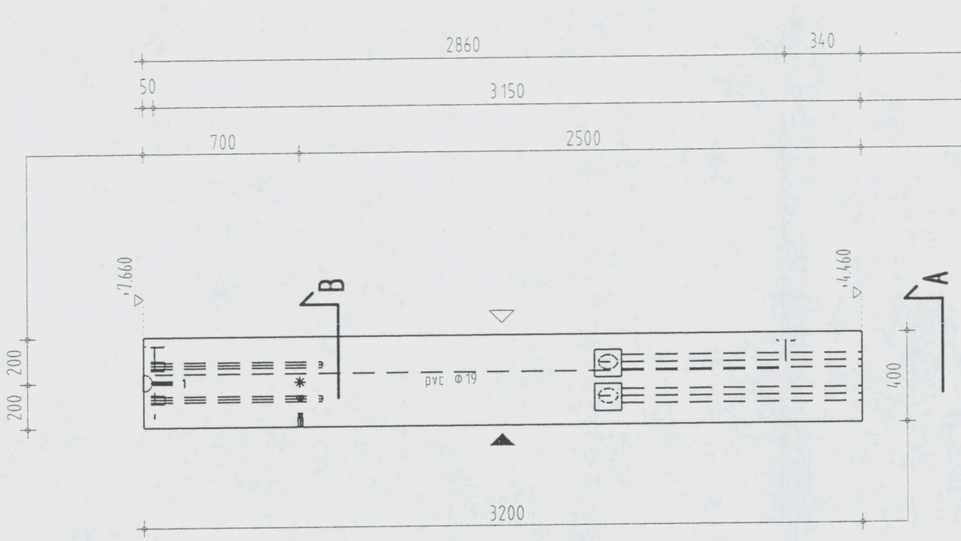

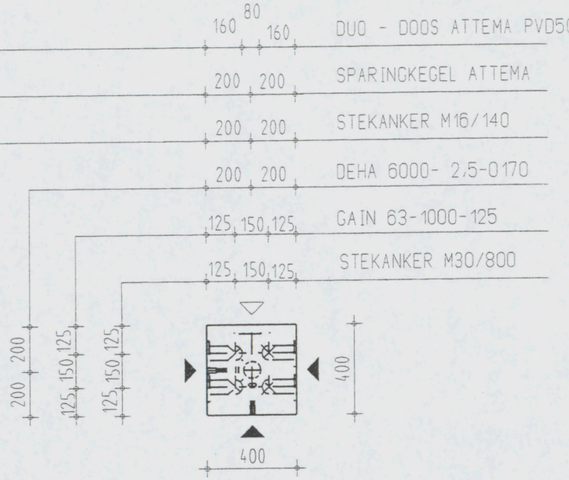

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800
1 x SPARINGKEGEL ATTEMA
2 x DUO - DOOS ATTEMA PVD50

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerald)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	512 L
Gewicht	1280 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA45

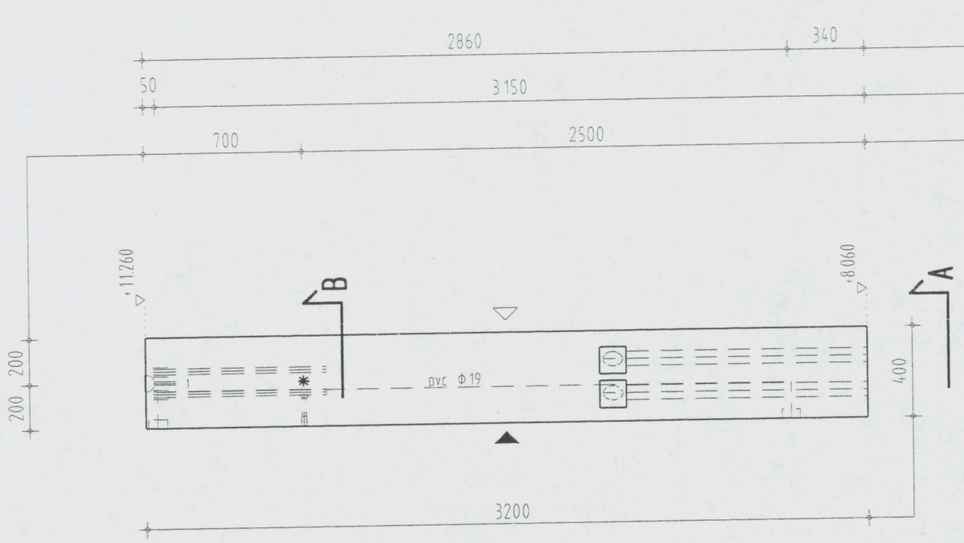

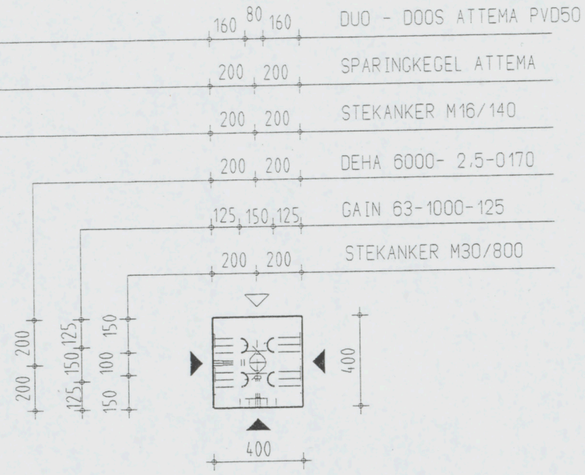

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
2 x STEKANKER M30/800
1 x SPARINGKEGEL ATTEMA
2 x DUO - DOOS ATTEMA PVD50

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	512	L
Gewicht	1280	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

F				
E				
D				
C				
B				
A	19-12-06	J.S.		
X	06-12-06	L.S.		
wijz	datum	get.	gec.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA46

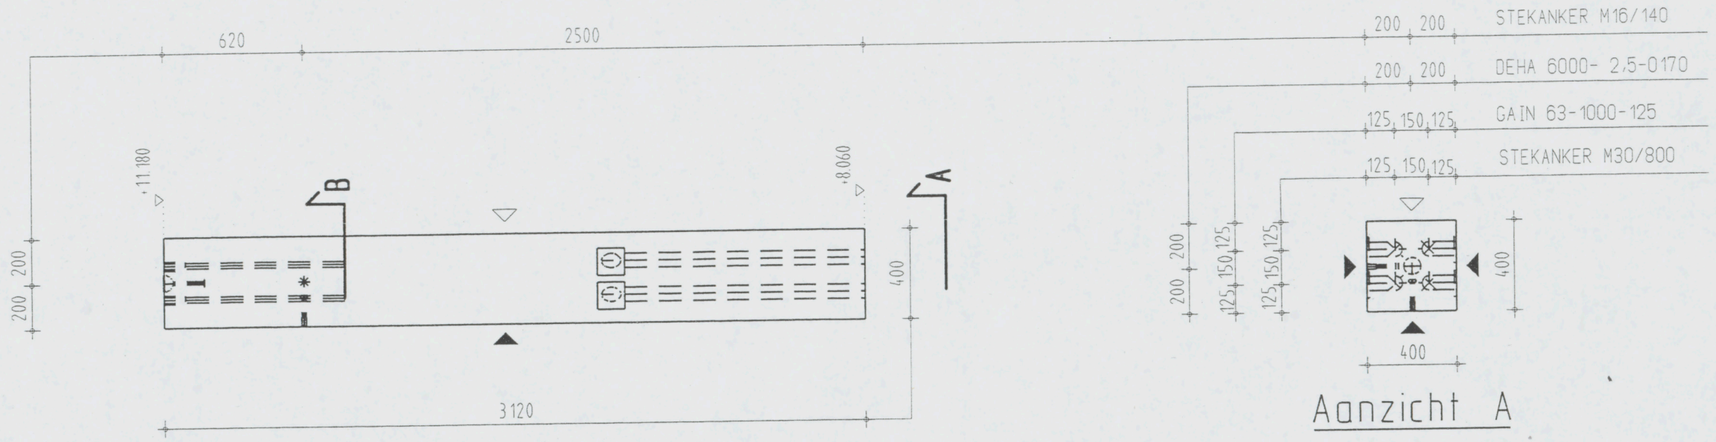

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◀ Vellingkanten 10*10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁ V Malzijde (vuilwerk)
◁ A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁ R Stortzijde (Gerold)
◁ S Stortzijde (Spanen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	499 L
Gewicht	1248 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA50

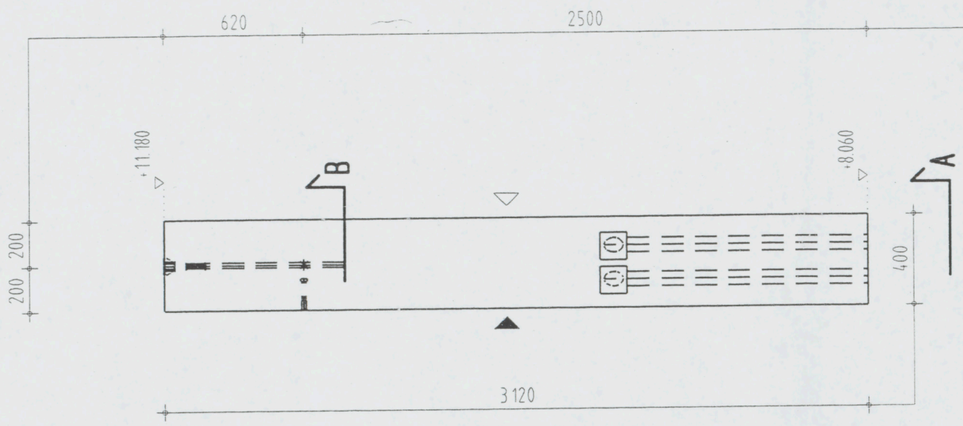

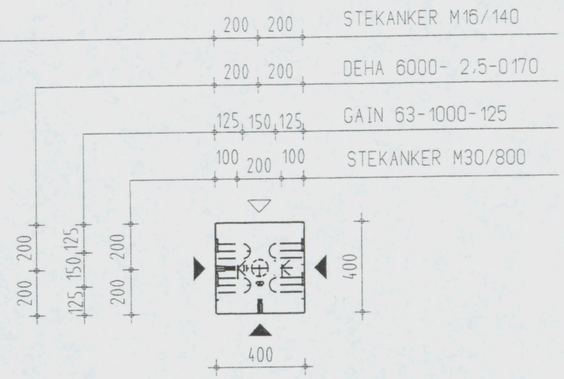

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
2 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10*10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Inhoud	499 L
Gewicht	1248 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	
wijz	datum	get.	gec.

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA51

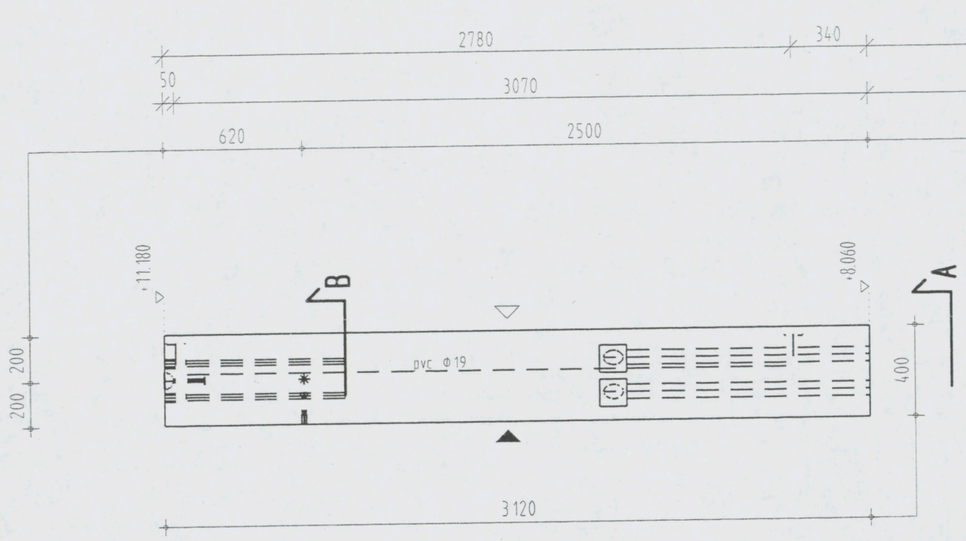

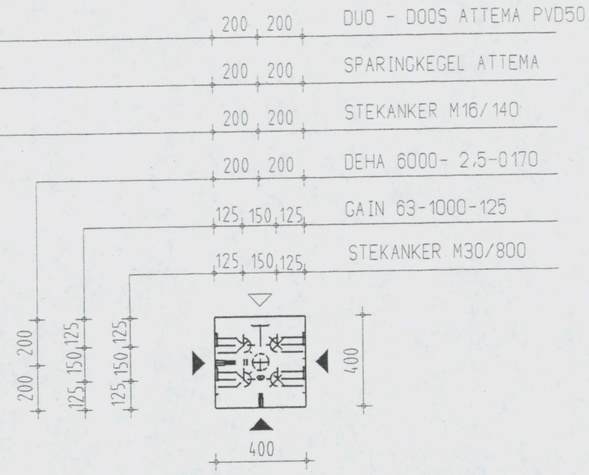

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen

1 x DEHA 6000- 2,5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800
1 x SPARINGKEGEL ATTEMA
1 x DUO - DOOS ATTEMA PVD50

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

- Vellingkanten 10+10 mm
- Malzijde (schoonwerk)
- V Malzijde (vuilwerk)
- A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
- Stortzijde (onbehandeld)
- R Stortzijde (Gerold)
- S Stortzijde (Sponen)
- Spouwankers - st/m2

Inhoud	499 L
Gewicht	1248 KG
Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA52

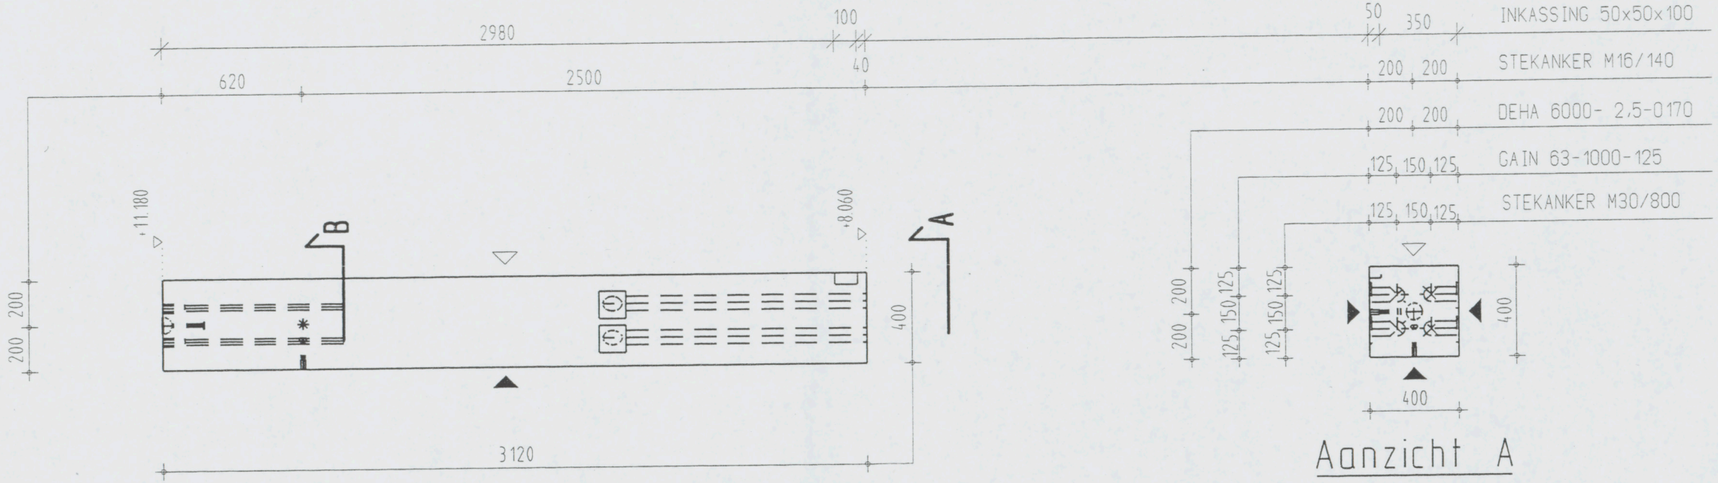

Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde



Doorsnede B

Instortvoorzieningen
1 x DEHA 6000- 2.5-0170
4 x GAIN 63-1000-125
2 x STEKANKER M16/140
4 x STEKANKER M30/800

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◀	Vellingkanten 10+10 mm	
◁	Malzijde (schoonwerk)	
◁V	Malzijde (vuilwerk)	
◁A	Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)	
◁	Stortzijde (onbehandeld)	
◁R	Stortzijde (Gerold)	
◁S	Stortzijde (Spanen)	
	Spouwankers - st/m2	

Inhoud	499	L
Gewicht	1248	KG
Cementsoort	PC	
Betonkwaliteit	C35/45	
Staalkwaliteit	FEB500	
Dekking	40	
Milieuklasse	XC3	
Oppervlakte	-	

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B	19-12-06	J.S.	
A	06-12-06	L.S.	
X	08-11-06	A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Princ.wap.: KA10-W
Blad: KA53

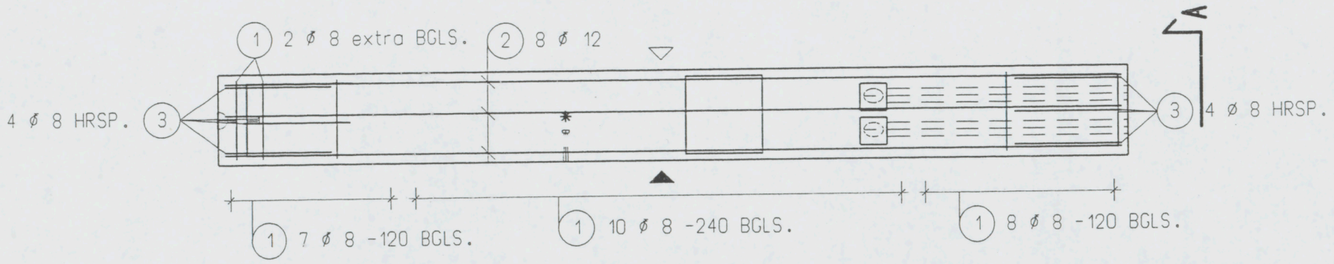



Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status: DEFINITIEF

◄	Vellingkanten 10+10 mm	
◁	Malzijde (schoonwerk)	
◁V	Malzijde (vuilwerk)	
◁A	Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)	
◁	Stortzijde (onbehandeld)	
◁R	Stortzijde (Gerold)	
◁S	Stortzijde (Spanen)	
	Spouwankers - st/m2	

Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FEB500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

	wijz	datum	get.	gec.
F				
E				
D				
C				
B				
A	19-12-06		J.S.	
X	08-11-06		A.K.	

Werk: VZA Amsterdam
Opdr.gever: KBM Katwijk
Onderdeel: Prefab kolom - wapening
Aantal: zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order: 061756
Blad: KA10-W

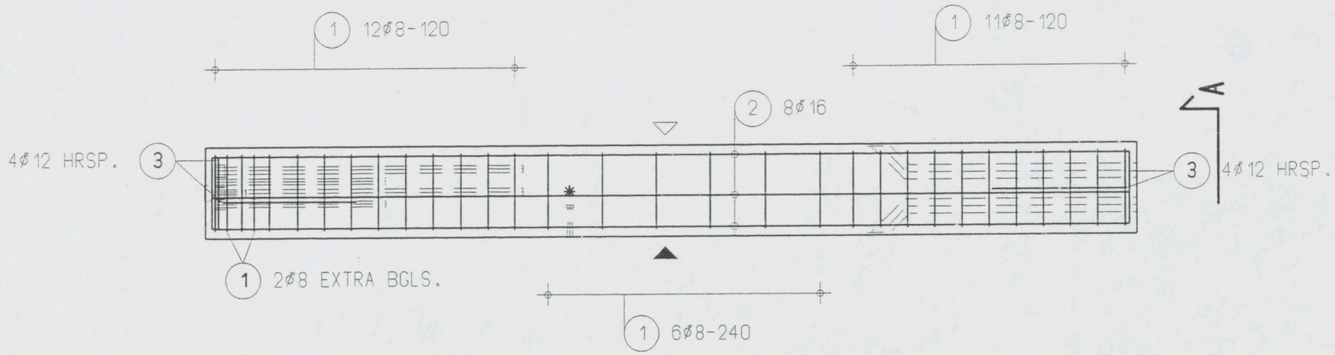



Aanzicht A



Aanzicht afwerkzijde

AKKOORD VOOR PRODUKTIE

Paraaf

Status
DEFINITIEF

◄ Vellingkanten 10+10 mm
◁ Malzijde (schoonwerk)
◁V Malzijde (vuilwerk)
◁A Malzijde (wordt in het werk afgewerkt)
◁ Stortzijde (onbehandeld)
◁R Stortzijde (Gerold)
◁S Stortzijde (Sponen)
Spouwankers - st/m2

Cementsoort	PC
Betonkwaliteit	C35/45
Staalkwaliteit	FE B500
Dekking	40
Milieuklasse	XC3
Oppervlakte	-

wijz	datum	get.	gec.
F			
E			
D			
C			
B			
A	19-12-06	J.S.	
X	22-11-06	A.K.	

Werk VZA Amsterdam
Opdr.gever KBM Katwijk
Onderdeel Prefab kolom - wapening
Aantal zie VB-KA
schaal 1:25 formaat 420x297

Order 061756
Blad KA22-W

Wanden WA voorblad wijz. H

merk	lengte	hoogte	dikte	niveau					hold	def.	totaal	inhoud per elem.	gewicht per element	vorm wijz.	vorm def.	wapening tek.nr.	wapening wijz.	wapening def.
	mm	mm	mm		bg	1e	2e	3e			aantal	m^3	ton					
WA10	2950	4410	200		1				0	1	1	2,288	5,720		E	WA10-W		A
WA11	3025	4410	200		1				0	1	1	2,601	6,503		D	WA11-W		B
WA12	3245	4410	200		1				0	1	1	1,841	4,603		E	WA12-W		B
WA13	3810	4070	200		1				0	1	1	2,246	5,615		A	WA13-W		A
WA14	6000	4070	200		1				0	1	1	3,811	9,528		C	WA14-W		B
WA15	**W15 VERVALT , / W14 en W15 wordt nu een element - W14 /**																	
WA16	3980	4070	200		1				0	1	1	3,240	8,100		B	WA16-W		A
WA16A	3980	4070	200		1				0	1	1	3,238	8,095		B	WA16-W		A
WA16B	3980	4070	200		1				0	1	1	3,240	8,100		B	WA16-W		A
WA17	2740	4070	200		1				0	1	1	1,256	3,140		B	WA17-W		A
WA18	2060	4070	200		1				0	1	1	1,568	3,920		B	WA18-W		A
WA19	5057	4070	200		1				0	1	1	3,845	9,613		C	WA19-W		A
WA20	1990	4150	200		1				0	1	1	1,586	3,965		A	WA20-W		A
WA21	2480	4150	200		1				0	1	1	2,045	5,113		A	WA21-W		A
WA21A	2480	4150	200		1				0	1	1	2,036	5,090		A	WA2A1-W		A
WA22	2780	4150	200		1				0	1	1	2,140	5,350		A	WA22-W		A
WA23	3980	4150	200		1				0	1	1	3,303	8,258		A	WA16-W		A
WA24	3355	4150	200		1				0	1	1	2,666	6,665		A	WA24-W		A
WA25	4870	1030	200		1				0	1	1	0,682	1,705		A	WA25-W		A
WA26	5970	4070	200		1				0	1	1	3,746	9,365		B	WA26-W		A
WA27	5969	4070	200		1				0	1	1	4,100	10,250		B	WA27-W		A
WA28	2070	4070	200		1				0	1	1	1,685	4,213		B	WA16-W		A
WA29	690	4070	200		1				0	1	1	0,524	1,310		A	WA29-W		A
WA30	8740	840	200		1				0	1	1	1,389	3,473		A	WA30-W		B
WA31	3360	4070	200		1				0	1	1	2,126	5,315		B	WA31-W		A
WA100	6290	3240	200					1	0	1	1	3,404	8,510		B	WA100-W		A
WA101	2950	3580	200			1			0	1	1	1,684	4,210		C	WA101-W		A
WA101A	2950	3580	200				1		0	1	1	1,864	4,660		C	WA101-W		A
WA102	3000	3240	200					1	0	1	1	1,861	4,653		C	WA102-W		A
WA103	3000	3260	200					1	0	1	1	1,708	4,270		C	WA101-W		A
WA104	6290	3580	200			1			0	1	1	3,768	9,420		C	WA104-W		B
WA104A	6290	3580	200				1		0	1	1	3,768	9,420		C	WA100-W		A
WA105	6290	3260	200					1	0	1	1	3,545	8,863		C	WA100-W		A
WA106	6620	3260	200					1	0	1	1	3,757	9,393		C	WA106-W		B
					24	2	2	5			33	82,6	206,4					
					24	2	2	5			33 stuks	m^3 totaal	ton totaal					

Van Eijk Adviesburo voor
Civiele Technieken
Arubastraat 2
1058 VE AMSTERDAM
Telefoon 020 - 616 16 62
Telefax 020 - 616 17 37
