From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **FW: eerste reactie ter bespreking donderdag**
To 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Cc 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date March 24, 2026, 4:59:05 PM CET

Dag 5.1,

Ook voor jullie eerste doorkijk van de 'review' IBR.
Geeft dit nog nuance op de toelichting?

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 24 maart 2026 16:29
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: eerste reactie ter bespreking donderdag

Beste 5.1, 2, e

Ik zou graag gebruik maken van het aanbod om te parkeren in de kelder bij IBA.
Kenteken 5.1, 2, e

Algemeen
Wij hebben het dossier bestudeerd.
In algemene zin ziet het er verzorgd uit en goed gedocumenteerd.
Op onderdelen is het wat lastiger omdat er soms nog informatie uit vorige fases zwerft en de laatste geotechnische inzichten nog niet volledig zijn verwerkt.
Ook blijft de onderbouwing bij grote bepalende kostenposten soms wat achter en lijkt de kans op optreden van risico's uit het risicodossier soms wel erg groot.
Risicogestuurde ontwerpslagen zijn beperkt uitgevoerd (of gerapporteerd), referentieprojecten hebben soms een beperkte toepasbaarheid.

Soms is het lastig om sober/verzorgd en high end goed te kunnen onderscheiden omdat hier esthetiek en duurzaamheid door elkaar lopen.

Stijfheid onderbouw kelder (zonder koppeling) zien we nog als groot risico bij dubbele bascule maar de toepassing van verloren bouwkuipen zal een niet nader onderbouwde substantiële bijdrage leveren aan de stijfheid.

Inhoudelijk ter bespreking


1. Toelichting/discussie op volgende punten:
    a. Inheidiepte algemeen
    b. Bouwkuip (binnenkuip m2? 91*12) en horizontale stijfheid
    c. Wel of geen koppeling kelders
    d. Remmingwerken (diepte en clash bouwkuip)
    e. Basculebrug materialisatie
    f. Bascule hooggelegen brugdek (constructiehoogte 1,65m ?). Brugdek in NL is oneconomisch en kost extra breedte val
    g. Basculebrug enkel of dubbel (extreme zettingsgevoeligheid dubbel val, eigenfrequentie)
    h. Extra breedte bovenbouw bruggen (2 meter)
    i. Bovenbouw hoofdoverspanning tonnages staal lijken hoog (door zware koker aan zijkant): diagonale hangers
    j. Bovenbouw hoofdoverspanning staal betondek
    k. Stalen aanbruggen hoeveelheden ?
    l. Waarom geleidewerk kop basculekelder HO-zijde niet 4 zijdig symmetrisch tov aanvaring
    m. Als wachtplaatsen ook kerende functie hebben waarom dan lichter uitgevoerd
    n. Op basis waarvan is sober / high end gemaakt (VVK is alternatief maar niet high end). Zoals al eerder aangegeven hebben wij in het verleden wel gewerkt met opslagen +10% en +20% voor esthetische kwaliteit. Het lijkt hier een vertroebeling van esthetiek en duurzaamheids-ambities zouden wij gescheiden houden (Groene verbinding). Kostenstappen hier zijn heel groot (330 / 409 / 450) Waarom is koppeling vallen alleen bij high end.
    o. Toepassing VVK in basculebrug
    p. Wat is +2,5m in de aanbruggen op tekening
    q. Zon en wind.
    r.

2. Kosten
    a. Referenties grote posten graag toelichten
    b. Kostenefficiency 4 voor basculebruggen
    c. Onderbouwing geleidewerk
    d. Grote inbrengdiepte lange palen
    e. Post Engineering
    f. Toeslag stalen aanbruggen
    g.

Discussie item hoofdoverspanning (volgende fase)
Staalbeton toepassing (Heermabrug, Uijllanderbrug, Daphne Schippersbbrug, hogeweidebrug)

- Denk aan breedplaten met gaten voor deuvels en afstortlaag
- Geen probleem met demping
- Toepassing vakwerkhangers mogelijk (voorgetrokken drukstaven)
- Kosten en transportgewicht
- Minimale toeslag op breedte van 13,1 m

- Onderhoud/LCC

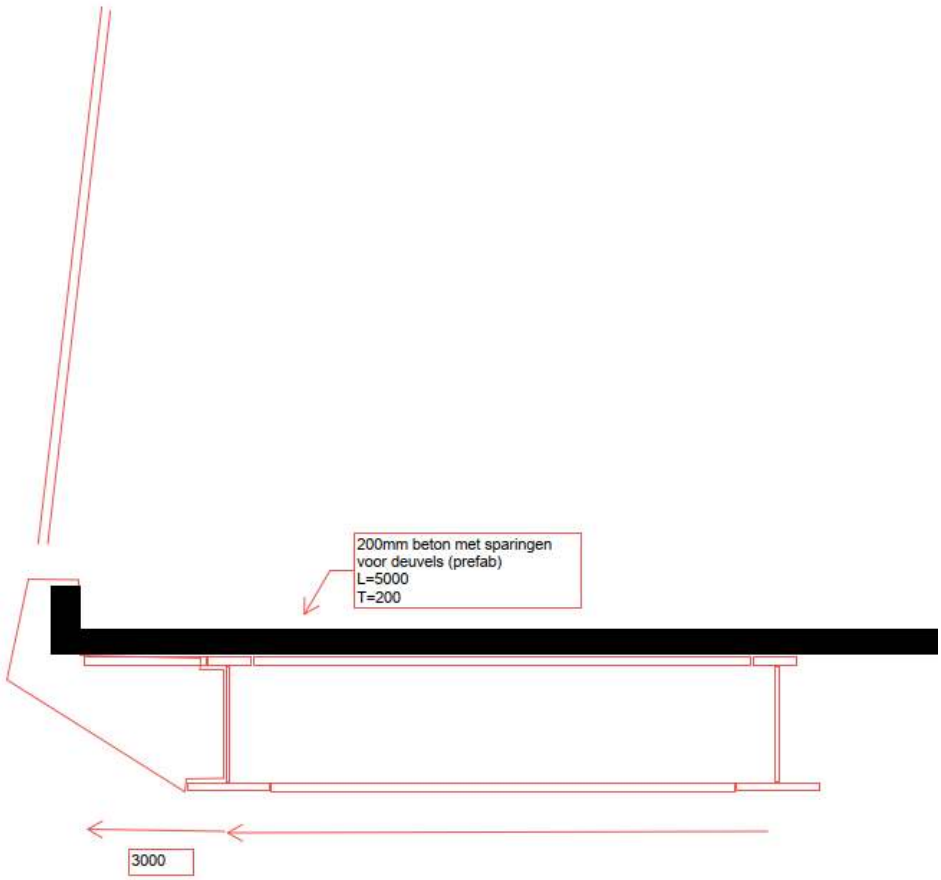

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Mobiel 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2026 17:26
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Onderwerp: RE: conceptofferte en vragen over toegeleverd pakket

Dag 5.1, 2, e

Helder om 26/3 in te vullen als verdere verduidelijking. Ons idee om voorafgaand aan 26/3 van jullie al iets van inzicht van de review te hebben, zit hem in het feit dat we daarmee een beeld hebben waar de focus zit op 26/3. En dan kunnen we daarop het programma 26/3 stroomlijnen en ook de juiste collega's van Haskoning laten aansluiten voor het goede gesprek.

Het is dus voor ons voldoende om van jullie te weten op welke onderdelen de focus/zwaartepunt van de review zit.
Lukt dat?

Overige is goed.

5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2026 15:50
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: conceptofferte en vragen over toegeleverd pakket

Dag 5.1, 2, e

Dank voor je reactie.

We hadden onderstaande naamsverwarring in de documenten vandaag zelf ook al gevonden. Daarmee was de vraag over de sharepointlink inderdaad overbodig.

Ten aanzien van de beoordeling lopen we regelmatig tegen vragen aan.
Ik zou de sessie van 26-3 graag zien als verdere verduidelijking en niet als conceptoplevering van onze rapportage.
We kunnen natuurlijk wel onze eerste zienswijzen delen.

Deze oplevering zou dan 1 a 2 weken later plaatsvinden.

De einddatum 1-5 had ik opgenomen om eventuele vragen in april nog te kunnen opnemen. Het is ook mogelijk om onze conceptoplevering als einddatum te vast te stellen

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
v seur
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Mobiel 5.1, 2, e

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2026 08:58
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Onderwerp: RE: conceptofferte en vragen over toegeleverd pakket

Dank 5.1, 2, (Jan),

Met 5.1, afgestemd. Offerte is akkoord.

Ik vraag intern om hier de administratieve vervolg stappen in de zetten.

Antwoord op jouw vragen:
- Jij geeft aan looptijd t/m 1/5/26. Wij gaan ervan uit dat de review (minimaal op de inhoud) 26/3/26 concept gereed is voor gesprek.
- Het klopt dat de link niet werkt. Dat hebben we opgelost met een transfer. In jouw email 19/2 gaf je aan dat het downloaden gelukt was.
- De vigerende ontwerpnota is het document met de digitale naam BJ4691-HAS-NOK020-123-C07_Ontwerpnota IRO.pdf (NB: Haskoning heeft hier een foutje gemaakt)

Zie ook:
In onze brief spreken we over: Ontwerpnota Integraal Referentieontwerp, BJ4691-HAS-NOK023-160-C1, 13 februari 2026;
Dit document is ook bijgesloten MAAR met de digitale naam BJ4691-HAS-NOK020-123-C07_Ontwerpnota IRO.pdf

Als je dit laatste document opent zie je (met referentie BJ4691-HAS-NOK023-160-C1, 13 februari 2026) :


RAPPORT

Ontwerpnota Integraal Referentieontwerp

Stand van zaken RO-SO Fase III

Klant:	Gemeente Amsterdam
Referentie:	BJ4691-HAS-NOK023-160-C1
Status:	Concept/07
Datum:	13 februari 2026

Dat geeft verwarring (en ga ik mensen op aanspreken).
Maar jullie missen dit document dus niet.

Het juiste document is: ***BJ4691-HAS-NOK020-123-C07_Ontwerpnota IRO.pdf***

Groet 5.1, 2, e

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e

Technisch manager
Ingenieursbureau
Gemeente Amsterdam

M: 5.1, 2, e
E: 5.1, 2, e @amsterdam.nl

Weesperstraat 430-432, 1018 DN Amsterdam.
Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Verzonden: dinsdag 10 maart 2026 08:15
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @Rotterdam.nl>
Onderwerp: conceptofferte en vragen over toegeleverd pakket

Beste 5.1, 2, e

Hierbij de conceptofferte
Graag jullie eventuele opmerkingen dan kunnen wij deze definitief maken
Misschien dat op basis hiervan alvast het opdrachttraject kan worden opgestart.

Vraag:

Klopt het dat onderstaande link niet werkt?
Of zijn deze documenten in de transfer inmiddels al toegestuurd.

De nu aangeboden documenten
Via een gedeelde omgeving op onze Sharepoint omgeving (Review Rotterdam IRO Oostbrug)
bieden wij u de volgende documenten aan:

In de begeleidingsbrief staat een verwijzing naar onderstaande documenten:

1. Ontwerpnota Integraal Referentieontwerp, BJ4691-HAS-NOK023-160-C1, 13 februari 2026;
2. Analyse geotechniek, v0.1, BJ4691-FGR-NOK023-151-C1, 13 februari 2026;
3. Constructieve impact toekomstig vervoer, BJ4691-HAS-NOK023-150-D1.0, 12 februari 2026;

Als ik de toegeleverde documenten zoek op “ontwerpnota” dan vind ik niet bovenstaande 160-C1 document
Dat zou betekenen dat de documenten in de sharepoint omgeving alsnog moeten worden toegestuurd



Wij zijn gewend om de opmerkingen in een reviewdocument (traceerbaar) op te nemen met verwijzing naar het betreffende document en niet als opmerking in de documenten zelf
Wij zullen dat ook hier toepassen

Met vriendelijke groet,

5.1, 2, e
Adviseur
Gemeente Rotterdam
Stadsontwikkeling
De Rotterdam, Wilhelminakade 179
Postbus 6575 3002 AN Rotterdam
Mobiel 5.1, 2, e

Heb je vragen over deze e-mail? Neem contact op met de afzender.
Is deze e-mail niet voor jou bedoeld? Laat het de afzender weten en verwijder de e-mail

De gemeente Amsterdam streeft naar optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van e-mailverkeer. Als deze e-mail niet voor u is bestemd, laat dit dan weten aan de afzender en verwijder de e-mail. Voor meer informatie: www.amsterdam.nl/proclaimer.
