Afwijking

Code	AFW-0017
Titel	Singel 0401 - toepassen BIMS boven waterleiding
Status	In behandeling
Datum geconstateerd	21 jun 2022
Tijdstip geconstateerd	

Opsteller en datum opgesteld

Opsteller	5.1,2,e
Initiërende organisatie	
Datum opgesteld	21 jun 2022

Hoort bij werkpakket

Type

Product afwijking

Initiator

☒ Opdrachtgever ☐ Opdrachtnemer

Beschrijving

Aanvullend wordt er licht ophoogmateriaal geplaatst boven de waterleiding
Om zettingen te voorkomen door de aanvulling zullen er 8 stuks big-bags met BIMS worden aangebracht boven de waterleiding conform bijgevoegde schets

1 plank is ingekort naar 3,7 meter boven de waterleiding

Oorzaak

Niet opgenomen in het ontwerp

Afbeeldingen

afw-017 bims.jpg

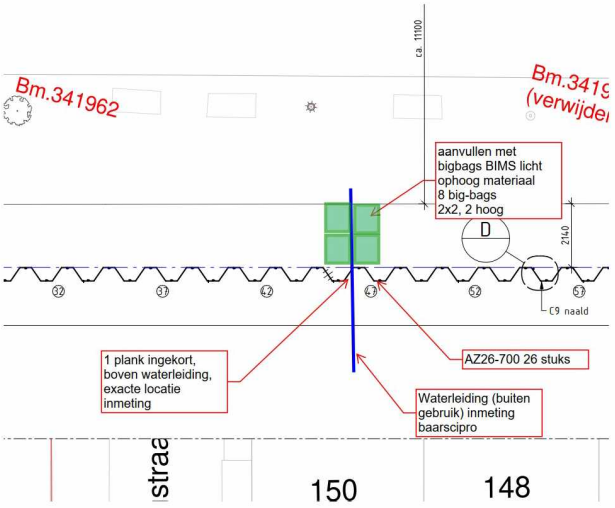

afw-017 plank korter.jpg

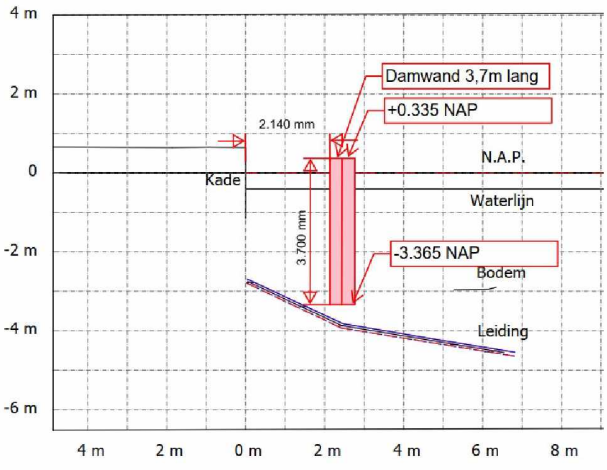

Gevolgen

Soort	Status	Beschrijving gevolg
Tijd	Geen gevolg	
Financieel	Wel gevolg	bestekspost 910030
Veiligheid	Geen gevolg	

© TBI Infra

Gevolgen

Soort	Status	Beschrijving gevolg
Constructieve veiligheid	Geen gevolg	
Kwaliteit	Geen gevolg	
Omgeving	Geen gevolg	
As built	Wel gevolg	Verwerken op as-built tekening
EMVI	Geen gevolg	
Contract	Geen gevolg	
Milieu	Geen gevolg	
Overige	Geen gevolg	

Inschattingen financieel gevolg

Inschatting	€

Afwijking ten opzichte van

Type	Code / Nummer	Titel	Status
Document	2203-4775 | 1.0	UO Singel 0401, Damwandconstructie	

Maatregelen beoordeling

Geen maatregelen

Ondertekening

Persoon	Rol	Ondertekening	Datum
5.1.2,e	Opsteller		
5.1.2,e	Autorisator		

© TBI Infra
