Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

BIJLAGE

DEFORMATIEMETING NHG-0401
NIEUWE HERENGRACHT THV RAPENBURGER
13E HALINGSMETING
OPNAMEDATUM: 03-04-2018

Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam, DIVV
contactpersoon:	
adres:	
opdrachtnummer:	
projectnummer:	1701437
projectleider:	
landmeter:	
datum rapportage:	10-04-2018
aantal pagina's:	5
versie:	1.0
status:	definitief
paraaf vrijgegeven:	
Naam:	

Inhoudsopgave

1 Toelichting 3
2 Overzichten 4
2.1 Meetoverzicht XYZ meting 4
3 Meteo gegevens 5

1 Toelichting

Deze bijlage behoort bij Rapportage_NHG0401.PDF. De bijlage bevat de resultaten van de 13e herhalingsmeting in XYZ.

De metingen zijn uitgevoerd op 03-04-2018.

De punten 12A,13A & B,15A & B, 16A & B, 18B en 20B zijn vergeleken met de 2e herhalingsmeting

De 1e faseberekening van de 13e herhalingsmeting van de tachymetrie is geaccepteerd (de meting is juist). De 2e fase is aangesloten op de referentiepunten waarbij de schaalfactor is vrijgelaten zoals ook in voorgaande metingen is geschied om tot een goed vergelijk te komen tot eerdere metingen.

Zowel de 1e fase als 2e fase berekening zijn geaccepteerd.
De berekende N.A.P. hoogten van de punten zijn niet gecorrigeerd.
De hoogten van alle deformatiepunten betreffen de bovenkant van de deformatiebouten (Idem zoals in de 1e herhalingsmeting).

De resultaten van de metingen zijn toegevoegd aan het moederbestand.

2 Overzichten

2.1 Meetoverzicht XYZ meting

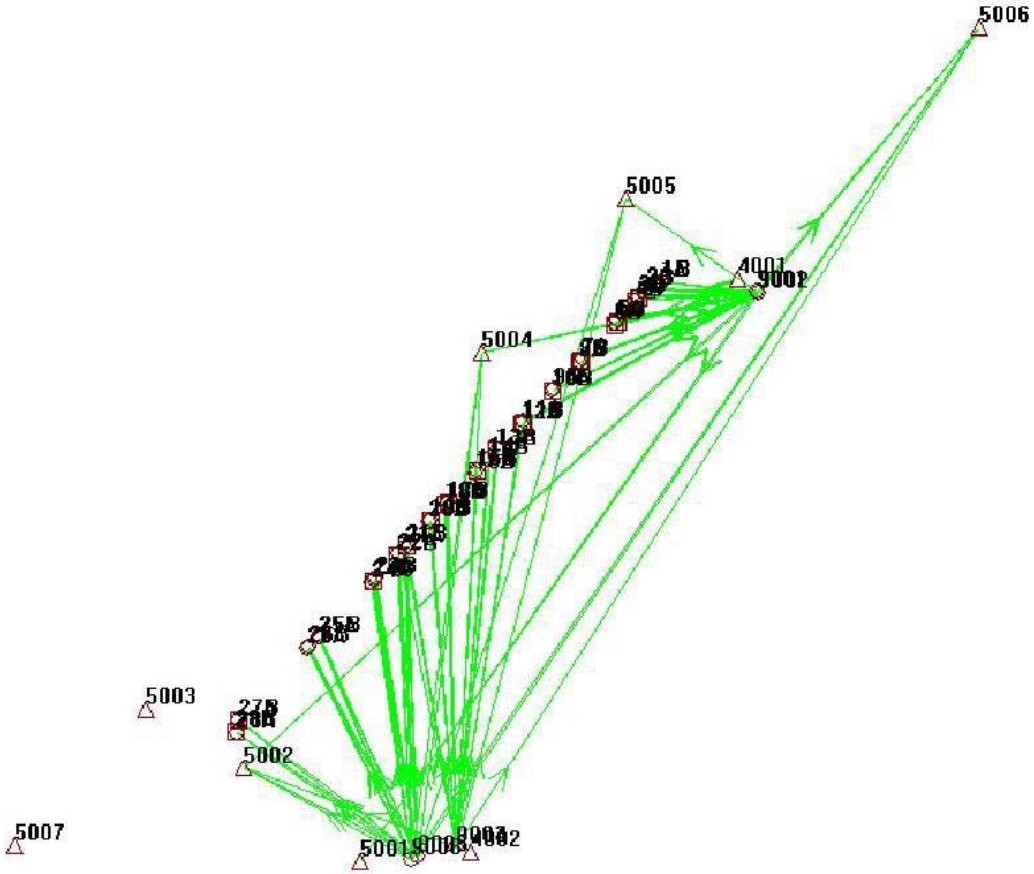

3 Meteo gegevens

Meteo gegevens	
weer type	bewolkt / regen
wind	3 Bft
lucht temp	5
constructie temp	10
opmerking	
