Van:
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 9:27
Aan:
Onderwerp: Fwd: Rakken Singel> SIN0801 en SIN0702

Heren

Ik zou het fijn vinden als jullie deze afweging maken en ook regie voeren op nader onderzoek.

Met hartelijke groet,

Begin doorgestuurd bericht:


Van: "[redacted]
Datum: 9 november 2018 om 09:01:16 CET
Aan: [redacted]

Kopie: [redacted]

Onderwerp: Rakken Singel> SIN0801 en SIN0702

Beste [redacted], collega's,
Bij het schouwen van een aantal rakken aan de Singel, zijn we onderstaande situatie tegengekomen.
Rak SIN0801
De kade ter plaatse van de Singel 354 t/m 258 is de kade aan het deformeren. Zie bijgevoegde gevoegde foto's.
Mogelijk dat er beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Voorstel is om spoor o hiervoor een advies op te laten stellen.
Is dat akkoord?



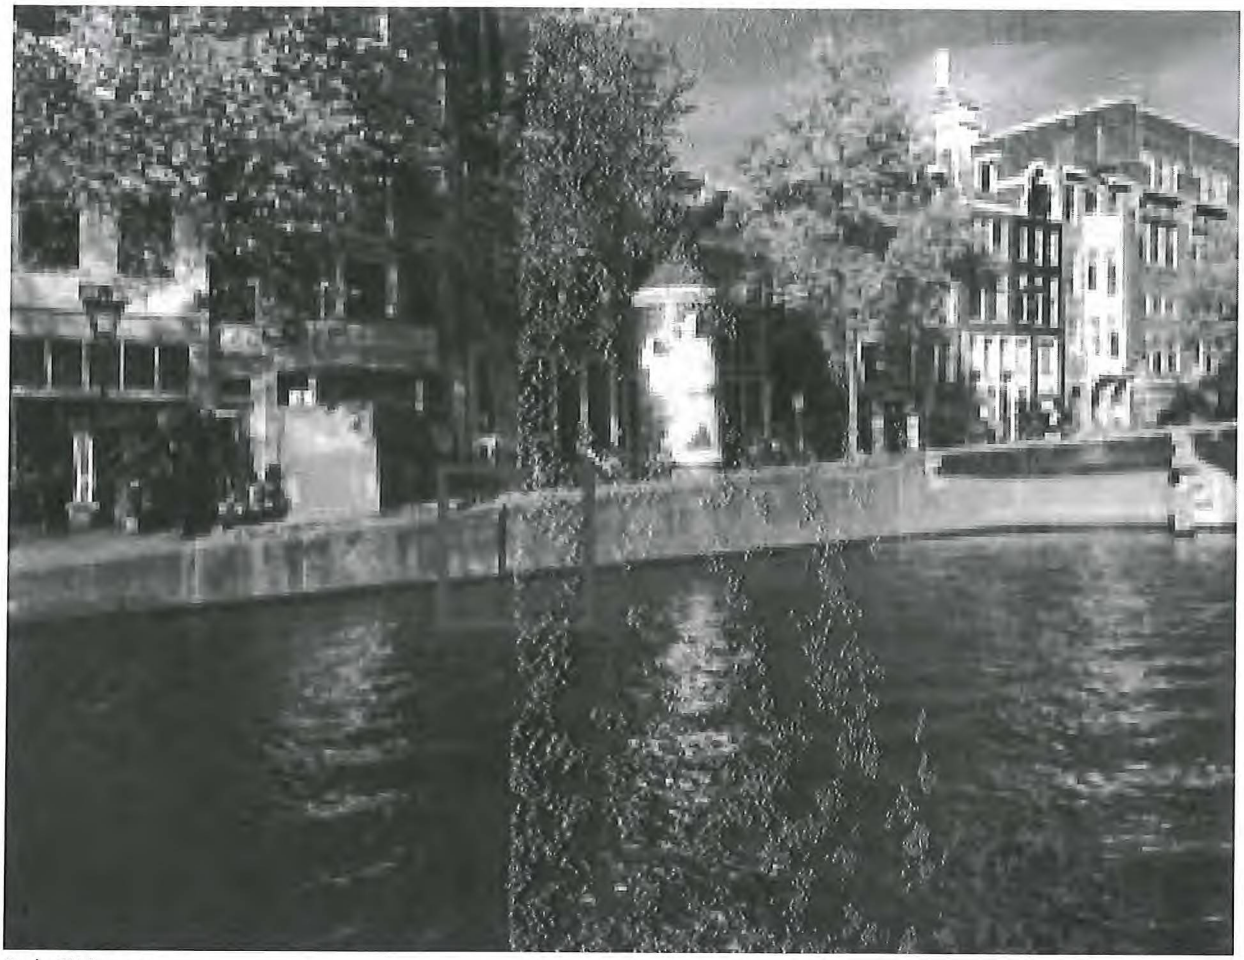

Rak SIN0702
Op de kade ter hoogte van de Singel 259 is de deksteen verschoven. Zie bijgevoegde foto.
Voorstel om ook dit stuk van het rak SIN0702 door spoor 0 nader te laten bekijken en indien nodig een advies op te laten stellen.
Er staat overigens wel al een hek voor.
Is dat akkoord?



Met vriendelijke groet,

[redacted]
Adviseur Constructies en Installaties
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

M[redacted]
E[redacted]@amsterdam.nl
Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

M

Van: monitoringkademuren
Verzonden: donderdag 25 april 2019 9:19
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: SIN0903 SPOED!!!

Heren,

De nulmeting voor SIN0903 staat door de opdrachtnemer voor mogen ingepland.
Frequentie vanuit de huidige opdracht is 1 x per 4 maanden (incl. panden).
graag advies vanuit spoor 0 wat hier de frequentie moet gaan worden.
Bij akkoord assetmanager, voer ik hem dan als meerwerk binnen de opdracht op

Met vriendelijke groet,

Adviseur Constructies en Installaties
Ingenieursbureau

Gemeente Amsterdam

Weesperstraat 430, 1018 DN
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma,di,wo,do,vr

Op dit bericht is een proclaimer van toepassing: amsterdam.nl/proclaimer

---

Van
Verzonden: donderdag 25 april 2019 08:44
Aan:
CC:
Onderwerp: SIN0903 SPOED!!!
Urgentie: Hoog

Goedemorgen allen,

Gisteren zijn wij wezen vragen en hebben 1 kademuur geconstateerd die acuut onderzocht moet worden. Bij SIN0903 zijn ter plaatse van een boom 3 grote scheuren ontstaan. De kademuur schuift van zijn vloer af. Onder komt die meer naar voren dan boven. Je ziet ook een voeg maar dit is een schijnvoeg. Waarschijnlijk was dit vroeger een scheur die ingezaagd is en dichtgezet met een dilatatievoeg. Begin februari zijn wij hier ook geweest en toen waren de scheuren nog minimaal. Vandaar mijn grote zorg.

Zouden jullie deze kademuur met spoed kunnen oppakken om vast te stellen wat de vervolgacties zijn.

Ik denk zelf aan het volgende

- Beoordelen wat er op de bovensituatie moet gebeuren (afzetting, kappen etc.)

- Monitoren (ik zie dat er nieuwe meetpunten zijn aangebracht. Zijn er al meetgegevens? En direct nieuwe meting inplannen)
- Beoordelen of er noodconstructies moet komen
- Vaststellen welke vervolgonderzoeken er moeten komen.

Kunnen jullie dit oppakken?

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je mij en de rest altijd bellen.

Met vriendelijke groet,

Senior adviseur Asset Management
Monitoring & Inspectie civiele constructies

Gemeente Amsterdam
Verkeer en Openbare Ruimte
Afdeling Assets, Team Civiele Constructies
Weesperplein 8, 1018 XA
www.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo, do en vrij
