Titel	:	BLVC-Uitvoeringsplan
Project	:	Planmatig onderhoud verhardingen Tuindorp Oostzaan

Documentnummer	:	TDOZ-000314
Versie	:	1.0
Status	:	Definitief

KWS

	Naam	Paraaf	Datum
Opgesteld	[redacted]		03-10-2019
Gecontroleerd	[redacted]		03-10-2019
Vrijgegeven	[redacted]		03-10-2019

en VolkerWessels onderneming

DOCUMENTHISTORIE

Revisie	Datum	Aanpassingen
0.1	24-09-2019	Eerste concept t.b.v. review OM gemeente Amsterdam.
0.2	27-09-2019	Aanpassingen in BLVC-plan OG verwerkt en overige acties.
1.0	03-10-2019	Aanpassingen in BLVC-plan [redacted] verwerkt. Geen aanpassingen vanuit [redacted]

Inhoudsopgave

1 INLEIDING 5

1.1 AANLEIDING 5
1.2 DOEL 5
1.3 LEESWIJZER 5

2 PROJECTBESCHRIJVING 6

2.1 SCOPE VAN HET PROJECT 6
2.2 PROJECTDOELSTELLING 6

3 OMGEVINGSANALYSE (UP050) 7

3.1 KORTE BESCHRIJVING OMGEVING VAN HET PROJECT 7
3.2 VERKEERSSITUATIE BIJ AANVANG VAN HET PROJECT 8
3.3 RELEVANTE FUNCTIE EN VOORZIENINGEN RONDOM HET PROJECT 8
3.4 RELEVANTE PARTIJEN RONDOM HET PROJECT EN HUN BELANGEN 9
3.5 RELEVANTE OMGEVINGSPROJECTEN BINNEN HET WERKGEBIED 9
3.6 RELEVANTE EVENEMENTEN/PROJECTEN RONDOM HET PROJECT 9
3.7 LIJNBUSSEN 10

4 TOELICHTING FASERING IN WOORD EN BEELD 11

4.1 BESCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN (UP050.4A) 11
4.2 WOONWIJK ONTSLUITINGSWEGEN 12
4.3 IMPACT OP DE OMGEVING VOOR ALLE FASES 12
4.4 HINDERKALENDER 12

5 BEREIKBAARHEID (BH) 13

5.1 BEREIKBAARHEID ALLE NOODZAKELIJKE MODALITEITEN 13
5.2 PARKEERVAKKEN EN BEPERKEN PARKEERDRUK 13
5.3 BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID WONINGEN 13
5.4 VOETGANGERS EN FIETSERS 13
5.5 NOOD- EN HULPDIENSTEN 14
5.6 EISEN NOOD- EN HULPDIENSTEN 14
5.7 STREMMING AFSTEMMEN MET WEGBEHEERDER 14
5.8 TOEGANGEN BIJEENKOMST- EN GEZONDHEIDSGEBOUWEN VRIJHOUDEN 14
5.9 BOUWVERKEER (VRACHTWAGENS) 14
5.10 OPENBARE RUIMTE 15
5.11 GEEN TEGENGESTELD VERKEER 15
5.12 AAN EN AFVOER MATERIAAL EN MATERIEEL 15
5.13 HUISVUIL EN BEDRIJFSAFVAL 15

6 LEEFBAARHEID (LH) 16

6.1 WERKTIJDEN 16
6.2 GELUID, STOF EN TRILLINGEN 16
6.3 VERLICHTING 16
6.4 BOUWTERREIN 17
6.5 BOUWHEKKEN 17
6.6 EMISSIE REDUCEREN 18
6.7 ONTTREKKING 18
6.8 OVERDRACHT 18
6.9 VERHUIZINGEN EN VERBOUWINGEN 18

7 VEILIGHEID (VH) 19

7.1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN 19
7.2 SCHADE OP EN OM DE BOUWPLAATS 19
7.3 MENSEN MET EEN MOBILITEITSBEPERKING 19

7.4 BOUW- EN WERKTERREIN 19
7.5 IN- EN UITRITTEN 20
7.6 SOCIAAL VEILIGE OMGEVING 20
7.7 FASERINGS-, OMLEIDINGS-, BEBORDINGS- EN BEBAKENINGSTEKENINGEN 20
7.8 HIJSWERKZAAMHEDEN 20
7.9 CALAMITEITEN 20
7.10 DRINKWATERLEIDING 20
7.11 BLVC-CHECKLIST 20
7.12 BEWUSTE BOUWERS 21

8 COMMUNICATIE (UP050.5) 22

8.1 DE ROLVERDELING: WIE DOET WAT? 22
8.2 COMMUNICATIEBOODSCHAP B-CN011 22
8.3 DOELGROEPEN (BOUW)COMMUNICATIE 23
8.4 COMMUNICATIEMIDDELEN B-CN011 24
8.5 WANNEER WELKE COMMUNICATIE? 26
8.6 KLACHTENAFHANDELING EN TERUGKOPPELING 27

9 KABELS EN LEIDINGEN 28

9.1 K&L-COÖRDINATIE 28
9.2 BESCHERMING KABELS EN LEIDINGEN 28
9.3 OPSTELLEN VAN TEKENINGEN 28
9.4 TRAJECT VOOR START UITVOERING 28
9.5 LEVEREN GEGEVENS KABELS EN LEIDINGEN 28
9.6 HANDHAVEN EN AFSTEMMEN KABELS EN LEIDINGEN DERDEN 28

BIJLAGEN 29

BIJLAGE 1 CONTACTPERSONEN (UP050.6) 30

BIJLAGE 2 FASERINGS, OMLEIDINGS, BEBORDINGS- EN BEBAKENINGSTEKENINGEN (UP051) 32

BIJLAGE 3 HINDERKALENDER 33

BIJLAGE 4 COMMUNICATIE MIDDELENMATRIX (UP050) 34

BIJLAGE 5 COMMUNICATIEKALENDER 36

BIJLAGE 6 PROJECTEN/EVENEMENTEN LIJST 37

BIJLAGE 7 MELDINGENREGISTER 39

BIJLAGE 8 (BOUW)PLANNING (UP040) 40

BIJLAGE 9 LOCATIE BOUWKEET EN OPSLAGTERREIN 41

BIJLAGE 10 VERIFICATIERAPPORT BLVC-UITVOERINGSPLAN 42

1 Inleiding

Dit BLVC-(Uitvoerings)plan is geschreven voor het project Planmatig Onderhoud Tuindorp Oostzaan in opdracht van de gemeente Amsterdam. In dit plan wordt beschreven hoe KWS Infra omgaat met de aspecten Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie binnen het project. De eisen uit het BLVC-kader en aanbieding zijn verwerkt in het BLVC-(Uitvoerings)plan (OM100/B-OM020/UP020/UP040).

1.1 Aanleiding

De woonwijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord is toe aan planmatig onderhoud. Het onderhoud is vooral afgestemd op de verkeersveiligheid, de duurzaamheid en het rainproof maken van de wijk. De gemeente Amsterdam, eigenaar van de verkeersinfrastructuur, groen- en speelvoorzieningen, is de opdrachtgever voor dit project. Waternet, eigenaar van de ondergrondse infrastructuur, heeft zijn werkzaamheden verwerkt in het contract maar treedt niet op als opdrachtgever. Het project is door de gemeente Amsterdam gegund aan KWS Infra.

1.2 Doel

Het doel van dit plan is het praktisch uitwerken van de BLVC-eisen uit het BLVC-kader en de aanbieding in een BLVC-uitvoeringsplan. In dit plan staat beschreven waar, wanneer en hoe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden om de hinder voor de omgeving en de bereikbaarheid van alle aanwezige modaliteiten te borgen. Het concept BLVC-uitvoeringsplan wordt met de gemeente Amsterdam besproken (B-UP053). Vervolgens wordt het aangepaste concept BLVC-Uitvoeringsplan besproken bij het WIOR-vooroverleg met Stadsdeel Noord. Tijdens dit vooroverleg geeft KWS Infra een toelichting op het plan. Doordat hoofdnet fiets gedeeltelijk binnen de projectgrenzen ligt dient het BLVC-uitvoeringsplan ook in de werkgroep WWU te worden besproken. Na akkoord in het WIOR-vooroverleg en de WWU kan KWS Infra met het definitieve BLVC-uitvoeringsplan de WIOR-vergunning aanvragen. Daarnaast wordt het BLVC-uitvoeringsplan gebruikt voor het informeren van alle stakeholders. (UP010, UP020, UP030, Annex1-003, B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5, B-UP052, B-UP053)

1.3 Leeswijzer

Het BLVC-Uitvoeringsplan is opgesteld aan de hand van de aanbiedingsdocumenten en contractdocumenten. De contractuele eisen waaraan in het BLVC-Uitvoeringsplan wordt voldaan, zijn in het verificatierapport BLVC-Uitvoeringsplan opgenomen. In het verificatierapport is aangegeven waar een specifieke proceseis uit het contract is verankerd in het BLVC-uitvoeringsplan.

In onderstaande tabel is een link gelegd met de vereiste onderwerpen gesteld in de vraagspecificatie proces (UP050) en de locatie waarin dit is behandeld.

Nr.	Onderwerp	Locatie in BLVC-plan
1	Inleiding (aanleiding, doel, leeswijzer);	Hfst. 1
2	Projectbeschrijving (wat);	Hfst. 2
3	Omgevingsanalyse (waar / wie);	Hfst. 3
4	Toelichting fasering in woord en beeld (Hoe: dit is de kern van het BLVC-uitvoeringsplan);	Hfst. 4
5	Communicatieparagraaf met een communicatie middelenmatrix (wat / wanneer / naar wie / door wie);	Hfst. 8
6	Contactpersonenoverzicht (naam / rol / email / telefoonnummer);	Bijlage 1

Tabel 1: Onderwerpen BLVC vanuit eis UP050.

2 Projectbeschrijving

Het project 'Planmatig onderhoud verharding Tuindorp Oostzaan' is onderdeel van het 'Deltaplan Openbare Ruimte Amsterdam(DORA)', het betreft planmatig (correctief) onderhoud aan de assets verharding en mogelijk ook groen voor de wijk Tuindorp Oostzaan in Amsterdam Noord. In het kader van de aanpak van achterstallig onderhoud, zoals is opgenomen in het zogeheten DORA-programma, wordt de wijk gebiedsgericht aangepakt. Dit houdt in dat ondergrondse en bovengrondse infrastructuur op wijkniveau in één keer wordt grootschalig wordt onderhouden.

2.1 Scope van het project

De scope van het Groot Onderhoud bestaat globaal uit:

- Het vervangen van alle bestratingsmaterialen;
- Het rainproof maken van de openbare ruimte;
- Het optimaliseren en integreren van de inrichting in relatie tot de 30 km-zone door het opheffen van bestaande snelheid remmende maatregelen en treffen van nieuwe snelheid remmende maatregelen;
- Het ombouwen van het gemengd rioolstelsel tot een gescheiden stelsel, inclusief het ombouwen of vervangen van huis- en kolkaansluitingen en het vervangen en aanleggen van drainage;
- Het uitvoeren van reparaties aan de distributieleidingen van het drinkwater;
- Verwijderen van stobben;
- Verplaatsen van lichtmasten.

Scope van derden in het project:

- Het vervangen en bijplaatsen van ondergrondse afvalcontainers;
- Aanpassingen aan gasleidingen en -aansluitingen;
- Het vervangen van distributiekabels en aansluitingen elektra;
- Relinen van transportriolen;
- Aanplant bomen incl. groeiplaatsverbetering;
- Dagelijks onderhoud.

De verwachte opleverdatum van het werk is gesteld op 01 november 2020.

2.2 Projectdoelstelling

In de vraagspecificatie zijn de projectdoelstellingen geformuleerd:

- Wegwerken van het achterstallig onderhoud in de wijk;
- Voldoen aan het beleid van de gemeente: Visie openbare ruimte 2025;
- Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in de wijk;
- Beheersen van wateroverlast als gevolg van een wolkbreuk;
- Beheersen van vuilemissies vanuit het riool naar het open water;
- Verbeteren van de leefbaarheid in de wijk;
- Waarborgen van de huidige functionaliteiten, tijdens en na de uitvoering;
- Tijdens de realisatie beperken van overlast voor de aanwonenden en gebruikers van de wijk.

Om de doelstelling te kunnen bereiken zijn de volgende kritische succesfactoren van toepassing op het project:
Tijdens de realisatie van dit project beschouwt de OG de volgende kritische succesfactoren als rand voorwaardelijk voor een succesvolle en voortvarende realisatie van het project:

- Een goede samenwerking tussen OG en ON conform de in paragraaf 1.2 van de Vraagspecificatie Proces beschreven principes.
- Goede uitvoering van het contract:
    - Het aantoonbaar nakomen van contractverplichtingen;
    - Een beperkt aantal contractwijzigingen met een financiële waarde kleiner dan 10% van de aannemingssom van de realisatie;
    - Een aantoonbare werking van de kwaliteitscirkel van Deming ten aanzien van de kwaliteitsborging;
    - Een beperkte lijst met kleine gebreken bij oplevering.
- Tevreden aanwonenden en gebruikers van de openbare ruimte gemeten op basis van klachten en de afhandeling daarvan.

3 Omgevingsanalyse (UP050)

3.1 Korte beschrijving omgeving van het project

Terrasdorp ligt in de wijk Tuindorp Oostzaan van Stadsdeel Noord, zie onderstaande afbeelding. Terrasdorp is het hooggelegen deel van de stadswijk dat is gebouwd in de jaren vijftig als uitbreiding van Tuindorp Oostzaan in het kader van de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Door beperkte middelen is in deze periode geëxperimenteerd met nieuwe industriële bouwwijzen van woningen, zoals het gebruik van betonnen prefab-elementen.

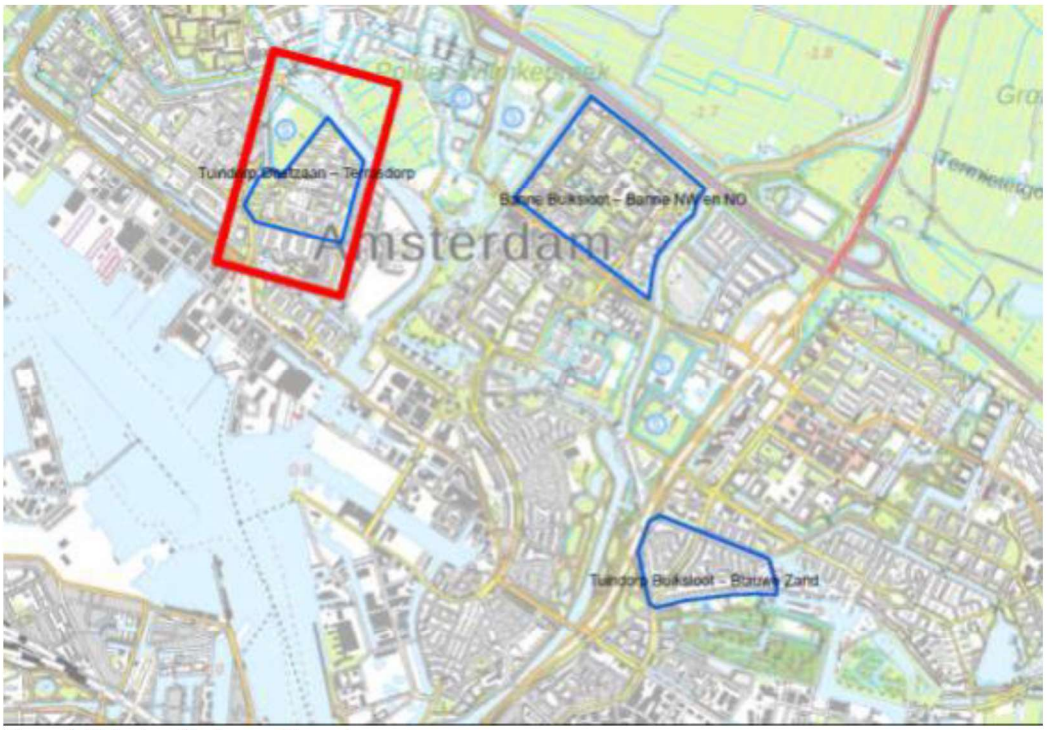

Figuur 1; Tuitndorp Oostzaan - Terrasdorp

De hoogteverschillen in de wijk zijn ontstaan doordat het gebied na de inpoldering van 1872, de Noorder IJpolder, tientallen jaren werd gebruikt als baggerstortplaats. In 1938 werd rond de Werktuigstraat het terrein in gebruik genomen als zweefvliegveld. Tijdens de mobilisatie en in Tweede Wereldoorlog tot de zomer van 1943 is het zweefvliegveldterrein gebruikt als hulpvliegveld Buiksloot. Na de oorlog is het terrein opgehoogd. De fruitbuurt als onderdeel van Terrasdorp ligt in het westelijk gedeelte van de baggerstortplaats.

De riolering en de drinkwaterleiding zijn aangelegd in de jaren vijftig. Tussen 1994 en 1997 zijn enkele reparaties aan de riolering en enkele vervangingen uitgevoerd. In 2005 heeft een grootschalige renovatie van gebouwen en buurtplein plaatsgevonden rond het Ananasplein.

In het kader van de aanpak van achterstallig onderhoud, zoals is opgenomen in het zogeheten DORA-programma, wordt de wijk gebiedsgericht aangepakt. Dit houdt in dat ondergrondse en bovengrondse infrastructuur op wijkniveau in één keer wordt grootschalig wordt onderhouden.

Het groot onderhoud aan de wijk behelst:

- Het vervangen van alle bestratingsmaterialen;
- Het rainproof maken van de openbare ruimte;
- Het optimaliseren en integreren van de inrichting in relatie tot de 30 km-zone door het
- opheffen van bestaande snelheid remmende maatregelen en treffen van nieuwe snelheid remmende maatregelen;
- Het ombouwen van het gemengd rioolstelsel tot een gescheiden stelsel, inclusief het ombouwen of vervangen van aansluitingen en het vervangen en aanleggen van drainage;
- Het uitvoeren van reparaties aan de distributieleidingen van het drinkwater.

De woningen zijn klein en hebben tuintjes aan de achterzijde en veelal ook aan de voorzijde. Naast de woningen bevat de wijk diverse voorzieningen en wat winkels rond het Ananasplein, zie onderstaande afbeelding.



Figuur 2; Satelliet afbeelding Tuindorp Oostzaan-Terrasdorp

3.2 Verkeerssituatie bij aanvang van het project

De Pomonastraat en de Werktuigstraat zijn wijkontsluitingswegen en zijn onderdeel van meerdere routes van lijnbussen van de gemeente. De toegestane snelheid is 50 km/u; de kruispunten zijn ongeregeld.
De overige straten zijn woonstraten in een 30 km zone, waarbij het profiel over het algemeen vrij smal is en daarnaast de langsparkeervakken ook te smal zijn. Ondanks het smalle profiel is er sprake van tweerichtingsverkeer. Bomen staan hoofdzakelijk in groenstroken.

Het oostelijke deel van de woonwijk heeft **drie** toegangen:
- Mandarijnenstraat;
- Pruimenstraat;
- Druivenstraat.

De Abrikozenstraat vormt binnen dit deel een belangrijke interne verbinding tussen noord en zuid. De Werktuigstraat en de Appelweg zijn onderdeel van het **hoofdnet Fiets**. Langs de Appelweg liggen woonarken die aangesloten zijn op voorzieningen langs de Appelweg.

3.3 Relevante functie en voorzieningen rondom het project

De belangrijkste functies van de wijk zijn wonen en verblijven. De voorzieningen in de wijk zijn beperkt tot:
- Een restaurant en een stomerij aan het Ananasplein;
- De zorgorganisatie Stichting Cordaan aan de Mandarijnenstraat/ Druivenstraat;
- Het Speciaal Basisonderwijs (SBO) De Zeppelin.

3.4 Relevante partijen rondom het project en hun belangen

Het project bevindt zich in een omgeving met diverse doelgroepen en belanghebbenden die te maken krijgen met de uitvoering van de werkzaamheden. Deze kunnen tijdens de uitvoering hinder ondervinden op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. De belangrijkste doelgroepen en belanghebbenden zijn:

- Stadsdeel Noord als beheerder van de wijk;
- Waternet als beheerder van de riolering en de drinkwaterleiding;
- Liander als beheerder van gas en elektra;
- Bewoners en bezoekers;
- Werknemers van vijf woningcorporaties;
- Ondernemers en bezoekers van het restaurant en de stomerij;
- Werknemers, bezoekers en patiënten van de zorgorganisatie Stichting Cordaan;
- Werknemers, bezoekers en kinderen van SBO De Zeppelin;
- Nood- en hulpdiensten;
- Onderhoudsdiensten.

3.5 Relevante omgevingsprojecten binnen het werkgebied

Naast de integrale uitvoering van de werkzaamheden vinden de volgende werkzaamheden door derden plaats:

- Verwijderen en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en plaatsen van tijdelijke Containers tijdens de realisatie;
- Relinen van transportriolen;
- Aanpassingen aan gasleidingen en -aansluitingen;
- Vervangingen van distributiekabels en aansluitingen elektra;
- Onderhoud aan groenvoorzieningen, afvalbakken, speelvoorzieningen, banken en openbare verlichting;
- Grootschalige renovatie van de woningen van Eigen Haard (Woningcorporatie Amsterdam) aan de gehele oostzijde van de wijk;

KWS Infra zorgt voor de coördinatie van de werkzaamheden zowel met de in te zetten uitvoerende partijen (derden), als met de diverse doelgroepen en belanghebbenden.

3.6 Relevante evenementen/projecten rondom het project

Tijdens de uitvoering zijn er vooralsnog geen evenementen bekend welke een raakvlak met het project opleveren.

In bijlage 6 is een lijst met projecten/evenementen opgenomen die zich in de nabijheid van het werkgebied bevinden. Deze lijst correspondeert met onderstaande afbeelding.

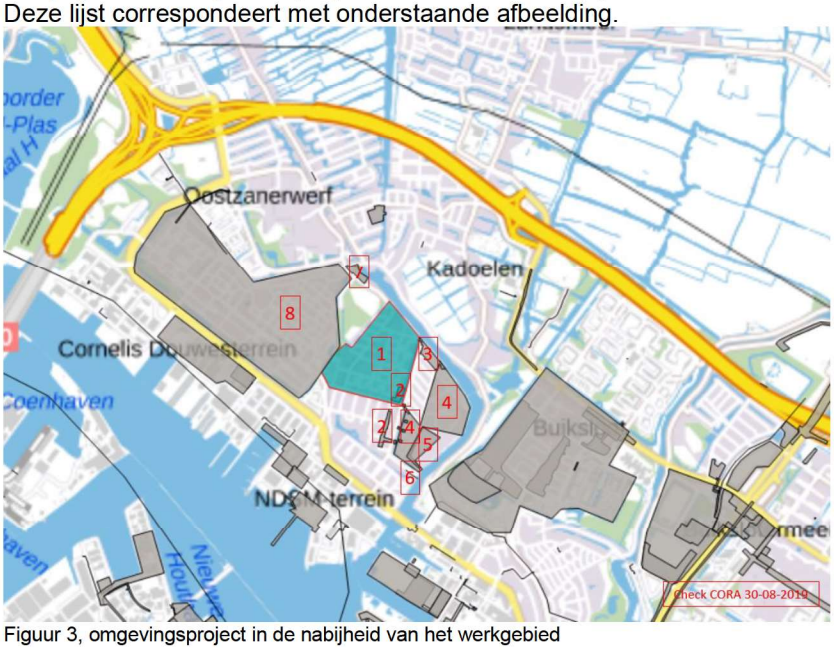

Figuur 3, omgevingsproject in de nabijheid van het werkgebied

3.7 Lijnbussen

De Pomonastraat en de Werktuigstraat zijn wijkontsluitingswegen en zijn onderdeel van meerdere routes van lijnbussen van de gemeente. In het gebied rijden de lijn 293, 35 en 36. Lijn 293 is een nachtbus.

- 293 Centraal Station – Molenwijk
- 35 Olof Palmeplein - Molenwijk
- 36 Station Sloterdijk – Buiksloterme erplein

Deze buslijnen vormen geen raakvlak met de werkzaamheden i.v.m. het buiten de scope vallen van de Pomonastraat en de Werktuigstraat.

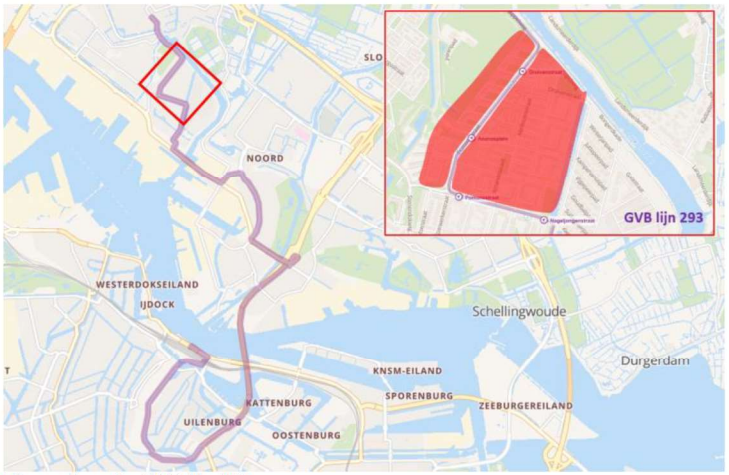

Figuur 4; route GVB lijn 293.

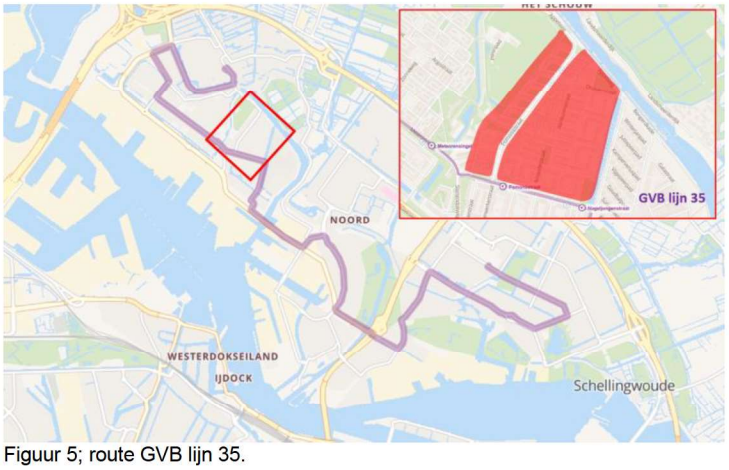

Figuur 5; route GVB lijn 35.

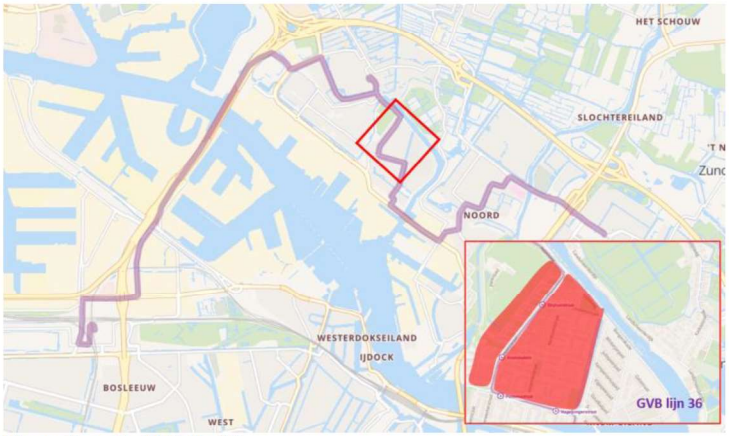

Figuur 6; route GVB lijn 36.

4 Toelichting fasering in woord en beeld

4.1 Beschrijving van de werkzaamheden (UP050.4A)

De beschrijving van dit onderdeel hangt samen met de beschreven faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen (UP051).

Om de hinder voor de omgeving te minimaliseren en de bereikbaarheid en leefbaarheid zo veel mogelijk te waarborgen wordt het project uitgevoerd in meerdere fases.

- KWS Infra heeft het projectgebied opgedeeld in twee delen met de Pomonastraat (50 km/h) als scheidingslijn.
- Aan de westzijde van de Pomonastraat worden de werkzaamheden uitgevoerd in 8 fases.
- Aan de oostzijde van de Pomonastraat worden de werkzaamheden uitgevoerd in 16 fases.
- De faseringen aan de west- en oostkant worden met twee werkploegen separaat uitgevoerd, zie figuur 7. (UP050.4A)

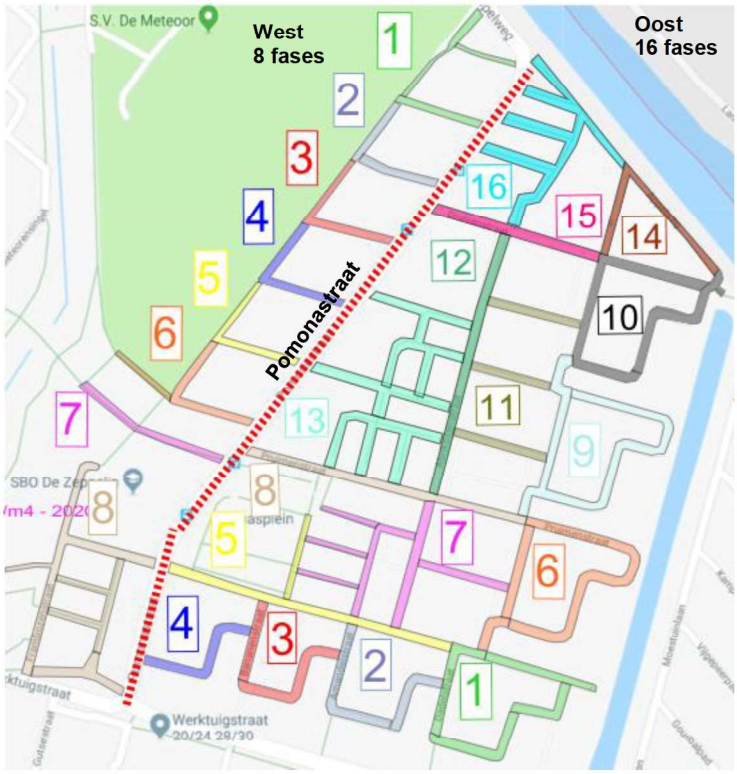

Figuur 7; Faseringen.

De werkzaamheden die worden uitgevoerd door KWS Infra en derden partijen bestaan in hoofdlijnen uit:

- Het vervangen van alle bestratingsmaterialen;
- Het rainproof maken van de openbare ruimte;
- Het optimaliseren en integreren van de inrichting in relatie tot de 30 km zone door het opheffen van bestaande snelheid remmende maatregelen en treffen van nieuwe snelheid remmende maatregelen;
- Het ombouwen van het gemengd rioolstelsel tot een gescheiden stelsel, inclusief het ombouwen of vervangen van huis en kolkaansluitingen en het vervangen en aanleggen van drainage;
- Het uitvoeren van reparaties aan de distributieleidingen van het drinkwater;
- Het verwijderen en plaatsen van ondergrondse afvalcontainers en plaatsen van tijdelijke containers tijdens de realisatie;
- Het relinen van transportriolen;
- Het aanpassingen aan gasleidingen en -aansluitingen;
- Het vervangen van distributiekabels en aansluitingen elektra;
- Het onderhoud aan groenvoorzieningen, afvalbakken, speelvoorzieningen, banken en openbare verlichting.

Bij de start van de werkzaamheden in een fase worden de betreffende straten afgezet voor doorgaand verkeer. Het doorgaand verkeer wordt hierdoor om de fase heen omgeleid. Bestemmingsverkeer blijft grotendeels bereikbaar maar doorgaand verkeer wordt gestremd.

In de fase wordt begonnen met het opbreken van de bestaande verharding en fundering, dat gesitueerd is boven op het te vernieuwen rioolstelsel van Stichting Waternet. De overige verharding blijft zo lang als mogelijk gehandhaafd om bereikbaarheid van woningen te behouden.

Vervolgens gaan de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur van start. Het bestaande gemengde rioolstelsel wordt aangepast naar een gescheiden HWA en VWA stelsel. De rioleringswerkzaamheden worden zoveel als mogelijk vanaf het laagste punt van het riool naar het hoogste punt van het riool gelegd. Daarnaast worden de drinkwaterleidingen gedeeltelijk vernieuwd en worden de nieuwe ondergrondse containers geplaatst. Wanneer de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur gereed zijn wordt de open ontgraving die hiervoor nodig is direct weer aangevuld tot en met de fundering van de nieuw in te richten verharding. (UP060)

Nadat de verharding is aangebracht wordt de bovengrondse infra opnieuw ingericht. De nieuwe verharding wordt aangebracht met nieuwe bestratingsmaterialen. Verspreid in de wijk worden nieuwe bomen geplant en worden bestaande groenstroken verlaagd en opnieuw ingezaaid zodat deze instaat zijn om water te bufferen bij hevige regenval.

Wanneer de werkzaamheden in de fase(s) zijn afgerond wordt de afzetting en omleidingsbebording verwijderd, zodat de straat voor een ieder bereikbaar is.

4.2 Woonwijk ontsluitingswegen

Doordat de wijk is opgedeeld in twee delen (oost/west) en in verschillende fases wordt uitgevoerd, is het mogelijk om het verkeer met ten minste twee ontsluitingswegen via de wijkontsluitingswegen (Pomonastraat en Werktuigstraat) te begeleiden. Daarnaast zijn de fases zo ingedeeld dat deze ook minimaal 2-zijdig bereikbaar zijn. (BH030)
De voor de ontsluitingswegen per fase wordt verwezen naar bijlage 2 Faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen.

4.3 Impact op de omgeving voor alle fases

In onderstaande hoofdstukken (**hoofdstuk 5, 6, 7 en 8**) wordt een toelichting gegeven over de impact in iedere fase(n) voor de omgeving met betrekking tot de Bereikbaarheid-, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie en de maatregelen die KWS treft om aan de (BLVC-kader) gestelde eisen te voldoen (UP050.4B).

4.4 Hinderkalender

In bijlage 3 is een hinderkalender opgenomen. Deze hinderkalender wordt gedurende het project up-to-date gehouden. In de kalender is de te verwachte hinder per week en per fase beschreven (OP050.4C).

5 Bereikbaarheid (BH)

De bereikbaarheid is van groot belang binnen het project. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloed gebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke modaliteiten. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe er met de bereikbaarheid in de hele wijk wordt omgegaan.

5.1 Bereikbaarheid alle noodzakelijke modaliteiten

Tijdens de werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer om de fase heen geleid. Alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden blijven bereikbaar met alle daarvoor noodzakelijke modaliteiten. Bestemmingsverkeer met welke modaliteit dan ook kan dus te allen tijde de straten bereiken. Doorgaand verkeer is wel gestremd i.v.m. de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. (BH010)

5.2 Parkeervakken en beperken parkeerdruk

Door werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur zijn parkeerplaatsen in iedere fase niet beschikbaar. Dit wordt in een informatiebrief aangekondigd. Het werkvak van KWS Infra onttrekt maximaal 13 parkeerplaatsen. Om tijdens de werkzaamheden het aantal parkeervakken in de wijk niet te verminderen wordt een minimaal gelijk aantal alternatieve parkeerplaatsen gerealiseerd. Deze parkeerplaatsen compenseert KWS Infra met 20 tijdelijke parkeerplaatsen langs de Kersenstraat (groenstrook Westzijde) en de groenstroken aan de Oostzijde. Hiervoor worden rijplaten op de groenperken geplaatst (B.4.4). Wanneer mindervalide parkeerplaatsen tijdelijk niet beschikbaar zijn wordt er tijdelijk een mindervalide parkeerplaats ter beschikking gesteld op maximaal 75m vanaf de bestaande mindervalide parkeerplaats. (BH180)

KWS Infra plaats minimaal 48 uur van tevoren ter plaatse een duidelijke aanduiding dat een parkeerplaats tijdelijk opgeheven wordt/is. Vooraf wordt dit verzoek ingediend bij het Stadsloket (BH150).

Openbare parkeerplaatsen binnen een fase in uitvoering dienen bereikbaar te zijn. Indien een openbare parkeerplaats tijdelijk opgeheven wordt i.v.m. werkzaamheden aangrenzend aan deze parkeerplaats, dan stemt KWS Infra dit tijdig met de wegbeheerder af (BH140). In overleg met de wegbeheerder wordt dit proces afgestemd.

5.3 Bereikbaarheid en toegankelijkheid woningen

In de fasering is het projectgebied opgedeeld in 2 stukken met de Pomonastraat als scheidingslijn. Het werk wordt met 2 werkploegen gefaseerd uitgevoerd (1 werkploeg aan iedere zijde) en op deze manier worden minimaal 2 ontsluitingswegen behouden naar de wijk. De wijk wordt tevens goed toegankelijk gehouden voor voetgangers. Het trottoir wordt zo lang mogelijk gehandhaafd. Er worden loopschotten geplaatst bij het opgebroken trottoir en voetgangersbruggen te leggen over de huisaansluiting. Voetgangers en fietsers kunnen met de fiets aan de hand de woningen bereiken (B.4.1). Omleidingsroutes voor langzaam verkeer worden tot een minimum beperkt en zijn gebaseerd op de kortste route (BH170).

5.4 Voetgangers en fietsers

De woningen, winkels en voorzieningen binnen een fase worden toegankelijk gehouden voor voetgangers. Dit doet KWS Infra door het trottoir zo lang mogelijk te handhaven, loopschotten te plaatsen bij opgebroken trottoir en voetgangersbruggen te leggen boven huisaansluitingen. Zo passeren voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand het uit te voeren werk en zijn woningen (aan de voor- en/of achterzijde) op deze manier bereikbaar. Doorgaande routes blijven hierdoor tijdens de uitvoering geschikt voor mindervaliden en worden aangebracht volgens de richtlijnen uit het handboek “Zo werken wij in Amsterdam op straat” (ZWIA). (BH090).

5.5 Nood- en hulpdiensten

Verschillend per fase geldt één of tweerichtingsverkeer met een beschikbare rijbaanbreedte van minimaal 3,5 of 5,5m. Dit is afhankelijk van de breedte van en huidige situatie in de straat. Nood- en hulpdiensten zijn bestemmingsverkeer en dus altijd bereikbaar. Door de werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur is de doorgaande weg ook voor nood- en hulpdiensten gestremd. Tijdens afstemmingsgesprekken (zie 8.4.14 Afstemmingsgesprek partijen) neemt KWS Infra 1 week voor een faseovergang contact op over de gewijzigde situatie met Nood- en hulpdiensten, afvalservice en gebiedsbeheerder (B.2.6).

De maximale afstand van de tijdelijke stremming is niet langer dan 35m i.v.m. het bereik van de ladderwagens. Buiten de stremming om kunnen redvoertuigen zich binnen maximaal 10m vanuit de gevel opstellen waarbij een opstelvak van 5x10m mogelijk is.

Naast de ladderwagens kan ook een autospuit worden opgesteld volgens de in deelparagraaf 5.6 opgenomen voorwaarden. De brandkranen worden binnen een straal van minimaal 1 meter vrijgehouden, zodat de brandkraanbordjes zichtbaar zijn en de aansluitingen van droge blusleidingen bereikbaar en vrij zijn. (VH050, BH070)

5.6 Eisen nood- en hulpdiensten

Voor nood- en hulpdiensten geldt het onderstaande (BH040):

1. Een rijbaanbreedte van 3,5 meter.
2. Een rijbaanbreedte van minimaal 5,5 in geval van tweerichtingsverkeer.
3. Een doorrijdhoogte van minimaal 4,20 meter (of bestaande hoogte).
4. Een bochtstraal van ten minste R7.
5. Een maximale verticale helling van 7%. (ca. 12°).
6. Een toelaatbare asbelasting hebben van min. 10 ton. (VK 30).

Indien, tijdens de werkzaamheden om wat voor reden dan ook, de eisen m.b.t. de toegankelijkheid van de nood- en hulpdiensten niet wordt behaald neemt onze omgevingsmanager direct contact op met de afdeling BBA van Brandweer Amsterdam.(B-BH041)

Voor opstelvakken voor de **autospuit** gelden de volgende randvoorwaarden (BH060):

1. Afstand opstelvak autospuit tot eengezinswoning is max. 40 meter.
2. Opstelvak autospuit heeft minimaal (lxb) = 10 x 4m.
3. Afstand opstelvak autospuit tot ingang flatgebouw, bedrijfspand e.d. max. 10 meter.
4. Aslast 10 ton en totaalgewicht 15 ton (VK 30).

5.7 Stremming afstemmen met wegbeheerder

Bij een onvermijdelijke stremming van een modaliteit dient het werkgebied, de omleidingsroute en het bebordingsplan vooraf te worden afgestemd met de betreffende wegbeheerder. (BH020)

5.8 Toegangen bijeenkomst- en gezondheidsgebouwen vrijhouden

Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst- en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels (BH080).

5.9 Bouwverkeer (vrachtwagens)

Bouwverkeer (vrachtwagens) is niet toegestaan op het stedelijk wegennet tijdens het hoogtepunt van de spitsuren. Die perioden zijn als volgt gedefinieerd: maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur (BH100).

Bouwverkeer mag niet wachten/stilstaan op de Pomonastraat of de Werktuigstraat. Voordat de chauffeur vertrekt dient hij zich er van te vergewissen dat er voldoende plaats is op het werkterrein / bouwterrein om te laden/lossen (BH110).

5.10 Openbare ruimte

De openbare ruimte(s) worden zo kort mogelijk onttrokken aan de openbaarheid. Hierbij wordt door KWS Infra nagestreefd om onttrekkingen zoveel mogelijk in aaneengesloten perioden te laten plaatsvinden, zodat wordt voorkomen dat (verkeer)situaties frequent wijzigen (BH120).

5.11 Geen tegengesteld verkeer

In smalle straten en straten met eenrichtingsverkeer is geen tegengesteld verkeer toegestaan. De definitie van smalle straten luidt: Een smalle straat is een straat met een rijbaanbreedte tot 4,25 meter. (LH180).

5.12 Aan en afvoer materiaal en materieel

Om verhoogde verkeersdrukte tijdens spits- en schooltijden te voorkomen en veilige loop- en fietsroutes naar SBO De Zeppelin te behouden wordt alleen tussen 9:30-14:00 uur transport geleverd. Om de veiligheid verder te borgen, voert KWS Infra alle achterwaartse verkeersbewegingen onder begeleiding van een medewerker uit (B.4.5).

transporteren - buiten het vaste team "KWS Infra" om (het personeel, aan- en afvoer puin, stratenmakers en rioleurs) – (steen)leveranties) alleen tussen 9:00-14:00u.

5.13 Huisvuil en bedrijfsafval

Wanneer reguliere ophaalplek tijdens de werkzaamheden in een fasering tijdelijk niet beschikbaar is, wordt hier in overleg met de wegbeheerder een alternatieve locatie ingericht.

In de straat waar KWS Infra de werkzaamheden verricht, haalt de omgevingsassistent elke ochtend om 9:00 uur vuilniszakken op. De bewoners moeten deze vuilniszakken voor hun woningen plaatsen. De omgevingsassistent brengt de vuilniszakken vervolgens naar de alternatieve locatie waar het door de afvalservice wordt opgehaald. Hierdoor blijft het projectgebied netjes (BH130, B.4.2).

6 Leefbaarheid (LH)

Het is belangrijk gedurende de werkzaamheden de leefbaarheid voor mens en natuur in stand te houden. KWS Infra voert de werkzaamheden zodanig uit dat de hinder beperkt wordt (LH010). Op het gebied van leefbaarheid zijn een aantal standaard uitgangspunten/werkwijze. Onderstaande aspecten zijn van toepassing om de hinder zoveel mogelijk te beperken.

KWS Infra managet zijn werkzaamheden (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen (OM010).

6.1 Werktijden

De werkzaamheden (door KWS Infra) worden normaliter uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur (LH070). *De werkzaamheden mogen van maandag t/m zaterdag van 7:00 – 19:00 uur worden uitgevoerd. Onderstaande tekst beschrijft wanneer KWS Infra de werkzaamheden mag uitvoeren en/of hier een extra ontheffing voor benodigd is.*

Het Amsterdamse college van B&W wenst dat werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond, rekening houdend met de leefbaarheid voor de omgeving. KWS Infra voert de werkzaamheden uit gedurende de in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Amsterdam vastgestelde tijden (LH070).

- KWS Infra mag werken van maandag t/m zaterdag van 7.00 – 19.00 uur;
- Voor werkzaamheden buiten de periode van 07.00 tot 19.00 uur (reguliere werktijden) is een ontheffing benodigd.

6.2 Geluid, stof en trillingen

Om fysieke hinder als gevolg van geluid, stof en trillingen te beperken voert KWS Infra luidruchtige werkzaamheden (stenen slijpen en verdichten) na 8:00 uur uit en rijdt al het materieel van KWS Infra max 15 km/u in de wijk, (B.4.3) worden watergangen bevochtigd en worden er trillingsarme verdichtingsmethode toegepast.

Te behoeve van het gebruik van materieel binnen de begrenzing van het bouwterrein worden technische en/of organisatorische maatregelen getroffen om de geluidproductie van de stationaire en mobiele installaties te beperken (LH160).

KWS Infra toont aan dat zij alle eenvoudig toepasbare en betaalbare mogelijkheden t.b.v. geluid reducerende maatregelen hebben onderzocht en toegepast (LH020).

Tijdens de uitvoering worden geluid en trillingen gemonitord. In het contract (UV400 t/m UV450) wordt aangegeven aan welke eisen deze opname en monitoring moet voldoen. In algemene zin dient KWS Infra te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving of, indien strikter, Amsterdams beleid. Indien men voornemens is af te wijken van de wet- en regelgeving zal een ontheffing op het Bouwbesluit 2012 aangevraagd moeten worden. De aanvraag dient tijdig (6 weken voor aanvang van de werkzaamheden) ingediend te worden. Het College van burgemeester en wethouders, voor deze het dagelijks bestuur van het stadsdeel, kan eisen stellen met betrekking tot maximale geluidbelasting en desgewenst een prognose onderzoek en/of geluidmetingen eisen (B-LH012) .

6.3 Verlichting

In de periode waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd op tijden waarin het daglicht niet schijnt wordt (noodzakelijke) bouwverlichting geplaatst. KWS Infra zorgt er voor dat deze verlichting die wordt gebruikt geen overlast veroorzaakt voor derden. De bouwverlichting wordt niet gericht op: de openbare weg, gebouwen of woningen en voorzieningen in de omgeving van de bouwplaats (LH030).

6.4 Bouwterrein

De locatie van de bouwkeet en opslagterrein bevindt zich aan de Druivenstraat en Appelweg, zie bijlage 9. De locaties van de bouw(keet)- en werkterreinen worden aan de bewoners tijdens de omgevingsbijeenkomst en via de omgevingsapp bekend gemaakt. Daarnaast wordt de locatie vermeld in de start-fasebrief. Het verdere proces wordt nog nader afgestemd met de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam.

6.4.1 Bouw- en werkterrein dagelijks opruimen

KWS Infra zorgt er met de omgevingsassistent voor dat het bouw- en werkterrein netjes, schoon en dagelijks opgeruimd is. Hierdoor wordt verspreiding van opwaaiende materialen en bodem- en stofdeeltjes vanaf het werkterrein geminimaliseerd/voorkomen (LH040).

Daarnaast zorgt KWS Infra er voor dat het bouwmaterieel dat het bouw- en werkterrein verlaat schoon is zodat de openbare ruimte in de wijk niet wordt vervuild (LH050) .

6.4.2 Materiaal en materieel binnen bouwhekken opslaan

KWS Infra slaat het materiaal en materieel binnen de afzetting van het werkterrein (tijdelijk) op. KWS Infra is niet toegestaan om materiaal tegen de bouwhekken op te slaan. Materiaal dient minimaal 1 meter uit de bouwhekken te worden opgeslagen (LH110).

KWS Infra dient sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken bereikbaar en/of bedienbaar te houden (BH160).

6.4.3 Afzetting openbare ruimte

KWS infra verzorgt de afzetting tijdens de werkzaamheden. Hierbij wordt gezorgd voor een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer, een afzettingsgebied voor de werkzaamheden en veiligheidsruimte en bouwhekken voor de afsluiting van het werkterrein. De openbare ruimte die wordt onttrokken word hierbij zo klein en kort mogelijk gehouden. (LH130, LH140)

6.4.4 Nutsvoorzieningen

Tijdens de werkzaamheden worden de vuilwaterafvoer, de gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen mogelijk buiten gebruik gesteld. Het aantal uren dat deze voorzieningen buiten gebruik worden gesteld worden tot een minimum beperkt. (LH190)

6.5 Bouwhekken

Het zicht rondom het projectgebied kan door het plaatsen van afzettingen worden verminderd. De wijze van afzetten (een open, dicht, hoog of laag hek), de locaties waar het werkterrein in- en uitgereden wordt zijn zaken die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid van het projectgebied. KWS Infra dient aan te geven waarom gekozen wordt voor een hoog of laag hek en/of waarom eventueel afgeweken wordt van een dicht hek (geredeneerd vanuit veiligheid, functionaliteit, leefbaarheid). (B-VH101)

6.5.1 Bouwhekken voorwaarden

KWS Infra past bouwhekken toe die aan onderstaande voorwaarden voldoen (LH080):

- Bouwhekken hebben een hoogwaardige uitstraling;
- Bouwhekken zijn afgestemd op de omgeving;
- Bouwhekken zijn minimaal halfdicht;
- Bouwhekken geven geen ruimtebeperking aan openbare zijde;
- Aan bouwhekken kunnen geen fietsen worden bevestigd;
- Bouwhekken mogen geen uitstekende onderdelen bevatten.

6.5.2 Locatie bouwhekken

KWS Infra plaatst de bouwhekken zodanig dat de bouwafscheiding aan onderstaande voorwaarde voldoet (LH090):

- De bouwhekken staan in een rechte lijn;
- De bouwhekken zijn onderling gekoppeld;
- De bouwhekken blokkeren niet het zicht tussen de verkeersdeelnemers;
- Bouwhekken worden zodanig geplaatst dat er geen nissen en onoverzichtelijke hoeken ontstaan.

6.5.3 Uitingen bouwhekken

Uitingen op de bouwhekken zijn niet toegestaan anders dan bij onvindbaarheid / onzichtbaarheid van ondernemingen. Uitingen op de bouwhekken worden door KWS Infra ter akkoord voorgelegd aan de gemeente Amsterdam. (LH100)

6.6 Emissie reduceren

KWS Infra toont aan dat zij alle eenvoudig toepasbare en betaalbare mogelijkheden t.b.v. emissie reducerende maatregelen hebben onderzocht en toegepast bij de aan- en afvoer van materialen (LH060).

6.7 Onttrekking

Een onttrekking dient een aaneengesloten periode te zijn waarin alle werkzaamheden plaats vinden (LH150).

6.8 Overdracht

Na het gereedkomen van het werk dient KWS Infra het gebied dat tijdelijk uit verkeer genomen is weer over te dragen aan de gemeente Amsterdam en KWS legt dit schriftelijk vast in een rapportage ondersteund met foto's (eindmeting) (LH120).

6.9 Verhuizingen en verbouwingen

Verhuizingen en verbouwingen dienen mogelijk te blijven c.q. gefaciliteerd te worden (LH170).

7 Veiligheid (VH)

KWS Infra doet er als opdrachtnemer alles aan om de veiligheid die is gerelateerd aan de werkzaamheden te maximaliseren. KWS Infra is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een van de bedrijfsdoelstellingen is om werkzaamheden met betrekking tot integraal veiligheidsmanagement te verrichten. De werkzaamheden en resultaten van werkzaamheden worden op een veilige en gezonde wijze verricht en gerealiseerd. Zodanig dat het werk veilig en gezond gebruikt, onderhouden en te zijner tijd gesloopt kan worden. Dit geldt voor zowel werknemers als voor de bewoners en overige verkeersdeelnemers in de definitieve en tijdelijke situaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase en uitvoeringfase dat voldoet aan alle eisen die worden gesteld in het Arbeidsomstandigheden besluit en conformeert aan het KAM-systeem van KWS infra (VH010, VH020). Onderstaande aspecten zijn van toepassing om de veiligheid op het project zoveel mogelijk te waarborgen.

7.1 Tijdelijke verkeersmaatregelen

De tijdelijke verkeersmaatregelen, die in de omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen zijn weergegeven, zijn eenduidig en helder weergegeven en realiseren een passende situatie conform de richtlijnen uit de CROW-publicatie Werk in uitvoering 96B. (VH020)

7.2 Schade op en om de bouwplaats.

Wanneer tijdens de bouwperiode vervuiling en/of beschadiging plaatsvindt buiten het werkterrein in de openbare ruimte door KWS Infra of één van haar onderaannemers wordt deze binnen 24 uur herstelt op kosten van de opdrachtnemer. (VH030, VH040)

De wegbeheerder van de gemeente Amsterdam, controleert de toestand en het comfort van de wegen, fiets- en voetpaden met de omgevingsmanager van KWS Infra of de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam. Deze controle vindt regelmatig plaats tijdens het zogenaamde “rondje om de bouwplaats”. In overleg met de wegbeheerder worden eventuele schades aan de weg hersteld door KWS Infra of de wegbeheerder zelf. Waarbij de kosten voor rekening van KWS Infra komen. Wanneer het niet mogelijk of wenselijk is om een ontstane schade binnen 24 uur na constatering te herstellen, dient KWS Infra de situatie in ieder geval binnen deze periode van 24 uur veilig gesteld te hebben en te hebben onderbouwd waarom herstel binnen de gestelde termijn niet mogelijk is. (VH050, VH060, VH070)

Om schade bij aanvang van de werkzaamheden vast te stellen voert KWS Infra een 0-meting uit. Deze 0-meting is bindend en wordt schriftelijk vastgelegd in een rapportage en ondersteund met foto’s. (VH080)

7.3 Mensen met een mobiliteitsbeperking

Wanneer een fase wordt voorzien van tijdelijke verhardingen zijn deze vlak, stroef en wordt expliciet rekening gehouden met mensen met een mobiliteitsbeperking conform de comforteisen die zijn opgenomen in de ZWIA. Hierdoor bevatten tijdelijke voetgangersvoorzieningen geen kieren en hoogte verschillen van meer dan 2cm. Wanneer aan deze comforteis niet kan worden voldaan legt KWS Infra een overbruggingsconstructie van het betreffende hoogte verschil voor aan de omgevingsmanager. Gaten en sleuven worden op deze manier duidelijk afgezet en afgedekt (VH090, VH240, VH250)

7.4 Bouw- en Werkterrein

Het werkterrein waar KWS Infra vierentwintig uur per dag verantwoordelijk voor is, dient te worden voorzien van een bouwplaatsafscheiding middels bouwhekken met toegangspoort(en) die buiten werktijden moeten worden afgesloten met sloten, zodat het betreden van onbevoegden binnen het werkterrein wordt voorkomen. De brandweer wordt voorzien van een “loper” waarmee toegang verschaft kan worden tot het werkterrein in geval van een calamiteit. Aan de buiten zijde van de toegangspoort(en) wordt bebording aangebracht m.b.t. ISO/VCA en calamiteiten. Op het bord m.b.t. calamiteiten wordt het telefoonnummer vermeld waarmee 24/7 contact kan worden opgenomen. (VH100, VH110, VH120). Ondanks dat het werkterrein wordt afgesloten met sloten om het betreden van onbevoegden te voorkomen, worden elektrische installaties, machines en werktuigen op het werkterrein opgeborgen of vergrendeld. Buiten het werkterrein worden dergelijke middelen nooit onbeheerd achtergelaten. Dit om te voorkomen dat, wanneer onbevoegden alsnog het terrein weten te betreden, deze in werking kunnen worden gesteld. (VH130)

7.5 In- en uitritten

Het werkterrein wordt voorzien van veilige en overzichtelijke in- en uitritten. De in- en uitritten worden voorzien van verkeers- en tekstborden. Daarnaast worden maatregelen genomen om bouwverkeer op een veilige manier het werkterrein in- en uit te laten rijden waarbij de verkeersstromen niet in gevaar komen. Deze maatregel wordt in overleg met de gemeente Amsterdam en na akkoord van de gemeente Amsterdam toegepast in het werk. Wanneer verkeersregelaars worden ingezet zijn deze in het bezit te zijn van een aanstellingscertificaat verkeersregelaar dat geldig is binnen de gemeente Amsterdam. Daarnaast hebben zij deze tijdens de werkzaamheden te allen tijde bij zich.(VH140, VH150, VH160)

7.6 Sociaal veilige omgeving

Om een sociaal veilige omgeving te creëren verlicht KWS Infra het gebied rondom het werkterrein conform de richtlijn ROVL 2011. (VH170)

7.7 Faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen.

In de bovenstaande hoofdstukken en deelparagraven is een toelichting gegeven wat de impact is voor de omgeving in de faseringen met betrekking tot Bereikbaarheids-, Leefbaarheids- en Veiligheidsmaatregelen die KWS treft om te voldoen aan de (BLVC-kader) gestelde eisen (UP050.4B). De beschrijving van deze onderdelen hangt samen met de beschreven faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen.

In bijlage 2 vindt u de bijbehorende tekeningen m.b.t. de verschillende faseringen (UP051).

7.8 Hijswerkzaamheden

Wanneer tijdens de werkzaamheden een bouwkraan wordt in gezet draait deze niet over rijbanen, fietspaden of werkterreinen van derden. Wanneer om welke reden dan ook in de uitvoering toch blijkt dat afwijking hiervan noodzakelijk is toont KWS Infra vooraf aan dat andere oplossingen niet mogelijk zijn. Daarnaast worden deze hijswerkzaamheden in en over de openbare ruimte altijd begeleid door een verkeersregelaar die in het bezit is van een aanstellingscertificaat. (VH180, VH190)

7.9 Calamiteiten

Om in geval van calamiteiten gesteld te staan is het Calamiteitenplan met het documentnummer TDOZ000311 opgesteld. Hierin is opgenomen dat KWS Infra zijn organisatie zo heeft ingericht dat zij in geval van calamiteiten via de hoofduitvoerder altijd 24/7 bereikbaar zijn op het nummer 020-5694200. (VH200)

7.10 Drinkwaterleiding

In verband met de hygiëne van de drinkwaterleidingen worden de werkzaamheden aan de riolering en de drinkwaterleiding separaat uitgevoerd. Het bedrijf Gebr. Kooijman B.V. die als onderaannemer van KWS Infra de werkzaamheden gerelateerd aan Waternet uitvoert, werkt conform de certificatieregeling kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven. Door reinheid van gereedschappen en materieel voor de werkzaamheden aan de drinkwaterleidingen wordt hygiëne te waarborgen. Hierdoor wordt besmetting van de drinkwaterleiding voorkomen. (VH210, VH220, VH230)

7.11 BLVC-checklist

Om te kunnen controleren of alle beheersmaatregelen uit het BLVC-uitvoeringsplan, het handboek ZWIA en de communicatiekalender worden uitgevoerd wordt een checklist opgesteld. Deze checklist wordt dagelijks getoetst door een medewerker van KWS Infra. Wanneer beheersmaatregelen ontbreken of onvolledig zijn, herstelt KWS Infra dit dezelfde werkdag en wordt de toets opnieuw uitgevoerd. (B.4.6)

7.12 Bewuste bouwers

Om het omgevingsbewustzijn van de medewerkers te vergroten, geeft Bewuste Bouwers eenmalig voor start uitvoering een toolbox. KWS Infra conformeert aan de aan de gedragscode van Bewuste Bouwers.
Zij toetsen tijdens de uitvoering tweemaal op willekeurige momenten, met een mistery guest, of KWS Infra de werkzaamheden op een omgevingsvriendelijke manier uitvoeren. Dit doen zij op de onderdelen: Bewust, Veilig, Milieu, Verzorgd en Sociaal. Bewuste Bouwers geeft KWS Infra een cijfer van 0 tot 10. KWS Infra streeft ernaar om op elke normkaart minimaal een 8 te scoren. Mocht dit niet het geval zijn dan stelt de projectleider van KWS Infra binnen één week een verbeterplan op en voert dit na akkoord binnen twee dagen door. Daarnaast maakt KWS Infra ook aan de omgeving zichtbaar er volgens het principe van Bewuste Bouwers gewerkt wordt. Er wordt een spandoek opgehangen van Bewuste Bouwers aan de bouwhekken waarmee de omgeving uitgenodigd wordt om onjuistheden te melden. (B.4.7)

8 Communicatie (UP050.5)

Het deel communicatie richt zich op de communicatie in de uitvoeringsfase van het project. Het project Tuindorp Oostzaan wordt uitgevoerd in een omgeving waarin verschillende partijen eigen belangen hebben. Om daar goed mee om te gaan, is het noodzakelijk de doelgroepen goed te kennen en te weten wat de invloed van de werkzaamheden is op deze doelgroepen. De nadruk ligt op tijdig, helder en volledig informeren van de doelgroepen over de werkzaamheden en de daarmee samenhangende verkeermaatregelen en hinder. Hiervoor zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar, die afhankelijk van de over te brengen boodschap voor een specifieke doelgroep kunnen worden ingezet.

In een afzonderlijk document “communicatiekalender” wordt aangeven op welk moment welke boodschap naar welke doelgroep gecommuniceerd wordt en welke communicatiemiddelen daarbij gebruikt worden. De rolverdeling: tussen wie doet wat, doelgroepen (bouw)communicatie, communicatiemiddelen, wanneer welke communicatie, klachtenafhandeling en terugkoppeling worden in onderstaande paragraven nader uitgewerkt.

8.1 De rolverdeling: wie doet wat?

8.1.1 Publiekscommunicatie

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de publiekscommunicatie. Alle communicatie uitingen naar omwonenden, externe professionele stakeholders en de pers is de gemeente Amsterdam de afzender. De gemeente Amsterdam is eindverantwoordelijk voor omgevingsmanagement inclusief externe communicatie en voert regie over de communicatie naar buiten (CN030).

8.1.2 Bouwcommunicatie

KWS Infra is verantwoordelijk voor de bouwcommunicatie. De omgevingsmanager van KWS Infra is het eerste aanspreekpunt voor de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam. De omgevingsmanager van KWS Infra is dagelijks te bereiken voor vragen en opmerkingen vanuit de gemeente Amsterdam. (CN020)

KWS Infra voorziet de gemeente Amsterdam periodiek en tijdig van relevante informatie (omtrent het project, voortgang, planning, fasering, omleidingen, verwachte overlast), zodat er voldoende gelegenheid is om de doelgroepen tijdig te informeren (CN040).

Er wordt gezorgd voor een eenduidige, eerlijk en (vroeg)tijdige communicatie (zie paragraaf 8.5 Wanneer welke communicatie) naar alle relevante belanghebbenden, zodat de omgeving ruim van te voren op de hoogte is van de werkzaamheden en de hinder die dit mogelijk met zich mee brengt. Dit heeft betrekking op Bereikbaarheid, Leefbaarheid en/of Veiligheid voor de omgeving (B-OM020).

8.2 Communicatieboodschap B-CN011

Onderstaande tekst staat beschreven in informatiebrief en KWS app:
De gemeente Amsterdam werkt aan het project Planmatig Onderhoud Tuindorp Oostzaan. Het hooggelegen deel van de stadswijk “Terrasdorp” is toe aan groot onderhoud. Dit houdt in dat alle werkzaamheden onder en boven de grond voor de gehele wijk in één keer aangepakt worden. De wijk wordt hierbij rainproof (klimaatbestendig), duurzamer en veiliger gemaakt. Dit werk is noodzakelijk omdat anders bij hevige regenbuien uw straat overstroomt en niet meer bereikbaar is. Het project start vanaf 4 november 2019 en is naar verwachting begin november 2020 gereed. KWS Infra realiseert dit werk in opdracht van de gemeente Amsterdam. Met deze brief informeren wij u over de komende werkzaamheden en de te verwachte (mogelijke) hinder voor de omgeving.

Het werk in de wijk wordt gefaseerd uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt in dat het project in 16 verschillende fases wordt uitgevoerd. Elke bewoner wordt vooraf geïnformeerd over de werkzaamheden die bij u in de wijk en in de straat noodzakelijk zijn.

Ter informatie: Dit noodzakelijke onderhoud laat helaas geen ruimte toe voor verdere herinrichting en overige wensen vanuit bewoners.

8.3 Doelgroepen (bouw)communicatie

In het project worden diverse doelgroepen onderscheiden. Dit zijn partijen die dagelijks betrokken zijn bij de realisatie van het project. In de onderstaande (deel)paragrafen zijn de doelgroepen verder uitgewerkt. Hierbij kunnen per doelgroep gerichte maatregelen getroffen worden.

De onderstaande doelgroepen m.b.t. bouwcommunicatie worden in de deelparagrafen verder uitgewerkt (CN-040):

- Bewoners (direct omwonenden);
- Ondernemers;
- Weggebruikers
- Hulpverleningsdiensten, afvalservice en gebiedsbeheerder.
- SBO De zeppelin;
- Woningcorporaties.

8.3.1 Direct omwonenden

Direct omwonenden ervaren vaak hinder van geluid, licht, stof en trillingen. Ook zichthinder en bereikbaarheid zijn belangrijke aandachtspunten. Door goede communicatie over de noodzaak, het tijdstip en de tijdsduur van de werkzaamheden wordt begrip gekweekt voor de overlast en wordt de hinderbeleving verminderd.

8.3.2 Ondernemers

Van groot belang voor ondernemers van direct aanliggende percelen zijn de bereikbaarheid en een goede logistieke ontsluiting van hun locaties. Door hier goed op in te spelen, wordt voorkomen dat deze doelgroepen ontevreden zijn en de hinder beperkt wordt.

8.3.3 SBO De zeppelin;

Voor de school is een goede bereikbaarheid van belang en beperkte hinder tijdens de lesuren. Daarnaast is een veilige looproute rondom de school erg belangrijk. Vier weken voor start uitvoering worden er veiligheidslessen georganiseerd door KWS Infra. Tijdig wordt overleg ingepland met de school i.v.m. afstemmingen.

8.3.4 Weggebruikers

De weggebruiker/bewoner wordt via de juiste communicatiekanalen tijdig voor aanvang van hindervormende werkzaamheden geïnformeerd. Dit doet KWS Infra d.m.v. de informatiebrief, de omgevingsbijeenkomst en de KWS app. Daarnaast worden weggebruikers door bouwborden en aankondigingsborden geïnformeerd, welke door KWS Infra geplaatst worden.

KWS infra verschaft de gemeente Amsterdam tijdig de juiste informatie t.b.v. voor publiekscommunicatie.

8.3.5 Hulpverleningsdiensten en afvalservice en gebiedsbeheerder

Het belang van de wegbeheerder/ gebiedsbeheerder is een goede en veilige instandhouding van de wegen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Het BLVC-uitvoeringsplan wordt voorgelegd in WWU-vooroverleg. Hier zijn de hulpverleningsdiensten ook bij aanwezig. De hulpverleningsdiensten/ afvalservice en gebiedsbeheerder worden één (1) week voor een faseovergang geïnformeerd over de wijzigende situatie. Bij afwijkingen die tot een ander verkeersbeleid leiden, worden deze partijen binnen één werkdag hierover geïnformeerd.

Wanneer de reguliere ophaalplek tijdens de werkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar is, wordt hier in overleg met de wegbeheerder een alternatieve locatie ingericht.

8.3.6 Woningcorporaties

Vooraf aan de werkzaamheden ontvangen de vijf relevante woningcorporatie en Aannemer de Nijs tevens een bewonersbrief t.b.v. de bereikbaarheid van woningen en parkeergelegenheid.

8.4 Communicatiemiddelen B-CN011

KWS Infra maakt voor het project Tuindorp Oostzaan gebruik van onderstaande communicatiemiddelen. Voorafgaand aan de uitvoering worden deze communicatiemiddelen tevens besproken met de gemeente Amsterdam (B.2.5). In bijlage 4 in een communicatie middelenmatrix opgenomen (B-CN011). Deze communicatie middelen matrix wordt gedurende het project up-to-date gehouden. De tabel is in chronologische volgorde opgebouwd, zoals in onderstaande (deel)paragraven is beschreven.

8.4.1 Informatiebrief voor start uitvoering

Uiterlijk vier (4) weken voor start uitvoering wordt deze informatiebrief verstuurd. De contactgegevens van de omgevingsmanager van KWS Infra wordt vermeld in de informatiebrief. Tevens komt er informatie in te staan over de omgevingsapp en een uitnodiging voor de omgevingsbijeenkomst (B.2.7). De communicatie wordt zodanig uitgevoerd, dat de omgeving tijdig op de hoogte is van de (reden van de) uit te voeren werkzaamheden, de duur, de tijdelijke maatregelen die genomen worden en de gevolgen van de werkzaamheden (CN010).

Op deze manier brengt KWS Infra voor en tijdens de uitvoering bewoners en andere belanghebbenden op de hoogte van de activiteiten en de te verwachten overlast (CN110).

8.4.2 Start fase(n) brief

Één (1) week voor een nieuwe fase wordt er door KWS Infra een informatiebrief rondgestuurd in de omgeving (B.2.11). De communicatie wordt zodanig uitgevoerd, dat de omgeving tijdig op de hoogte is van de (reden van de) uit te voeren werkzaamheden, de duur, de tijdelijke maatregelen die genomen worden en de gevolgen van de werkzaamheden (CN010).

8.4.3 Informatiedeling

De omgevingsmanager van KWS Infra levert (vooralsnog) wekelijks een informatiebrief aan bij de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam. Hierin worden belangrijke ontwikkelingen besproken die gaande zijn in de omgeving (bijv. overgang naar nieuwe fase) van afgelopen week en wordt er we vooruit gekeken naar komende week. De brief/informatie is bruikbaar voor de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam om te verspreiden in de omgeving.

Daarnaast maakt de omgevingsmanager van KWS Infra van besprekingen met stakeholders een rapportage. Deze rapportages worden binnen 2 dagen de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam gedeeld.

Tevens wordt de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam één week voor een gesprek met een stakeholder uitgenodigd om deze bij te wonen. De geplande gesprekken zijn inzichtelijk in de vigerende communicatiekalender.

8.4.4 BLVC-overleg OM

De omgevingsmanager van KWS Infra organiseert (vooralsnog) tweewekelijks (1 x per 2 weken) een BLVC-overleg met de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam. Agendapunten zijn: meldingenregister met vragen/klachten, omgevingstevredenheidsanalyses en algemeen omgevingsmanagement in Tuindorp Oostzaan.

8.4.5 Werkzaamheden aan huisaansluitingen

Werkzaamheden aan huisaansluitingen worden minimaal vier weken van tevoren schriftelijk aangekondigd en vijf dagen van tevoren schriftelijk bevestigd aan de betreffende bewoner (CN120).

8.4.6 Omgevingsbijeenkomst

Drie weken voor startuitvoering wordt een omgevingsbijeenkomst georganiseerd (B.2.8). Hierin wordt het werk, de planning en fasering met de hinderbeperkende maatregelen gepresenteerd. Tevens kunnen de bezoekers vragen en zorgen kwijt tijdens de omgevingsbijeenkomst. Deze vragen gaat KWS Infra direct beantwoorden of worden binnen 3 dagen teruggekoppeld aan de vraagsteller. Door deze omgevingsbijeenkomst te houden voelen bewoners zich gehoord en krijgen de bewoners een beeld bij het werk.

8.4.7 Omgevingsapp “KWS app”

Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal platform in de vorm van een projectspecifieke omgevingsapp “KWS app”, waartoe iedereen vrij toegang krijgt. De app dient als een open communicatiemiddel. In de app worden bewoners en andere wekelijks geïnformeerd over het meest actuele hinderprofiel en fasewisselingen. Tevens staat er algemene projectinformatie beschreven in de omgevingsapp en daarnaast de faseringsplanning en contactgegevens van de omgevingsmanager van KWS Infra. Gebruikers kunnen via de app gemakkelijk meldingen doen en vragen stellen, indien gewenst met foto. Daarnaast beschikt de omgevingsapp over een tevredenheidsmonitor. Gebruikers kunnen in de app hun tevredenheid doorgeven. (B.2.10)

*De omgevingsapp is gratis te downloaden via de App Store en/of Play Store van smartphones en/of tablets onder de volgende **projectnaam**: Tuindorp Oostzaan. Daarnaast wordt de omgevingsapp onder andere gepromoot door middel van informatiebrieven en tijdens de diverse overleggen. Via de (informatie)brief en omgevingsbijeenkomst ontvangen bewoners/ondernemers informatie hoe de app gedownload kan worden.*

8.4.8 Inloopspreekuur

KWS Infra organiseert wekelijks een inloopspreekuur voor bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens het inloopspreekuur kunnen er tevens vragen en klachten behandeld worden. (B.2.12/CN100). Het inloopspreekuur wordt vermeld in de informatiebrief start werkzaamheden en in de KWS app.

8.4.9 Keukentafelgesprekken

Twee (2) weken voor start uitvoering van een fase houdt de omgevingsmanager van KWS Infra keukentafelgesprekken met stakeholders in de omgeving om het werk af te stemmen. Deze gesprekken kunnen tijdens het inloopspreekuur plaatsvinden en/of er worden separate afspraken ingepland met de omwonenden. De omgevingsmanager van KWS Infra bespreekt dit samen met de omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam hoe hier het beste invulling aan gegeven kan worden (B.2.8.1).

8.4.10 Veiligheidsles “SBO De Zeppelin”

Vier (4) weken voor start uitvoering (fase 8) organiseert de omgevingsmanager van KWS Infra een veiligheidsles voor basisschool SBO De Zeppelin. Door deze les worden scholieren bewust van de veiligheidsrisico’s (B.2.13).

8.4.11 Vooraankondigingsborden

Eén (1) week voor de uitvoering plaats KWS Infra vooraankondigingsborden langs de af te sluiten weg (B.2.9).

8.4.12 Omleidingsborden

Omleidingsroute en rijrichting worden tijdens de afsluitingsperiode aangeven met (gele) omleidingsborden (B.2.14). De omleidingsborden worden op ieder kruispunt geplaatst.

8.4.13 Omgevingsassistent (aanspreekpunt)

KWS Infra zet een omgevingsassistent in. Dit is de rechterhand van de omgevingsmanager en uitvoerder van KWS Infra. Hij en/of zij is 5 dagen per week op het werk aanwezig om kleine ongemakken voor de omgeving te signaleren en te verhelpen. Hij en/of zij veegt en ruimt het werkgebied dagelijks op en geeft antwoord op eventuele vragen van

voorbijgangers. Hij heeft een werkjas aan met daarop een vraagteken, zodat voorbijgangers weten dat ze bij hem terecht kunnen. Effect: Dit voorkomt onnodige hinder en draagt bij aan de omgevingstevredenheid (B.2.15).

Deze omgevingsassistent is een kandidaat uit de doelgroep Social Return die wordt ingezet volgens Annex XVI Uitvoeringsregels Social Return. (Annex16-001/-002/-003/-004/-005/-006)

8.4.14 Afstemmingsgesprek partijen

In het afstemmingsgesprek worden de planning, omleiding(en) en tijdelijke afsluitingen besproken met nood- en hulpdiensten, de afvalservice en de gebiedsbeheerder (B2.6). De omgevingsmanager van KWS Infra neemt contact op met deze partijen. Vervolgens heeft KWS Infra één week voor een fase overgang contact over wijzigende situaties.

8.4.15 Publicaties en reclame-uitingen

KWS infra zal zelf geen communicatiemiddelen of andersoortige informatie (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's etc.) betreffende de werkzaamheden en/of de binnen het werkterrein gelegen objecten verspreiden en/of publiceren, tenzij vooraf schriftelijk toestemming is verleend door de gemeente Amsterdam (CN060).

8.4.16 Organisatie van evenementen

KWS Infra organiseert geen evenementen. Mocht dit wel het geval zijn dan dient KWS Infra hiervoor toestemming te vragen aan de gemeente Amsterdam (CN060) .

8.4.17 Telefonische bereikbaarheid en aanspreekbaar persoon

KWS Infra is tijdens de uitvoeringswerkzaamheden en daarbuiten 24/7 telefonisch bereikbaar. Zie tevens het calamiteitennummer is de contactpersonenlijst in bijlage 1.
Tevens zorgt KWS Infra ervoor dat er tijdens de uitvoeringswerkzaamheden op de bouwplaats een voor derden aanspreekbaar persoon aanwezig is (CN090).

8.4.18 Werkplekken gemeente Amsterdam

KWS Infra voorziet de gemeente Amsterdam van twee werkplekken. Hiermee kunnen zaken sneller afgestemd worden met elkaar. Dit zorgt voor een affectieve samenwerking tussen KWS Infra en de gemeente Amsterdam (CN130).

8.5 Wanneer welke communicatie?

Om de (uitvoerings)planning inzichtelijk te maken en de communicatie daarop af te stemmen wordt in alle projectfasen gebruik gemaakt van het afzonderlijke document "communicatiekalender" (CN050/B-CN011). De communicatiekalender wordt gedurende het project up-to-date gehouden. In Bijlage 5 is een vigerende communicatiekalender als voorbeeld opgenomen met de thans bekende activiteiten, werkzaamheden en faseringen.

KWS Infra stelt samen met de gemeente Amsterdam de communicatiekalender op. Op basis hiervan wordt inzichtelijk welke informatie wanneer aangeleverd moet worden. Deze communicatiekalender wordt gedurende het project in het afzonderlijke document uitgebreid met de dan bekende stand van zaken en te communiceren boodschappen. In de communicatiekalender staat wat, wanneer en op welke manier (met welke communicatiemiddelen) aan de omgeving wordt verteld over de uitvoering van het project (CN050).

8.6 Klachtenafhandeling en terugkoppeling

Voor het afhandelen en registeren van klachten wordt het proces “klachten beheren” gehanteerd. Dit is opgenomen onder “klachten beheren” in het projectmanagementplan (PMS). Het klachtenbeheer wordt uitgevoerd in het meldingenregister in VISE. Klachten en meldingen komen binnen via de telefoon, mail, omgevingsapp, of persoonlijk bij de medewerkers van KWS Infra.

KWS Infra houdt gedurende de uitvoering van het werk een klachtenregister bij. In bijlage 7 is een vigerende meldingenregister als voorbeeld opgenomen. Hierin worden alle klachten over de werkzaamheden opgenomen en geregistreerd, alsmede aangegeven hoe en wanneer met de klacht wordt omgegaan in relatie tot de oplossing van de klacht. De gemeente Amsterdam wordt op de hoogte gehouden over de klachten die binnenkomen. De verantwoordelijkheid ligt bij de KWS Infra (CN070).

Uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst neemt de omgevingsmanager van KWS Infra (telefonisch) contact op met de melder (B.3.1). KWS Infra meldt binnen twee werkdagen na ontvangst aan de gemeente Amsterdam welke maatregelen getroffen worden om de klacht te verhelpen en houdt de gemeente Amsterdam op de hoogte van de actuele vorderingen omtrent het verhelpen van een klacht. KWS Infra zorgt voor terugkoppeling richting de melder (CN080).

Voor het afhandelen van klachten volgt KWS Infra een vast proces dat wij in al onze projecten toepassen. Dit proces ziet er als volgt uit:

1. **Registratie en afhandeling:**
   De omgevingsmanager van KWS Infra registreert de klacht/melding en kent de klacht toe aan een van de categorieën.
   - **Urgent:** impact op veiligheid of grote impact op bereikbaarheid, direct actie en *binnen 4 uur* afhandelen (ook buiten werktijd);
   - **Belangrijk:** grote impact op leefbaarheid of kleine impact op bereikbaarheid, *binnen halve werkdag* afhandelen;
   - **Aandacht:** beperkte impact op leefbaarheid en klachten over uitvoering of communicatie, *binnen 1 werkdag* terugkoppeling.
2. **Terugkoppeling en beoordeling:**
   Uiterlijk binnen *één werkdag* na ontvangst neemt de omgevingsmanager van KWS Infra (telefonisch) contact op met de melder om de wijze van afhandeling te bespreken. Binnen één week na afhandeling neemt de omgevingsmanager van KWS Infra nogmaals contact op om de tevredenheid van de indiener te meten.
3. **Klachtenregister:**
   Om te borgen dat we afspraken nakomen, maakt de omgevingsmanager van KWS Infra binnen twee werkdagen een klachtenrapportage van de voorgevallen klacht. De afhandeling worden toegevoegd aan het klachtenregister en gedeeld met de gemeente Amsterdam.
4. **Trendanalyse:** Tweewekelijks analyseert onze OM de klachten en wensen om te bepalen of er trends zijn. Op basis hiervan stelt onze OM verbetermaatregelen op, bespreekt deze met de uitvoerder en neemt deze op in de klachtenrapportage. Zo bieden wij structurele oplossingen voor eventuele terugkomende klachten.

9 Kabels en leidingen

9.1 K&L-coördinatie

De K&L-coördinator is verantwoordelijk voor de afstemming/coördinatie van de werkzaamheden aan betreffende kabels en leidingen in het projectgebied. Dit verzorgt de K&L-coördinator zodanig dat de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden en veiligheid niet wordt belemmerd en na afloop van de werkzaamheden het maaiveld hersteld wordt. Wanneer er aanvullende maatregelen nodig zijn wordt er bij de beheerder instemming verkregen zoals omschreven in de vraag specificatie eisen (VSE). (KL010/ B KL100/KL130/KL200/KL250/KL260/KL630)

9.2 Bescherming kabels en leidingen

KWS Infra zal waar nodig voor eigen rekening werkzaamheden verrichten ter bescherming van de kabels en leidingen. (KL230/B-KL240)

9.3 Opstellen van tekeningen

Wanneer er sprake is van te leveren tekeningen m.b.t. tot K&L wordt dit gedaan volgens de NLCS en de aanvullend geleverde lijnstijlen. (KL140)

9.4 Traject voor start uitvoering

Het traject rondom de aanvraag en het akkoord op het tracé zijn voor aanvang project afgerond door KWS Infra (B-KL101). Coördinatie en de KLIC en MOOR-meldingen ten aanzien van (tijdelijk) werk aan K&L wordt uitgevoerd door KWS Infra. Voor het verleggen en de aanleg van (nieuwe) kabels en leidingen worden de planning afgestemd met de beheerders. Er wordt gewerkt volgens de bepalingen en nadere regels WIOR, CROW-publicatie 500, WIBON (KL110/KL120/KL210/KL220/Annex1-002/Annex1-001)

9.5 Leveren gegevens kabels en leidingen

Met betrekking tot de objecten van Waternet dient opdrachtnemer rekening te houden met de ‘Aanvullende bepalingen Waternet’. Dit betreft o.a. het 30 dagen voorafgaand aan uitvoering, melden van werkzaamheden die betrekking hebben op kabels en leidingen waarvan Waternet beheerder is en het 15 dagen na uitvoering verstrekken van de liggingsgegevens(conform de WION) bij beheerder. (KL320/KL330/B-KL340/KL800/KL810)

9.6 Handhaven en afstemmen kabels en leidingen derden

Wanneer er gesproken wordt over kabels en leidingen derden (ook wel kabels en leidingen die niet in beheer zijn van gemeente Amsterdam), bestaat dit uit 3 categorieën:

- **Categorie 1**: Deze zijn reeds aangepast/aangelegd vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast. (KL500)
- **Categorie 2:** Hiervoor heeft KWS Infra met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden. Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast/aangelegd. Hierbij worden de afspraken gemaakt door KWS Infra rondom het wenstracé in acht genomen, de nadere afspraken en akkoordverklaring lopen via Stadsdeel Noord. (KL600/KL610)
- **Categorie 3:** Hiervoor dient de opdrachtnemer namens KWS Infra alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. Bij DTA wijzigingen wordt voldaan aan de WIOR en de nadere bepalingen WIOR. Bij het vormgeven van een DTA worden de maatschappelijke kosten zoveel mogelijk beperkt en gezorgd dat het beheer en de exploitatie van de kabel- en leidingenassets op conventionele wijze voortgezet kan worden. De technische oplossingen zullen de belangen van de beheerders behartigen. Na overeenstemming, waar nodig met assistentie van de gemeente Amsterdam, van de DTA zullen de werkzaamheden aanvangen (BL700/BL705/BL710/KL730/B-KL720/KL740/KL750/KL770)

Bijlagen

Bijlage 1 Contactpersonen (UP050.6)

Calamiteitennummer KWS (VH200/CN090): 020-5694200
Het calamiteiten nummer is 24/7 telefonisch bereikbaar.

Tussen 7:00 uur en 16:00 uur zijn de projectleider en/of omgevingsmanager bereikbaar.

Hieronder is een overzicht opgenomen met contactpersonen (UP050.6):

Naam:	Functie(s)	Organisatie	Telefoonnr.	email
KWS Infra				
[redacted]	Projectleider Contractmanager Technisch manager	KWS	[redacted]	[redacted]@kws.nl
[redacted]	Omgevingsmanager (OM030)	KWS	[redacted]	[redacted]@kws.nl
[redacted]	Proces Manager	KWS	[redacted]	[redacted]@kws.nl
[redacted]	Uitvoerder	KWS	[redacted]	[redacted]@kws.nl
Gemeente Amsterdam IPM				
[redacted]	Projectmanager	Amsterdam	[redacted]	[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]	Contractmanager	Amsterdam	[redacted]	[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]	Technisch manager	Amsterdam	[redacted]	[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]	Omgevingsmanager	Amsterdam	[redacted]	[redacted]@amsterdam.nl
[redacted]	Manager projectbeheersing	Amsterdam	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Adviseur rainproof	Amsterdam	[redacted]	[redacted]@amsterdam.nl
Waternet				
[redacted]	Programmamanager	Riolering	/	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Senior projectleider	Riolering	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Werkvoorbereider	Riolering	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Waarnemer	Riolering	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Projectleider	Waterleiding	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Werkvoorbereider	Waterleiding	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
[redacted]	Waarnemer	Waterleiding	[redacted]	[redacted]@waternet.nl
Liander				
[redacted]	Projectleider	Gas	[redacted]	[redacted]@alliander.nl
[redacted]	Werkvoorbereider	Gas	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Uitvoerder	Gas	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Projectmanager	Electra	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Werkvoorbereider	Electra	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Uitvoerder	Electra	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Projectmanager	Huisaansl.	[redacted]	[redacted]alliander.com

Naam:	Functie(s)	Organisatie	Telefoonnr.	email
[redacted]	Werkvoorbereider	Huisaansl.	[redacted]	[redacted]alliander.com
[redacted]	Uitvoerder	Huisaansl.	[redacted]	[redacted]
[redacted]	Brandweer	Brandweer	[redacted]	[redacted]brandweeraa.nl
[redacted]	Stadsdeelregisseur	SD Noord	[redacted]	[redacted]amsterdam.nl
[redacted]	Stadsregie	SD Noord	[redacted]	[redacted]amsterdam.nl
[redacted]	Verkeerstactiek	V&OR	[redacted]	[redacted]amsterdam.nl
[redacted]	GVB	GVB	[redacted]	[redacted]gvb.nl Verkeersregie@gvb.nl
[redacted]	GVB	GVB	[redacted]	[redacted]gvb.nl Verkeersregie@gvb.nl

Bijlage 2 Faserings, omleidings, bebordings- en bebakeningstekeningen (UP051)



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 12500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraandeksels zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minderwaardigen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 1A
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 1 van 11	status	definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	tekn.			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0	192507-T-5020			1.0

Situatie 1A
SCHAAL 1:200

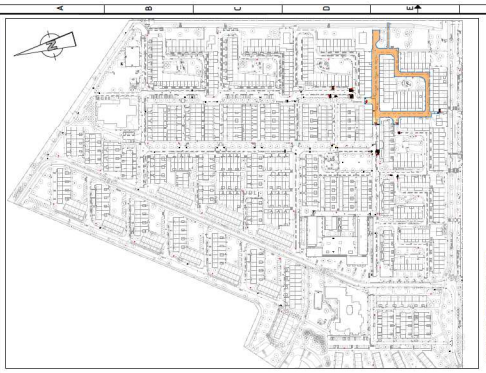

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene toelichting
Dit bestek is opgesteld voor de werkzaamheden binnen alle fases a het inrichtingsplan van de werkzaamheden beschreven in zijn met alle daarvoor noodzakelijke materialen.
Het bestek is opgesteld voor de aanbesteding van de werkzaamheden. Het is mogelijk dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bepaalde onderdelen van het bestek niet meer te worden uitgevoerd. De opdrachtgever zal dan in overleg met de aannemer de werkzaamheden aanpassen.
- De aansluitingen van de enige bestaande wegen zijn.
- De aansluitingen van de enige bestaande wegen zijn.
- Alle werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende voorschriften en richtlijnen. De opdrachtgever zal de aannemer op verzoek van de aannemer de nodige informatie verstrekken.
- Voorgaand aan de werkzaamheden zal de aannemer een inventarisatie van de bestaande situatie opstellen. Deze inventarisatie zal worden gebruikt om de uitgevoerde werkzaamheden te controleren

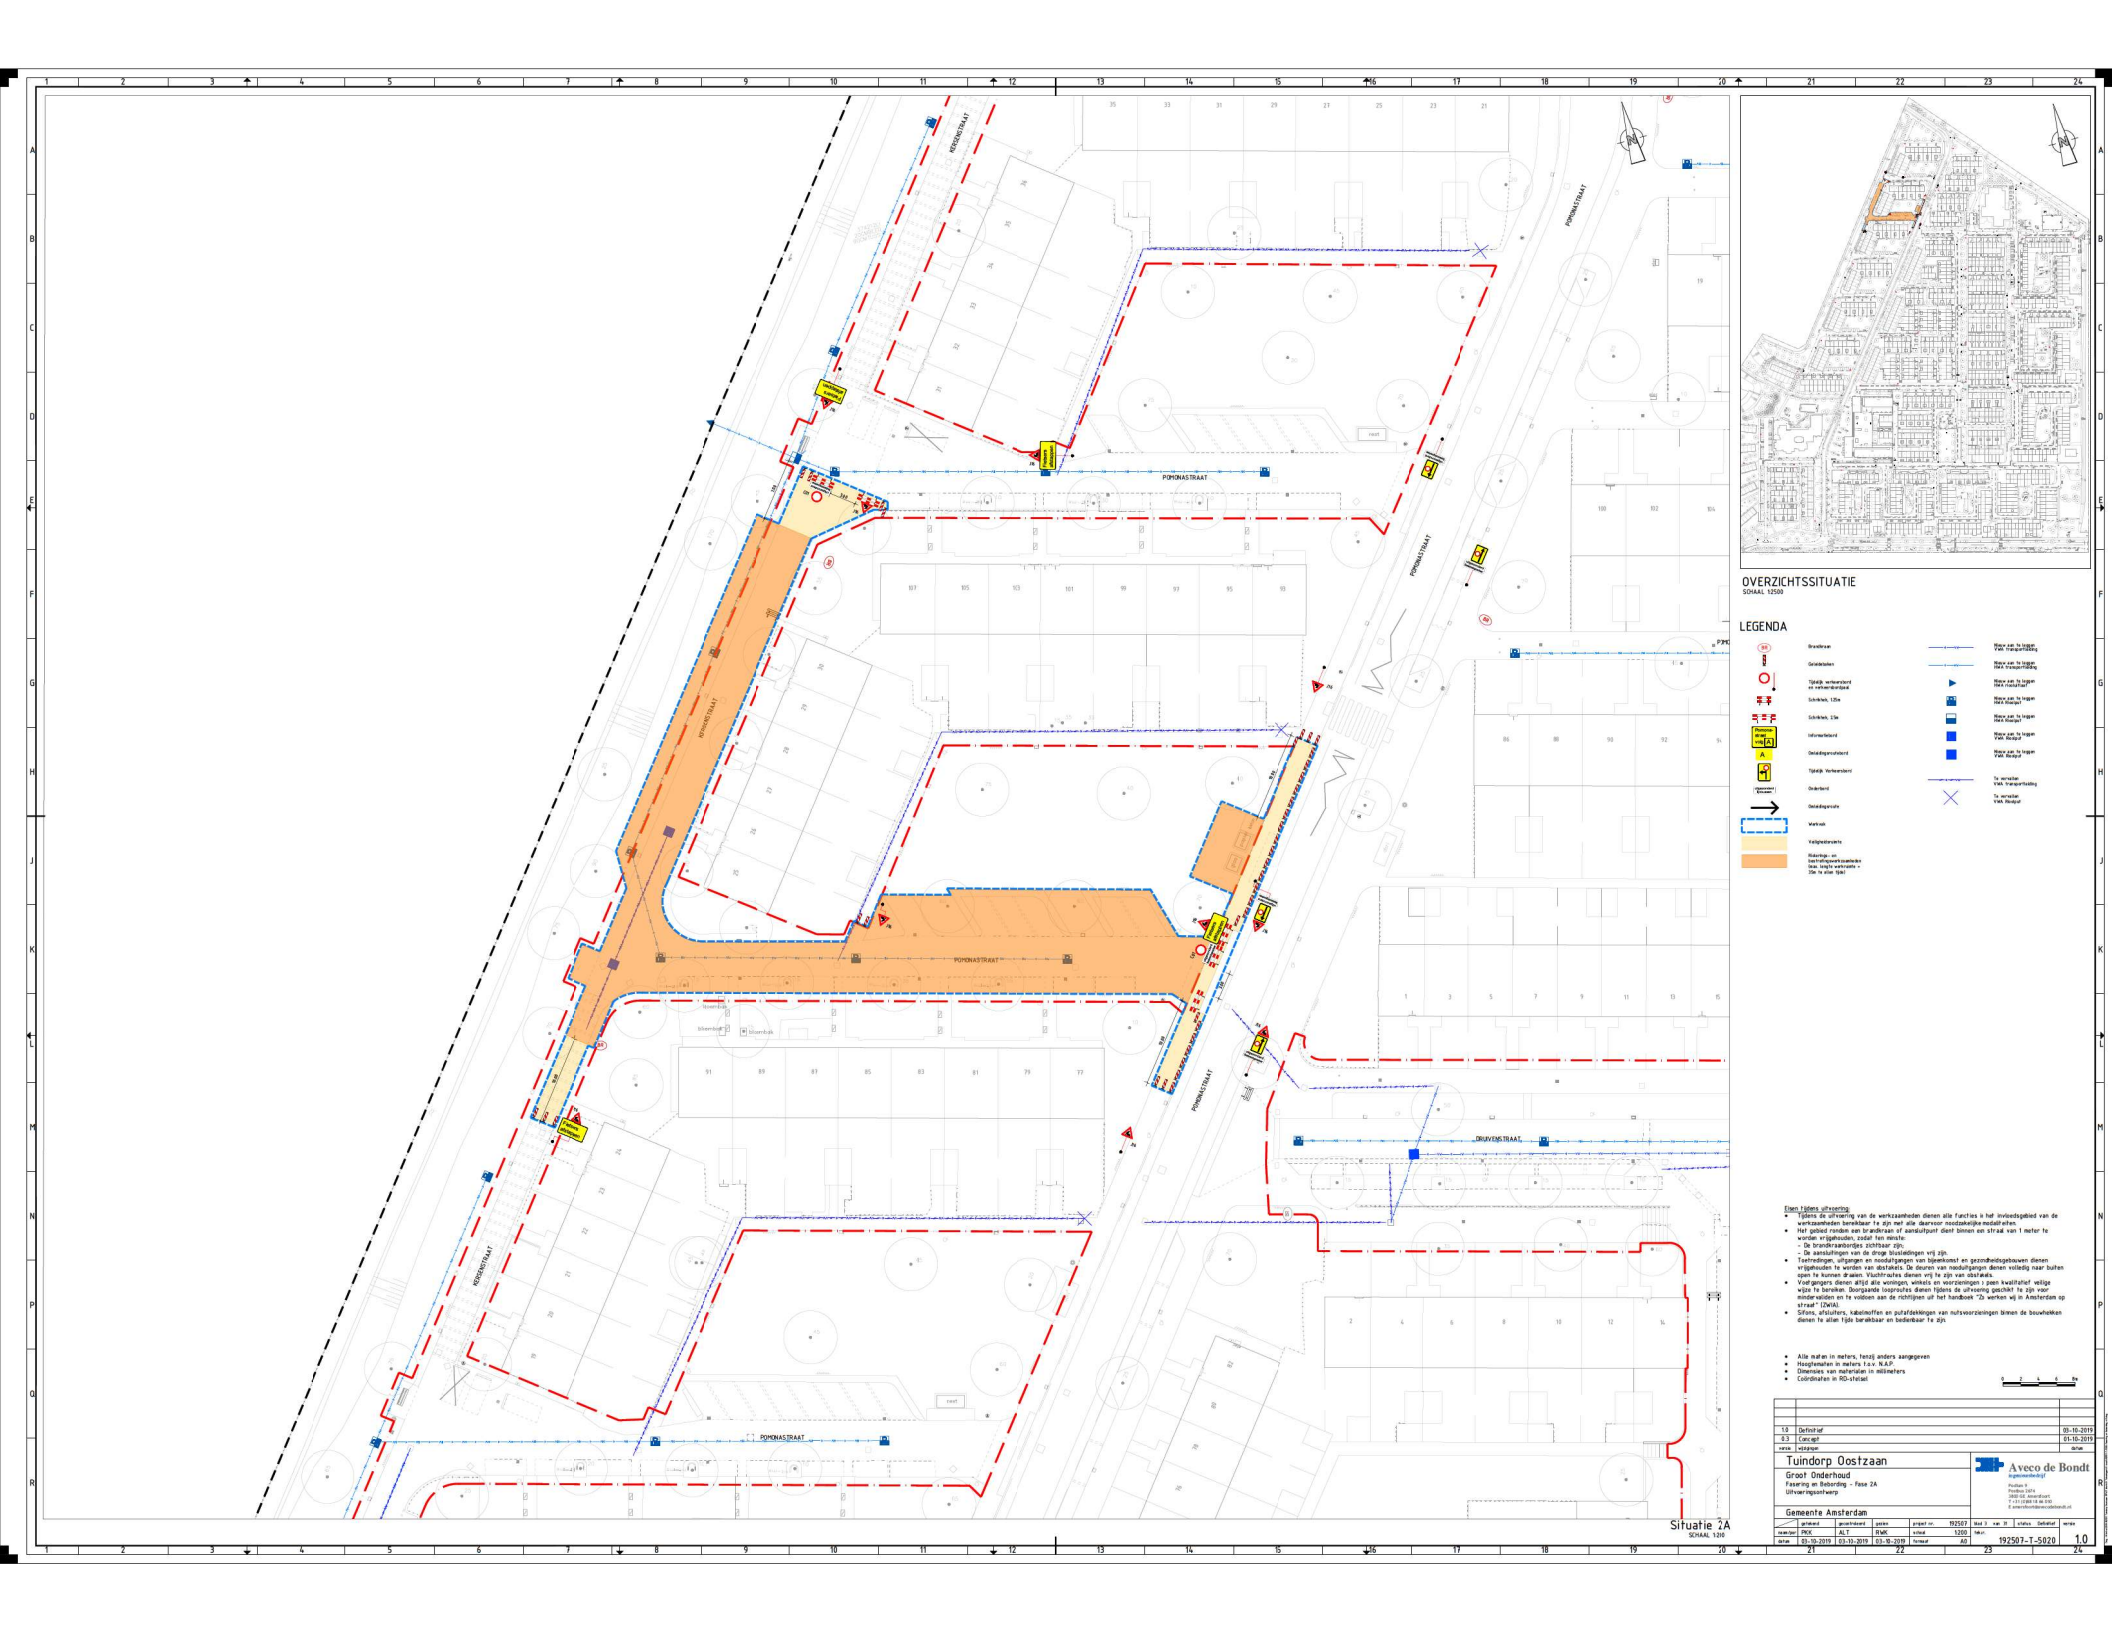

Eisen tijdens uitvoering:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het geldend rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen en straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud

Fasering en Bebording - Fase 2A

Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt

getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 3 van 11 status definitief versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200 bakcode
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0 192507-T-5020 1.0

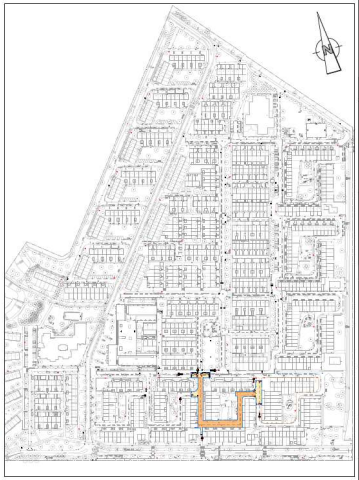

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansboordjes zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde berekbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 2B
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad nr.	van	status	definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200					
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0					

192507-T-5020 1.0

Situatie 2B
SCHAAL 1:200

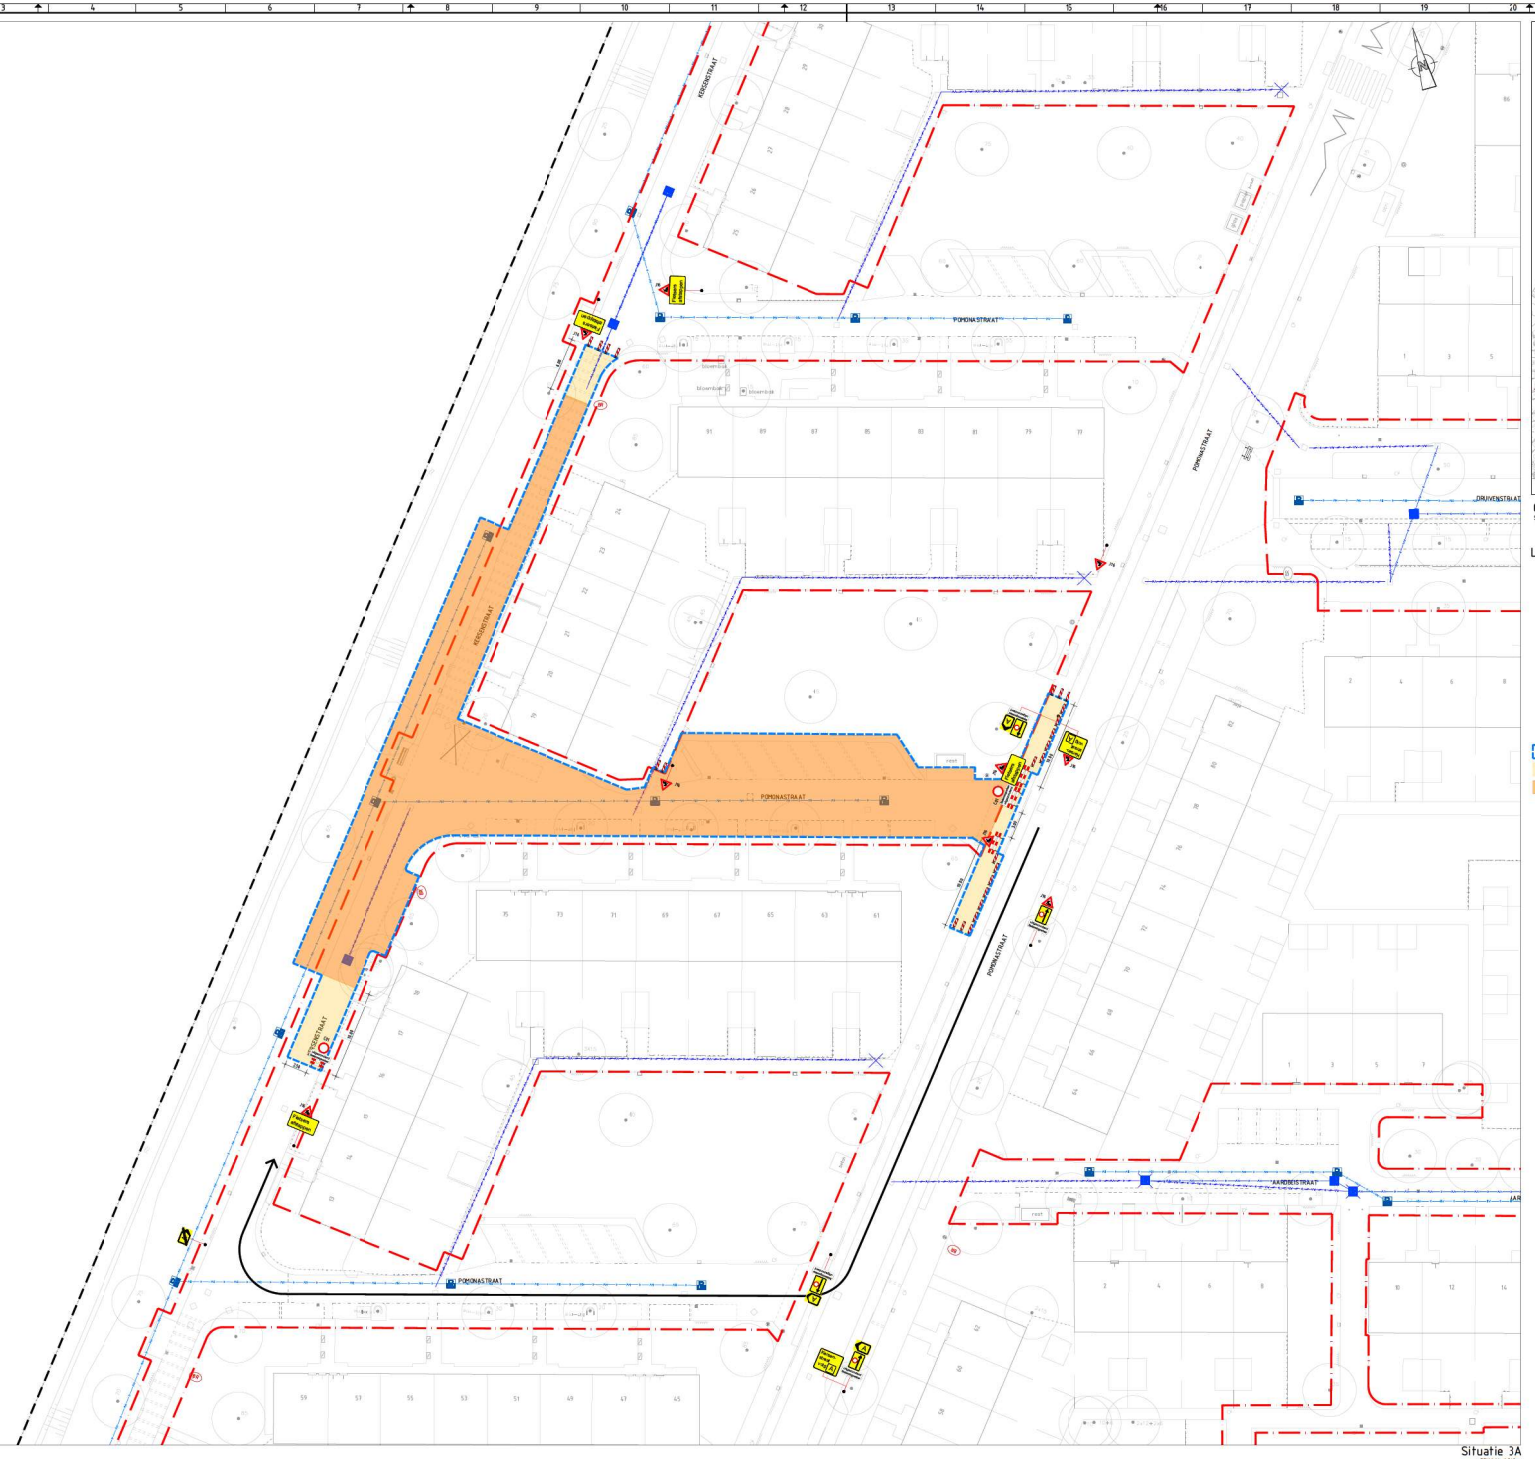

Situatie 3A
SCHAAL 1:200

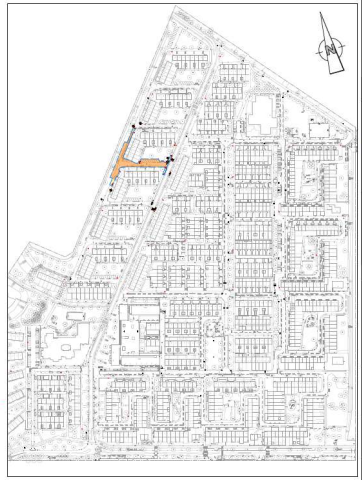

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 3A
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 5	van 11	status	Definitief	versie
naam/paraaf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	tekn.				
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020			1.0

Aveco de Bondt
ingenieursbureau bv
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
2600 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@aveco-debondt.nl

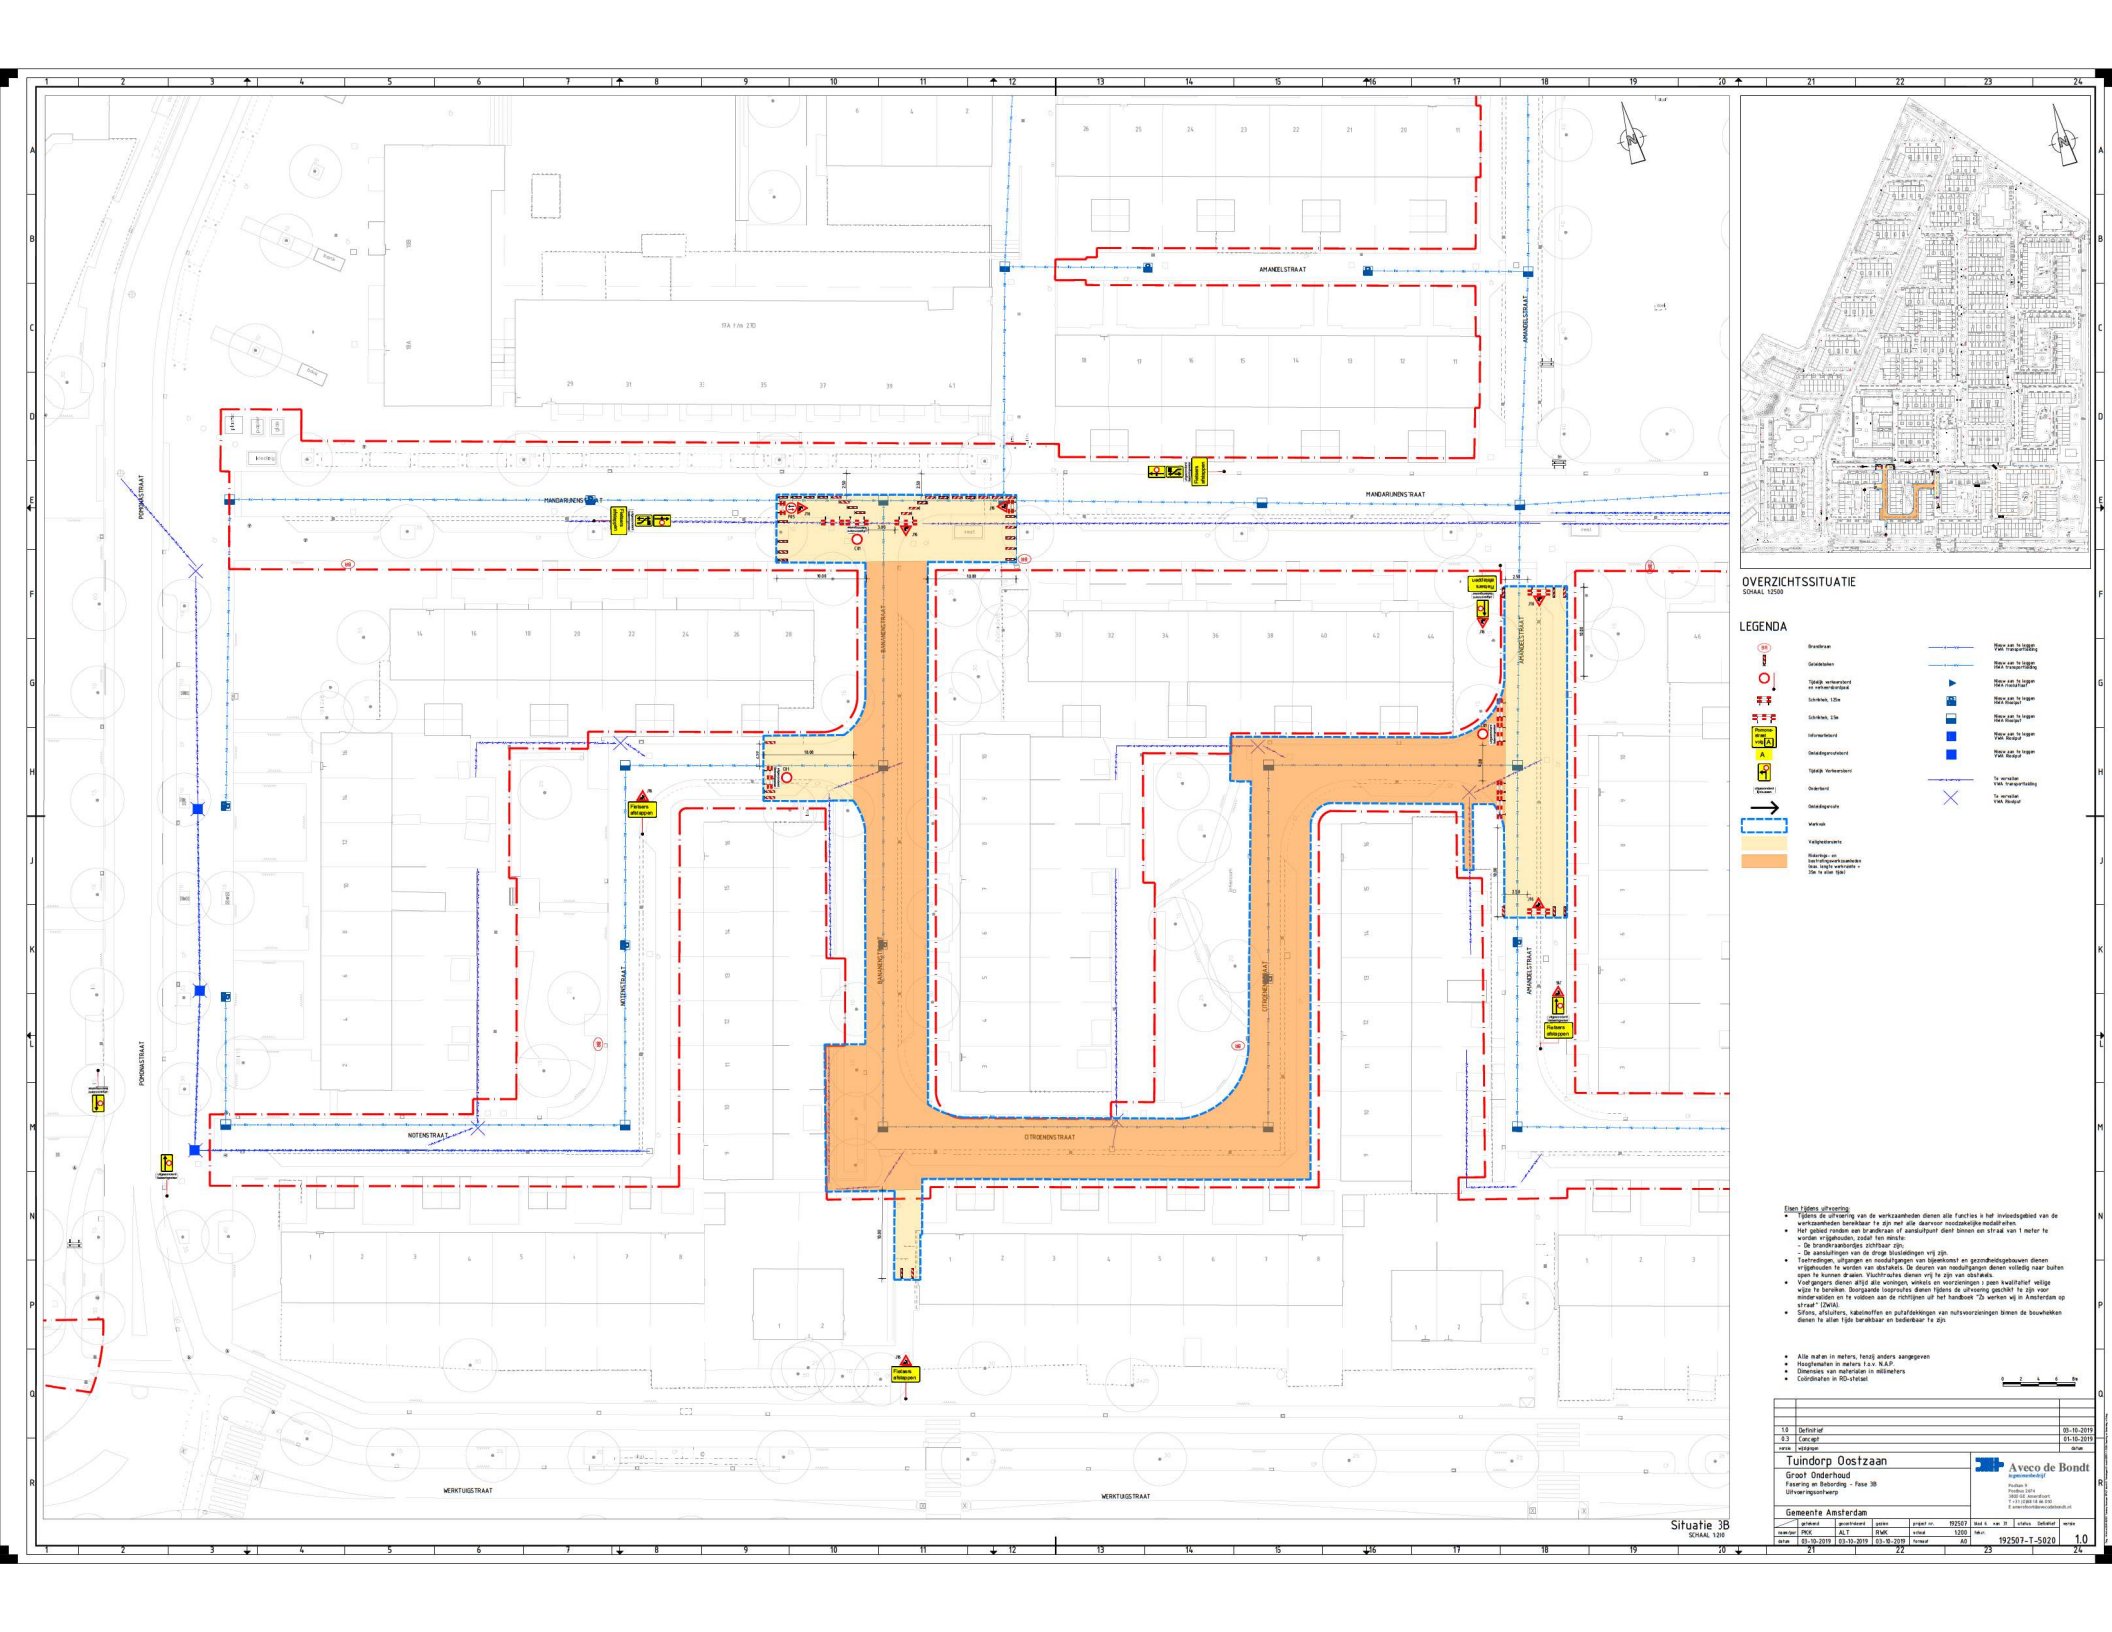

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraandeksels zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder-validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 3B
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad nr.	van	status	definitief	versie
naam/parr.	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200					
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0	tekn.	192507-T-5020			1.0

Aveco de Bondt
ingenieursbureau bv
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
2600 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@avecodebondt.nl

Situatie 3B
SCHAAL 1:200



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene opmerkingen
Voor aanvang van de werkzaamheden dienen alle kwetsbare kabels en leidingen in het werkterrein te zijn gelokaliseerd door middel van een KLIC-melding.
Voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer de bereikbaarheid van de aanwezige nutsvoorzieningen te controleren.
Alle putten in verharding, zowel eigen als van derden, dienen in hoogte te worden aangepast aan het nieuwe straatniveau

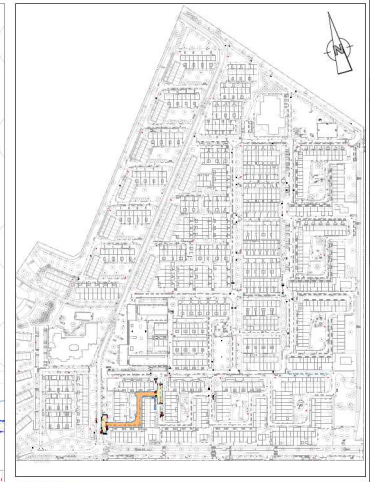

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen op een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder-validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 4B
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	ontwerp	gecontroleerd	getekend	projectnr.	192507	blad #	van #	status	definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200					
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0					

Aveco de Bondt
ingenieursbureau bv
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
2800 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@avecodebondt.nl

192507-T-5020 1.0

Situatie 4B
SCHAAL 1:200



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Een lopend uitvoerder:
- Is verantwoordelijk voor de veiligheidsmaatregelen die voor de werkzaamheden benodigd zijn en zal alle daarvoor noodzakelijke maatregelen treffen en voorzieningen aanbrengen.
- Zal ervoor zorgen dat de werkplaats dusdanig is ingericht dat deze voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid en welzijn.
- Zal ervoor zorgen dat de werkplaats dusdanig is ingericht dat deze voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid en welzijn.
- De aannemer is verplicht om de gevaarlijke stoffen die hij gebruikt of opslaat op de bouwplaats te inventariseren.
- De aannemer is verplicht om de gevaarlijke stoffen die hij gebruikt of opslaat op de bouwplaats te inventariseren

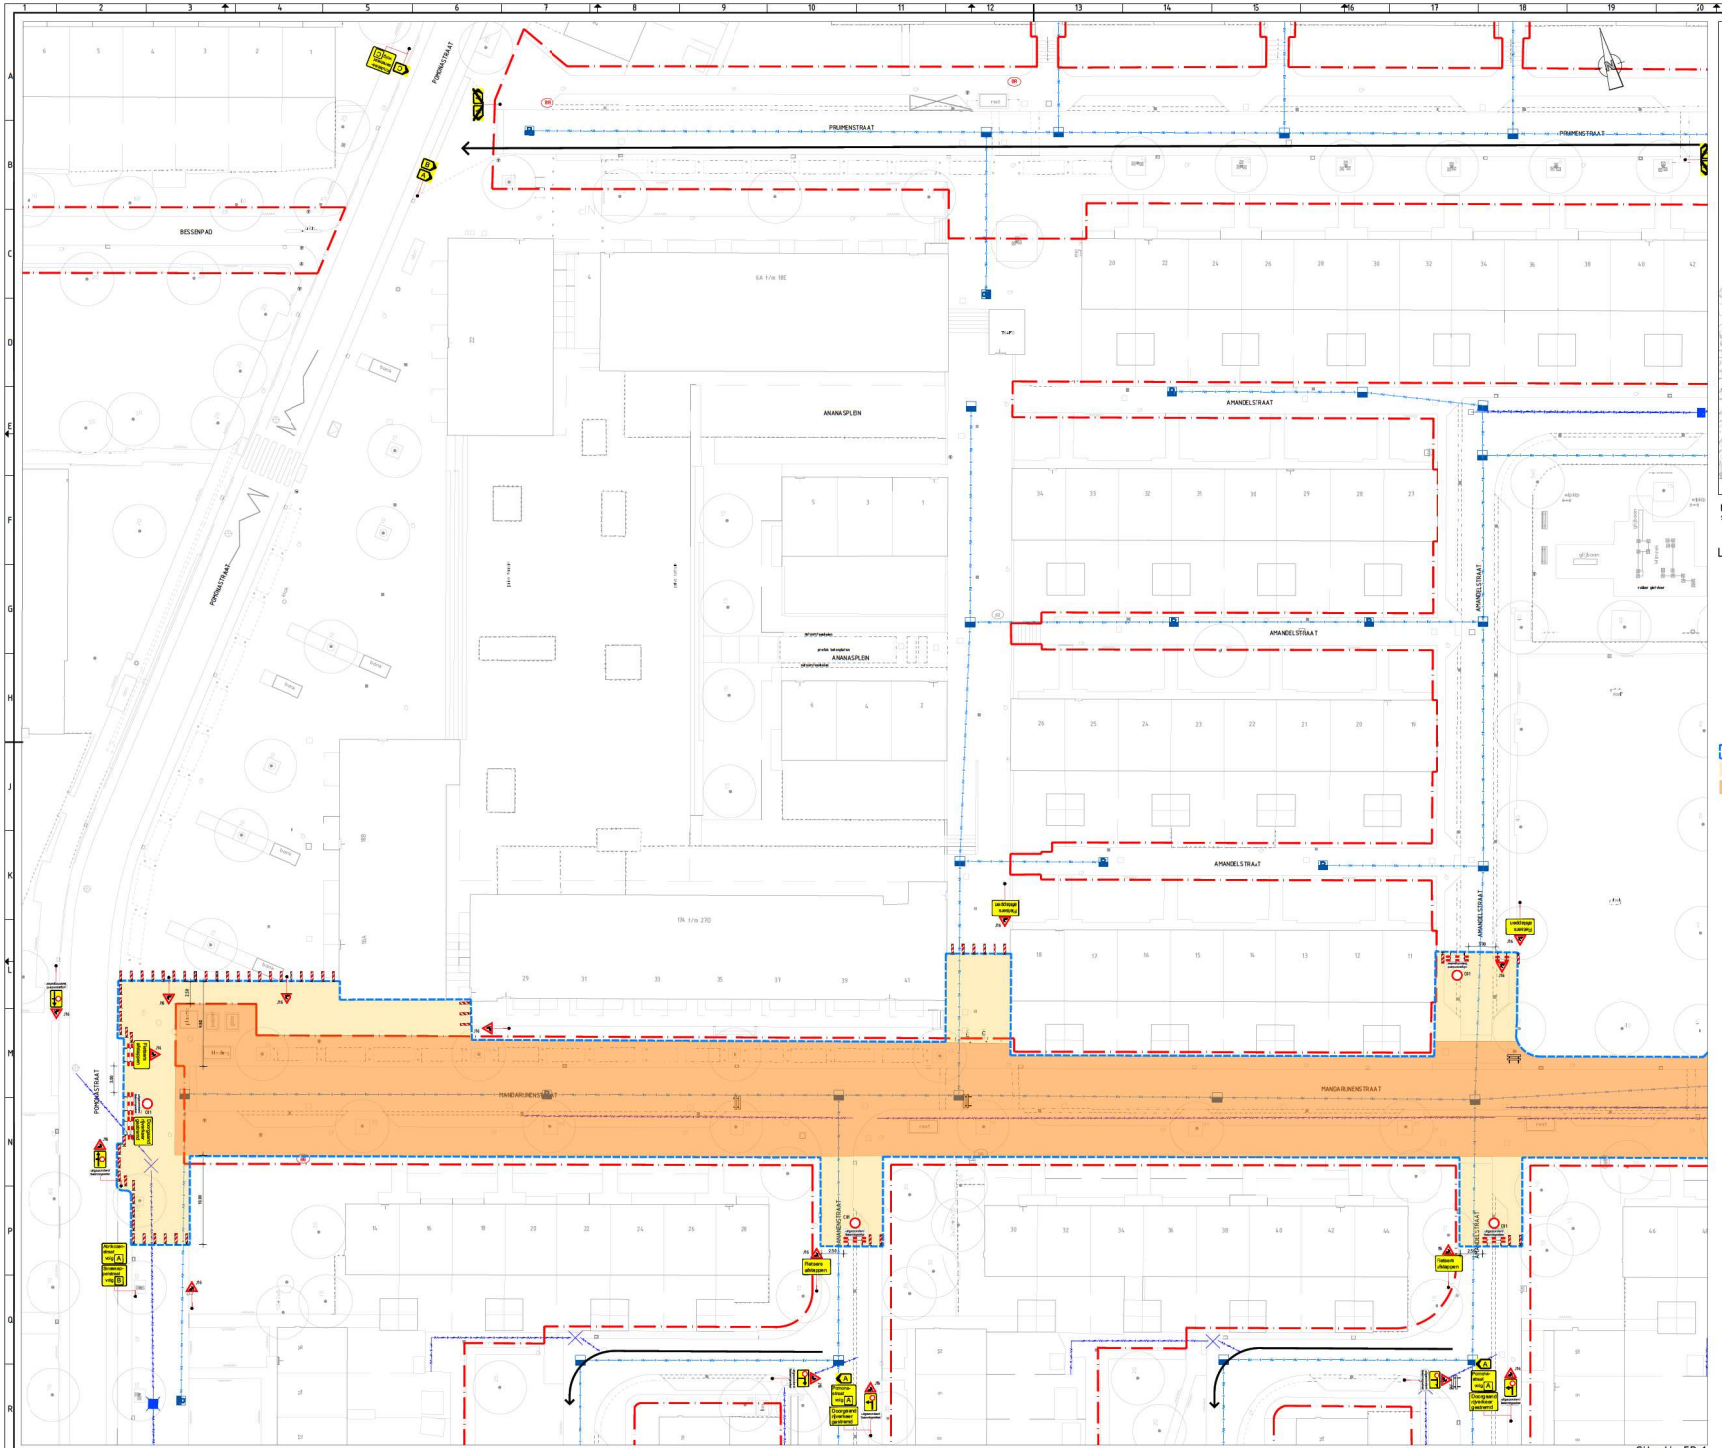

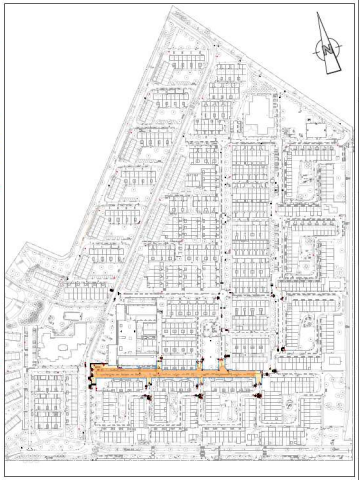

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Breedstraat
Geleidestaken
Tijdelijk verkeersbord en verkeersbordpaal
Schrikketel, 120m
Schrikketel, 23m
Informatiebord
Gebiedsgerelateerd bord
Tijdelijk Verkeersbord
Onderbord
Gebiedsgrens
Werkvak
Veiligheidszone
Risicovolle werkzaamheden (max. lengte werkvlakte = 20m tot elkaar tijdel
Weiw aan te leggen Vrijliggend fietspad
Weiw aan te leggen Vrijliggend fietspad
Weiw aan te leggen Vrijliggend fietspad
Weiw aan te leggen Vrijliggend fietspad
Te verwijderen Vrijliggend fietspad

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansborden zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van noodutgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i paen kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

0 1 2 5 10m

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 5B-1
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	ontwerp	gecontroleerd	getekend	projectnr.	192507	blad 11 van 11	status	definitief	versie
naam/per	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	bijlage			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0				

192507-T-5020 1.0

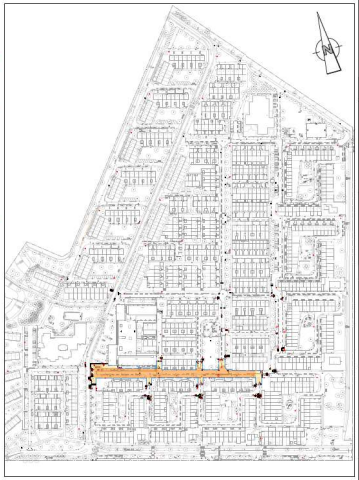

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Fasen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 5B-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad nr.	van nr.	status	definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200					
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0					

192507-T-5020 1.0

Situatie 5B-2
SCHAAL 1:200

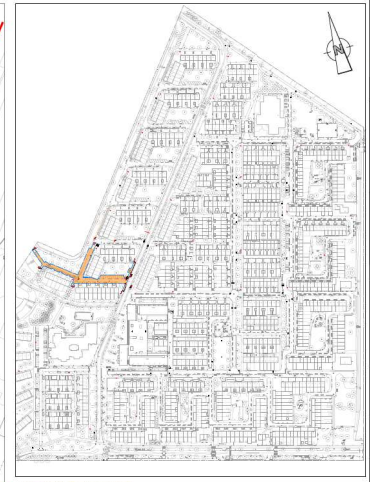

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

- Brandkraan
- Gebiedsdelen
- Tijdelijk verkeersbord en verkeersbordpaal
- Schrikhek, 1.0m
- Schrikhek, 2.5m
- Informatiebord
- Gebiedsgerelateerd
- Tijdelijk Verkeersbord
- Onderbord
- Gebiedsgrens
- Werkvak
- Veiligheidszone
- Risicovolle werkzaamheden (max. lengte werkvlak = 30m te allen tijde)
- Weg aan te leggen Vak: transportstrook
- Weg aan te leggen Vak: rijstrook
- Weg aan te leggen Vak: fietspad
- Weg aan te leggen Vak: voetpad
- Weg aan te leggen Vak: fietspad
- Te verwijderen Vak: transportstrook
- Te verwijderen Vak: fietspad

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 6A
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 12 van 31	status	Definitief	versie
naam/parr.	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	fabr.nr.			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

Situatie 6A
SCHAAL 1:200

Algemene uitgangspunten

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters t.o.v. RD-stelsel
- Coördinaten in WGS-stelsel

0	Definitief	01-10-2019	
1.0	Definitief	01-10-2019	

Alvaco de Bondt
ingenieursbureau
Postbus 2241
3500 GE Utrecht
T 030 2308 610
www.alvacodebondt.nl

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fase 6B-1 en 6B-2

Gemeente Amsterdam
Uitvoeringsplanning

	gedaan	gezien	goedgek.
naam	PKK	ALT	PKK
datum	1-10-2019	01-10-2019	01-10-2019

project nr. 192507
schaal 1:500
formaat A0

Situatie 6B.1
SCHAAL 1:500

tekening nr. 192507-1-5020
versie 1.0

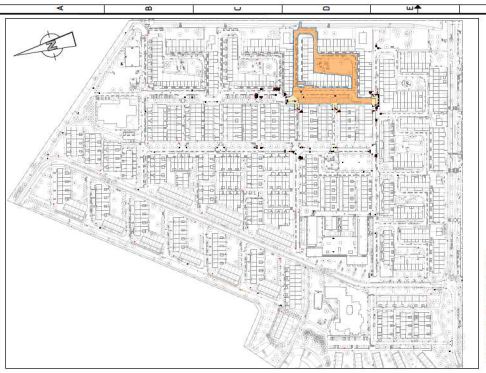

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene opmerkingen:
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in RD-stelsel

nr	omschrijving	datum
0	Definitief	01-10-2015
1.0	Definitief	01-12-2015

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Bestek 19297-1-5920 - fase 6B-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord

	naam	datum
ontwerp	PKK	01-12-2015
getekend	ALT	01-12-2015
gecontr.	PKK	01-12-2015

Bestek nr. 19297
Schaal 1:500
Formaat A0

Avesco de Bondt
Ingenieursbureau
Postbus 2241
3500 GE Utrecht
T 030 2308 111
www.avesco.nl

19297-1-5920

Situatie 6B-2
SCHAAL 1:500



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene toelichting
- Het is de verantwoordelijkheid van de verkeersmaatregelen bij elke aannemer alle aanwijzingen van de verkeersmaatregelen te zijn met alle daarvoor noodzakelijke materialen.
- De aannemer is verplicht om de verkeersmaatregelen te zijn.
- De aannemer is verplicht om de verkeersmaatregelen te zijn.
- De aannemer is verplicht om de verkeersmaatregelen te zijn

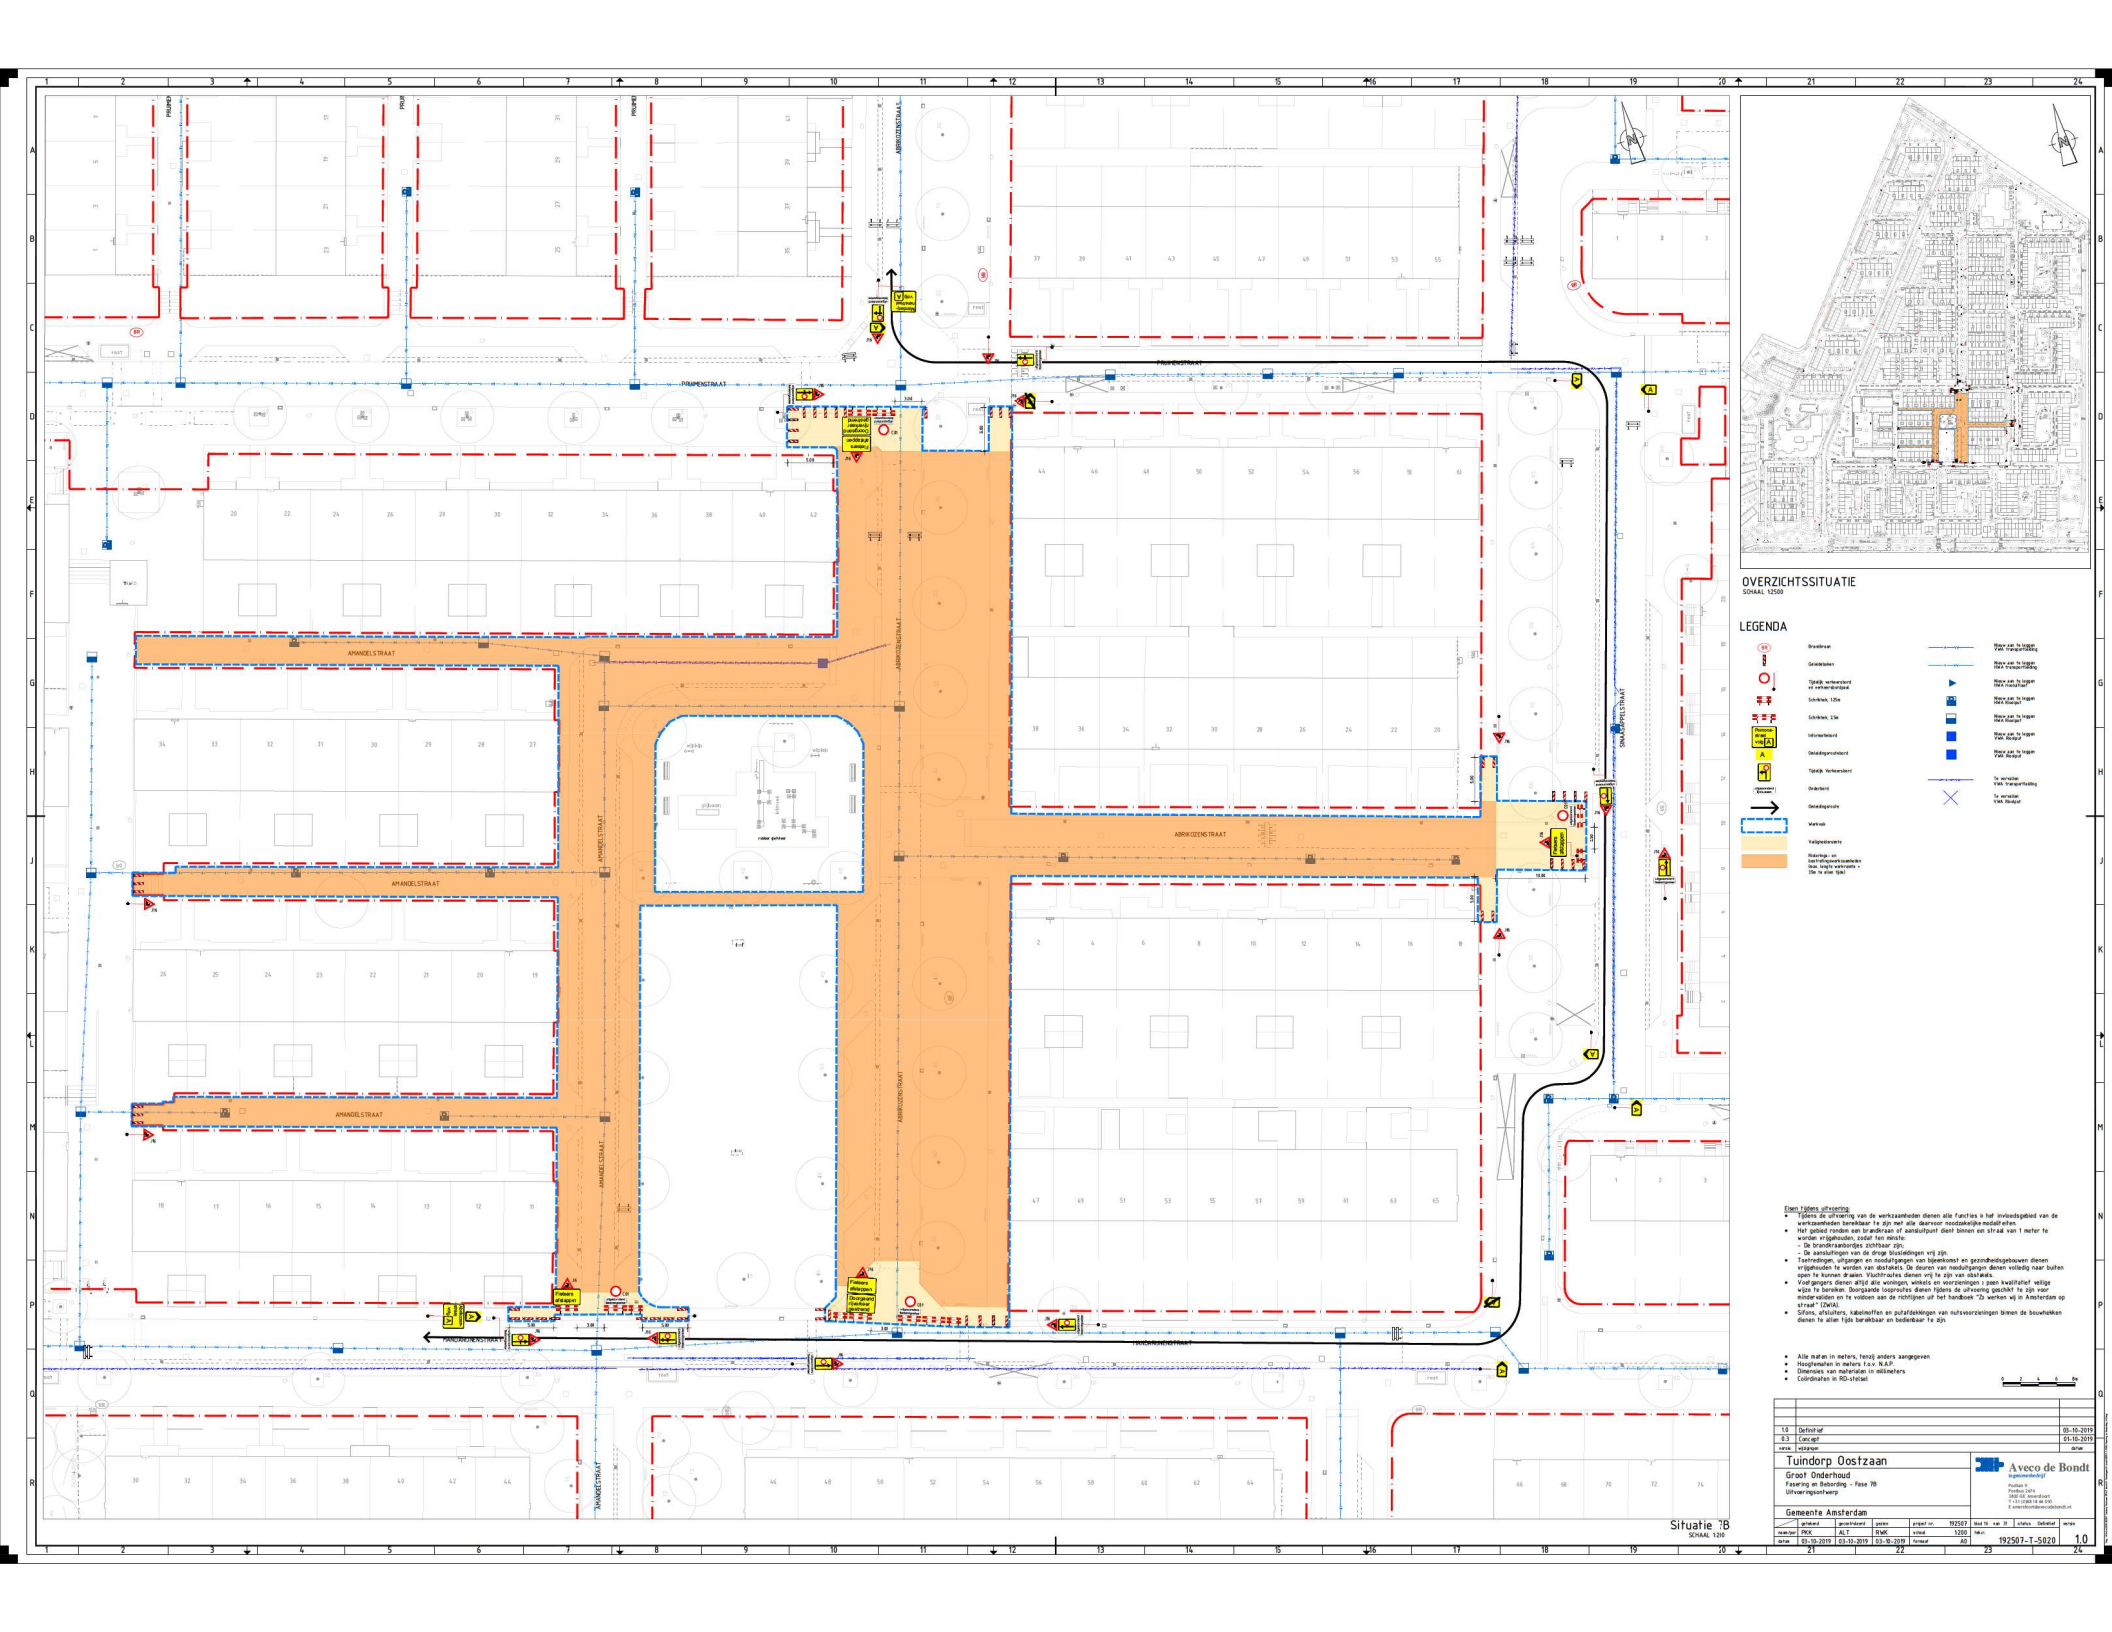

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansloten zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 7B
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 16 van 31	status	definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	bakje			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Een lopend uitvoerder
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen alle kwetsbare leidingen in het werkgebied van de werkzaamheden bevindt of zijn er alle daarvoor noodzakelijke maatregelen te worden uitgevoerd. Het werkterrein dient binnen en tijdens een 1 meter te worden vrijgehouden, zodat tijdens de werkzaamheden geen schade aan kan worden.
- De aanwijzingen van de dienst Stadsbeheer zijn altijd van toepassing.
- Tijdens de werkzaamheden dient er gezorgd te worden voor goede verkeersmaatregelen. De doorgang van nooddiensten dient ten allen tijde gewaarborgd te worden.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer een kwaliteitsplan te overleggen aan de opdrachtgever. Hierin dient de aannemer aan te geven op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd, welke maatregelen worden getroffen om overlast te beperken en op welke wijze de kwaliteit wordt gewaarborgd.
- Voorafgaand aan de werkzaamheden dient de aannemer een nulsituatie op te stellen van de omgeving, zowel in als buiten de bouwkuip. Hierbij dient de aannemer aan te geven op welke wijze de nulsituatie wordt vastgelegd (bijvoorbeeld door middel van een video-opname).
- Alle putten in asfalt, tenzij anders aangegeven
- Hoogtelijnen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in meters t.o.v. RD-stelsel

						01-10-2015	
						01-10-2015	
						BCW	
0	Definitief						
1.0	Definitief						
versie	wijziging						

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Bestek - Tekening - Fase 8A-1
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer

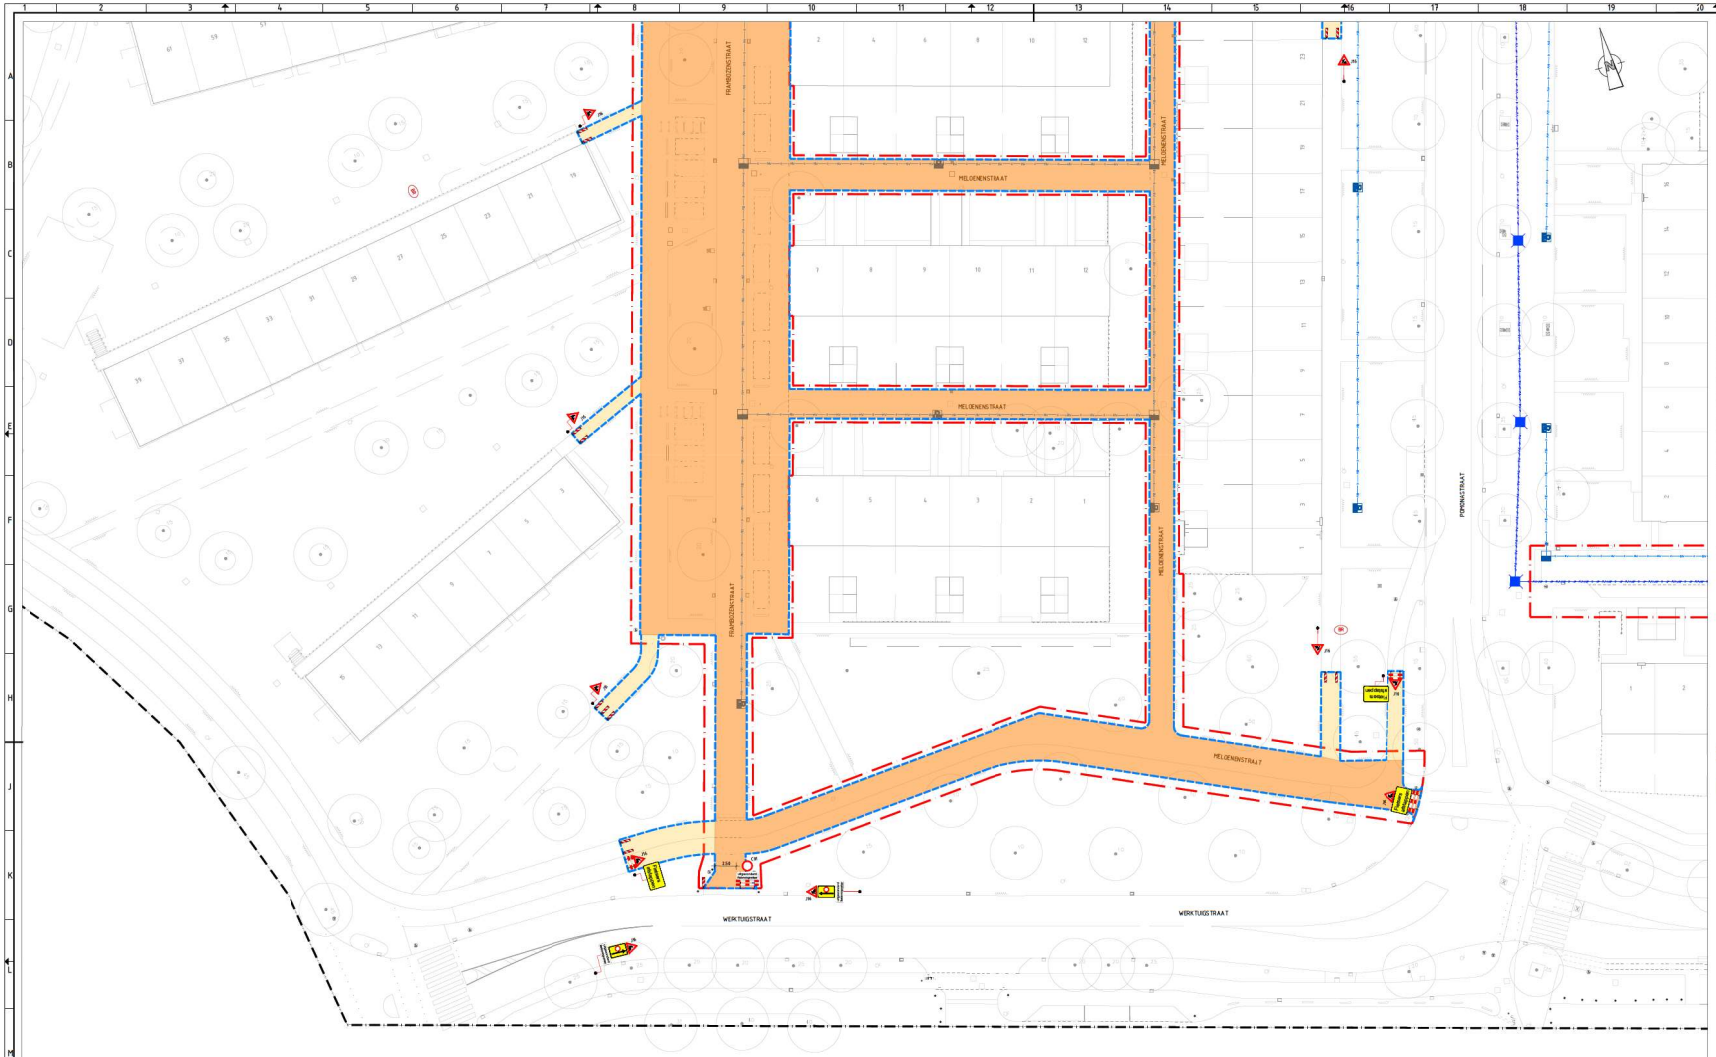

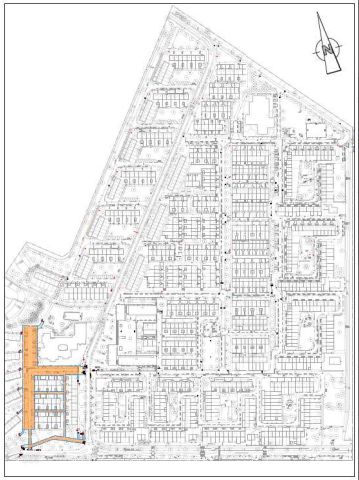

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 12500

LEGENDA

Eisen tijdens uitvoering:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraandeksels zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 8A-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	ontwerp	gecontroleerd	getekend	projectnr.	192507	blad 19 van 31	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	tekn.			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0

Aveco de Bondt
ingenieursbedrijf
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
1000 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@aveco-debondt.nl

Situatie 8A-2
SCHAAL 1:200

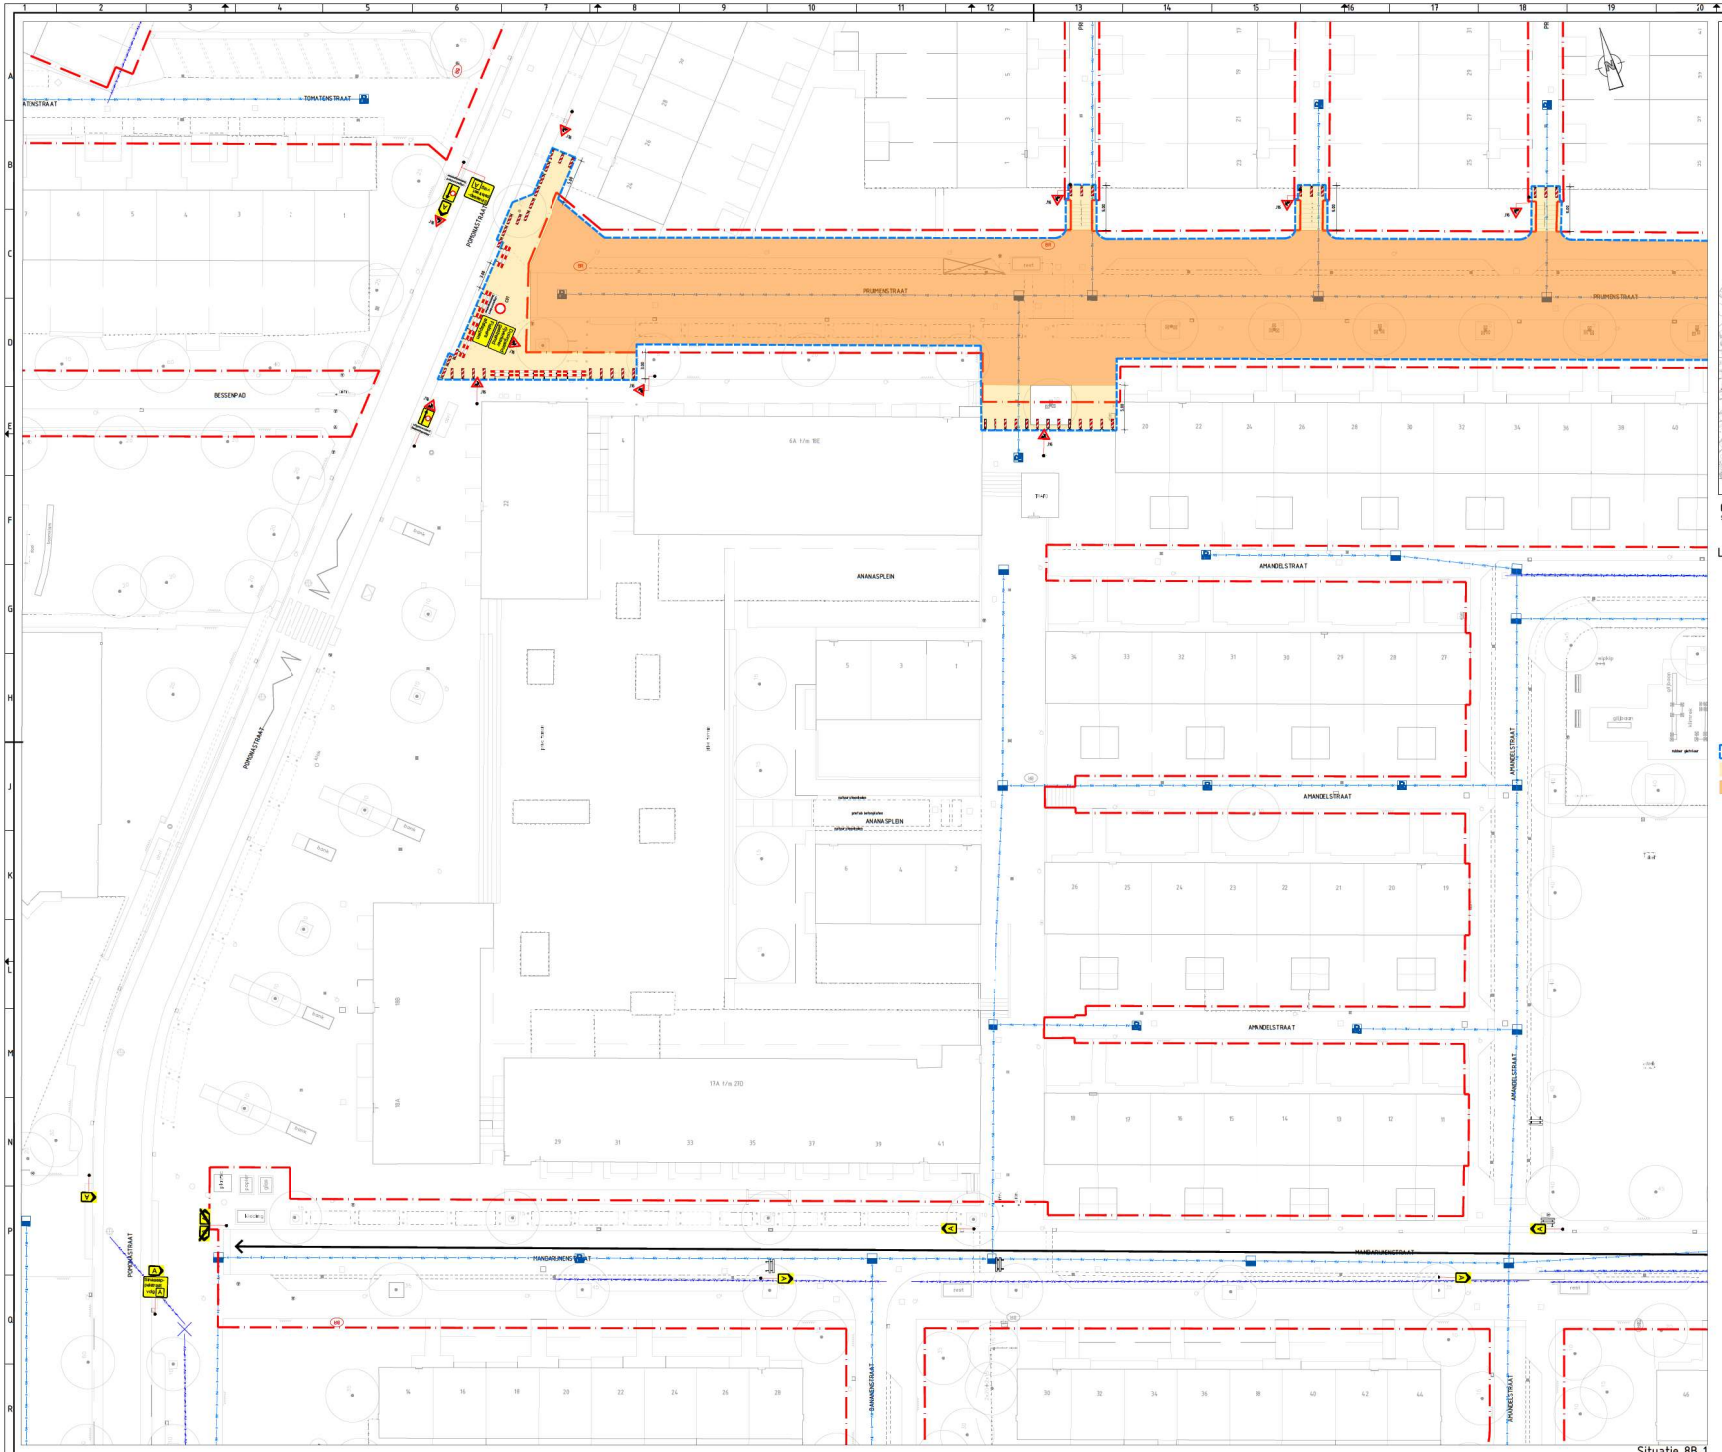

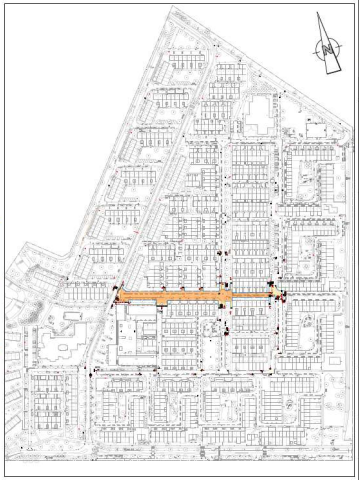

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Bouwkraan
Geleidebalken
Tijdelijk verkeersbord en verkeersbordpaal
Schrikhek, 1.20m
Schrikhek, 2.0m
Informatiebord
Gebiedsgerelateerd bord
Tijdelijk Verkeersbord
Onderbord
Gebiedsgrens/zone
Werkvak
Veiligheidszone/as
Risicovolle werkzaamheden (max. lengte werkvlakte = 20m tot elkaar tijdel.
Wave aan te leggen Vlak transportleiding
Wave aan te leggen Vlak transportleiding
Wave aan te leggen Vlak Riool/put
Wave aan te leggen Vlak Riool/put
Wave aan te leggen Vlak Riool/put
Wave aan te leggen Vlak Riool/put
Te verwijderen Vlak Transportleiding
Te verwijderen Vlak Riool/put

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen en straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraanbordjes zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande toegroutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor mindervaliden en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

0 1 2 3 4 5m

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase BB-1
Uitvoeringsontwerp

Aveco de Bondt
ingenieursbureau
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
2800 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@avecodebondt.nl

Gemeente Amsterdam

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 11 van 11	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	fabr.:			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0

Situatie BB-1
SCHAAL 1:200

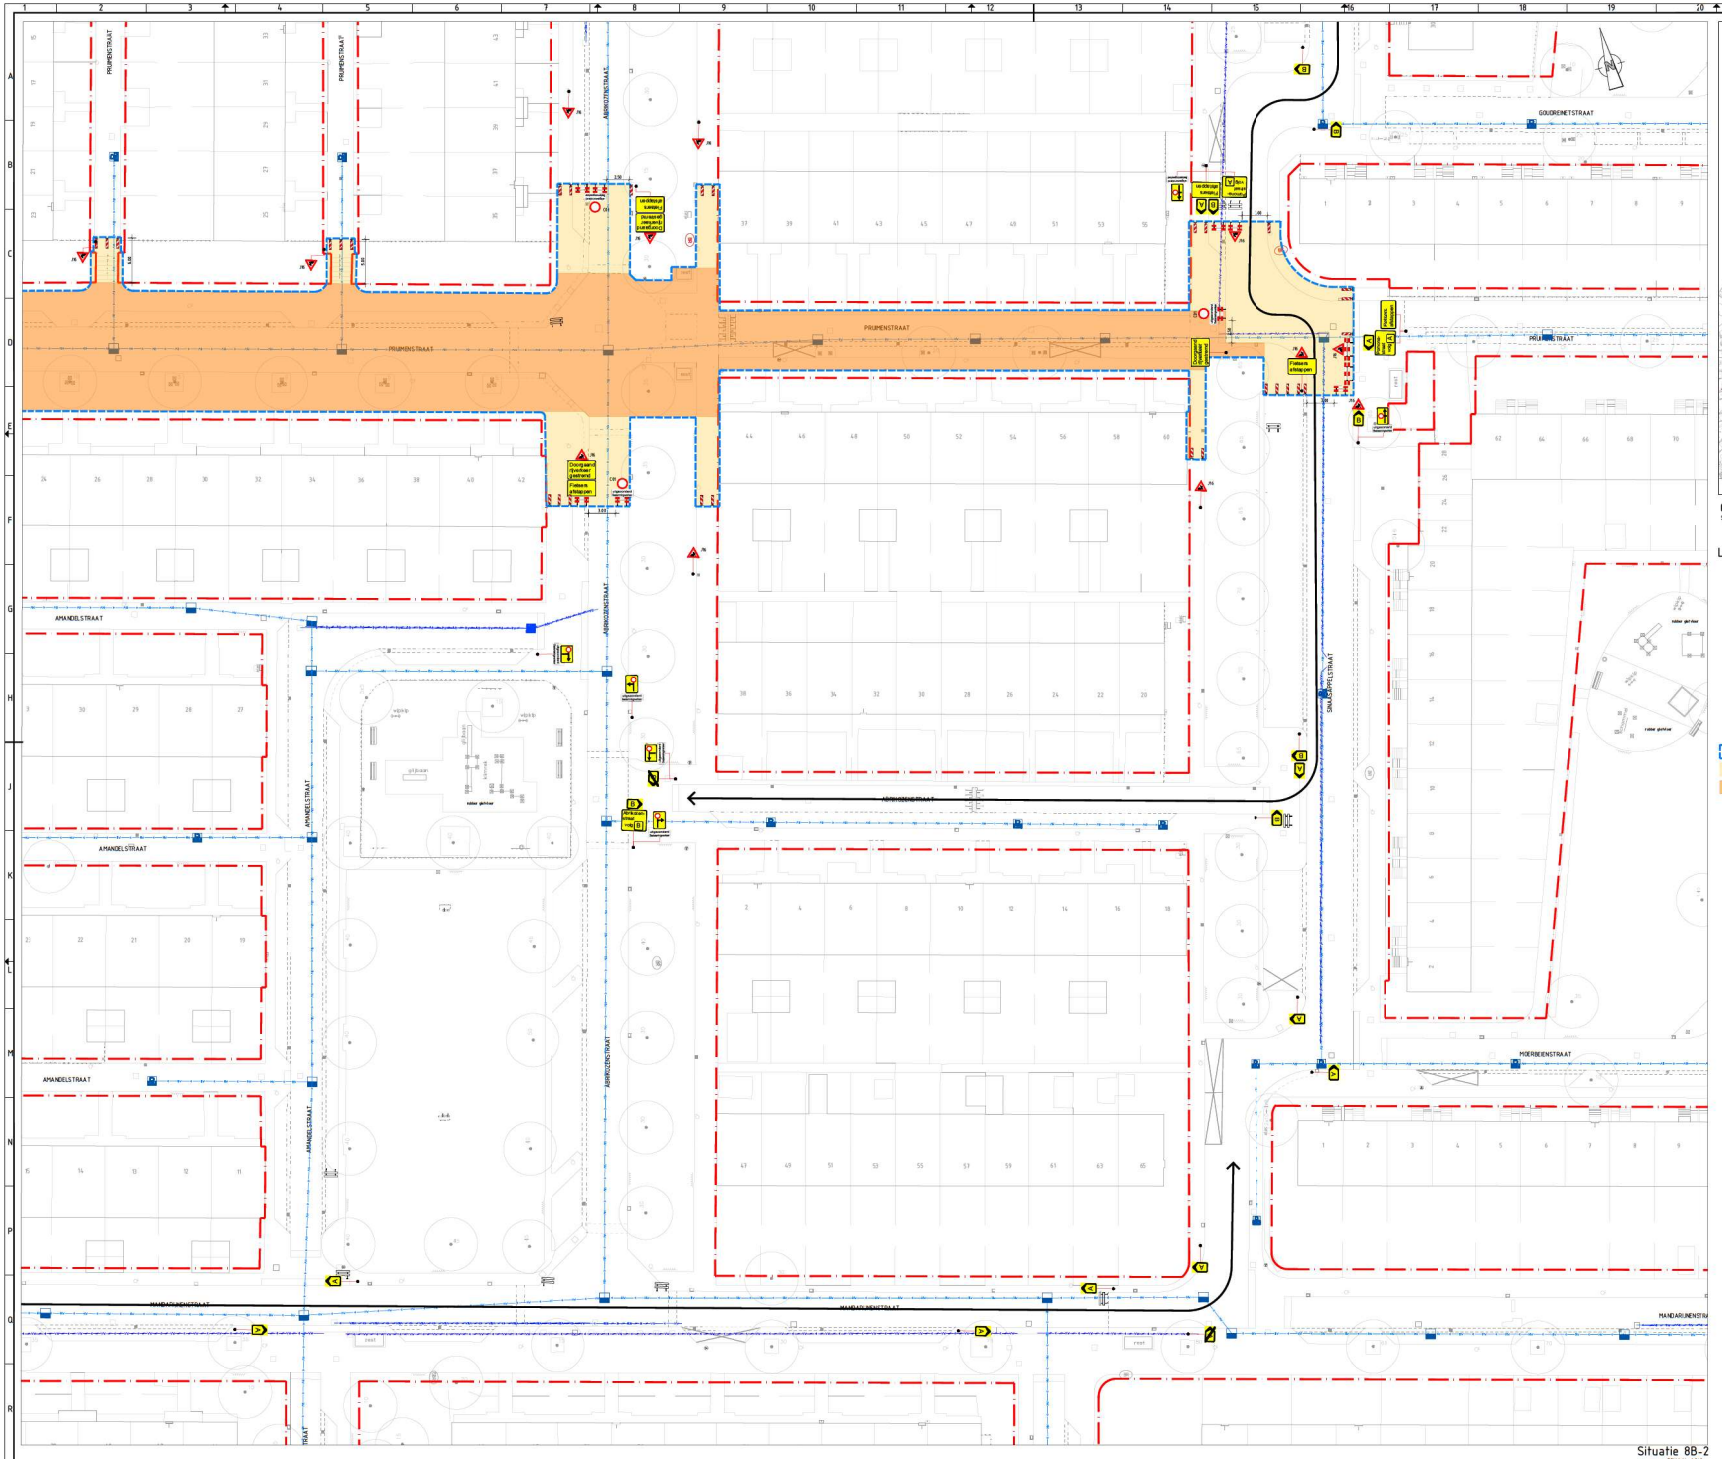

Situatie BB-2
SCHAAL 1:200

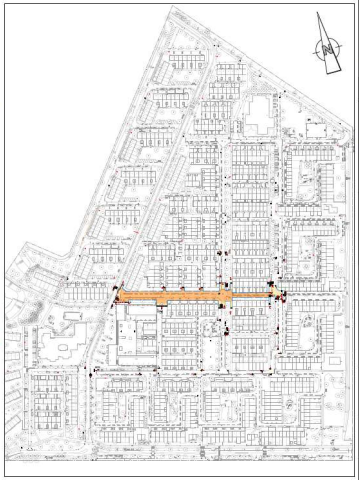

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansleutel/pijp zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase BB-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 20 van 31	status	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	bestand		
datum	01-10-2019	01-10-2019	01-10-2019	formaat	A0	192507-T-5020	Concept	0.3



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene toelichting
- Deze tekening geeft de verkeersmaatregelen die de aannemer dient te treffen in het kader van de werkzaamheden beschreven in de bestekken.
- Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om alle overige maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in RD-stelsel

Toelichting op de verkeersmaatregelen
- De aannemer is verplicht de geprojecteerde verkeersmaatregelen te treffen op dusdanige wijze dat de doorgang van hulpdiensten te allen tijde gewaarborgd is.
- De aannemer is verplicht de geprojecteerde verkeersmaatregelen te treffen op dusdanige wijze dat de doorgang van openbaar vervoer te allen tijde gewaarborgd is.
- Voorgeschreven verkeersmaatregelen dienen te worden getroffen op dusdanige wijze dat de bereikbaarheid van de omliggende panden te allen tijde gewaarborgd is.
- Voorgeschreven verkeersmaatregelen dienen te worden getroffen op dusdanige wijze dat de bereikbaarheid van de omliggende panden te allen tijde gewaarborgd is.
- Voorgeschreven verkeersmaatregelen dienen te worden getroffen op dusdanige wijze dat de bereikbaarheid van de omliggende panden te allen tijde gewaarborgd is.

Algemene toelichting
- Deze tekening geeft de verkeersmaatregelen die de aannemer dient te treffen in het kader van de werkzaamheden beschreven in de bestekken.
- Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om alle overige maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn voor een veilige en vlotte verkeersafwikkeling.
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in RD-stelsel

Situatie 88.3
SCHAAL 1:250

| | | |

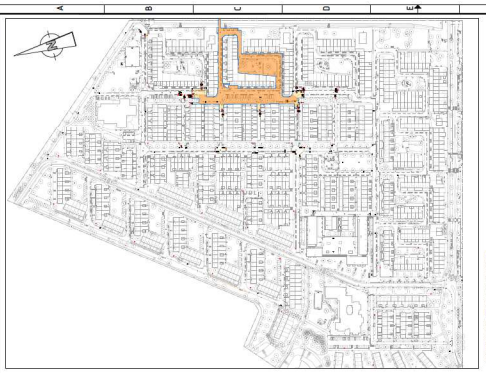

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene opmerkingen
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in RD-stelsel

0	Definitief	01-10-2015	
1.0	Ter inzage	01-09-2015	
versie	oorzaak	datum	

Alvaco de Bondt
ingenieursbureau
Postbus 2241
3500 GE Utrecht
T 030 2308 888
F 030 2308 818
www.alvaco.nl

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4 - Fase 5-1

Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer
Uitvoeringsplatform

gedaan	PVDK	A.L.T.	01-09-2015	1:500	A1
controle	PVDK	A.L.T.	01-09-2015	schaal	

projectnr. 192937
ontwerpnr. 13303
Bestek nr. 2e fase
Bestek
versie
40
19'937-1-5920
1.0

Situatie 9-1
SCHAAL 1:250

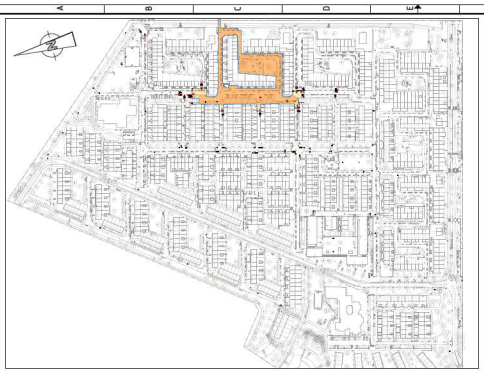

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene toelichting
- Deze tekening geeft aan de verkeersmaatregelen binnen alle fasering is het onderwerpgebied van de verkeersmaatregelen binnen de fasering. Voor de verkeersmaatregelen buiten het onderwerpgebied dient binnen een termijn van 1 week na verkeersmaatregelen bevelbaar te zijn per alle daarvoor noodzakelijke maatregelen.
- Voor de verkeersmaatregelen buiten het onderwerpgebied dient binnen een termijn van 1 week na verkeersmaatregelen bevelbaar te zijn per alle daarvoor noodzakelijke maatregelen.
- De aansluitingen van de enige bouwdelingen vrij zijn.
- Tijdens de bouwwerkzaamheden dient de verkeersveiligheid te worden gewaarborgd.
- Voetgangers dienen altijd een veilige, vrije en comfortabele route te worden aangeboden.
- Voetgangers dienen altijd een veilige, vrije en comfortabele route te worden aangeboden.
- Alle gebruikers dienen altijd een veilige, vrije en comfortabele route te worden aangeboden.
- Alle gebruikers dienen altijd een veilige, vrije en comfortabele route te worden aangeboden.

Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
Coördinaten in meters t.o.v. stelsel
Coördinaten in RD-stelsel

nr	omschrijving	datum
0	Definitief	01-10-2019
1.0	Definitief	30-10-2019

Alvaco de Bondt
ingenieursbureau
Postbus 2241
3500 GE Utrecht
T 030 2308 0 alvaco.nl
F 030 2308 0 alvaco.nl

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 4 - Fase 5-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	naam	datum
ontwerp	PKK	30-10-2019
akte	ALT	30-10-2019

project nr.	19307
stelsel	1300
blad	40
schaal	1:500
formaat	A0

19307-1-5020

1.0

Situatie 9.2
SCHAAL 1:250

GOUDENESTRAAT
GOUDENESTRAAT
SMASSAPELSTRAAT
SMASSAPELSTRAAT
PRUIMENSTRAAT
PRUIMENSTRAAT
ABRIKOZENSTRAAT
ABRIKOZENSTRAAT
ABRIKOZENSTRAAT
ABRIKOZENSTRAAT



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene opmerkingen
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Coördinaten in RD-stelsel

nr	omschrijving	datum
0	Definitief	01-10-2015
1.0	Voorlopig	01-09-2015
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fase 1 - Fase 2 - Fase 3 - Fase 10
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Noord

	naam	datum
ontwerp	RICK	01-09-2015
tekening	ALT	01-09-2015
controle		

project nr. 15327
schaal 1:500
formaat A0

Situatie 10
SCHAAL 1:500

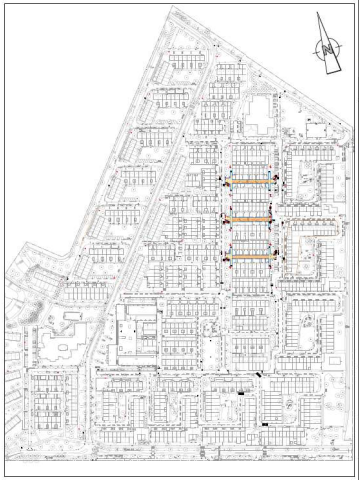

OVERZICHTSSITUATIE

SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:

- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansbordjes zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van noodutgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen op een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan

Groot Onderhoud

Fasering en Bebording - Fase 11

Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd		projectnr.	192507	blad 25 van 31	status	definitief	versie
naam/paraaf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	bakje				
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020			1.0

Aveco de Bondt

Situatie 11

SCHAAL 1:200

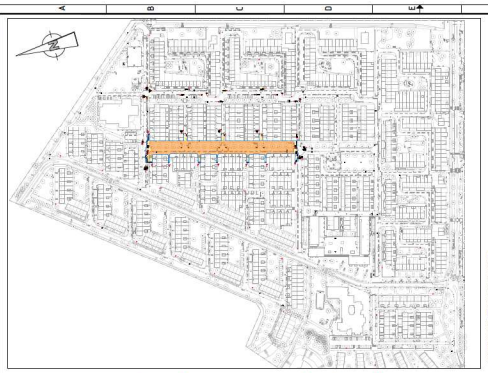

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Algemene opmerkingen
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Deze tekening dient gelezen te worden in samenhang met de overige tekeningen van het Uitvoeringsontwerp
- Coördinaten in RD-stelsel

Algemene opmerkingen
- Voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen dienen alle fasering is het onderhavige van de verkeersmaatregelen bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke materialen.
- Het is niet toegestaan om materialen op de openbare ruimte te plaatsen, tenzij dit vooraf is overlegd en toestemming is verleend door de gemeente Amsterdam.
- Voor het plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen dienen de voorschriften van de CROW-publicatie 96b te worden gevolgd.
- De aannemer dient de verkeersmaatregelen op een zodanige wijze te plaatsen dat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft.
- Alle verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b.
- Voorgaand dient altijd een werkplan, inclusief een verkeerstekening, ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam te worden voorgelegd.
- Voorgaand dient altijd een werkplan, inclusief een verkeerstekening, ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam te worden voorgelegd.
- Voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen dienen de voorschriften van de CROW-publicatie 96b te worden gevolgd.
- De aannemer dient de verkeersmaatregelen op een zodanige wijze te plaatsen dat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft.
- Alle verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b.
- Voorgaand dient altijd een werkplan, inclusief een verkeerstekening, ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam te worden voorgelegd.
- Voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen dienen de voorschriften van de CROW-publicatie 96b te worden gevolgd.
- De aannemer dient de verkeersmaatregelen op een zodanige wijze te plaatsen dat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft.
- Alle verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b.
- Voorgaand dient altijd een werkplan, inclusief een verkeerstekening, ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam te worden voorgelegd.
- Voor de uitvoering van de verkeersmaatregelen dienen de voorschriften van de CROW-publicatie 96b te worden gevolgd.
- De aannemer dient de verkeersmaatregelen op een zodanige wijze te plaatsen dat de overlast voor de omgeving zo beperkt mogelijk blijft.
- Alle verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de richtlijnen van de CROW-publicatie 96b.
- Voorgaand dient altijd een werkplan, inclusief een verkeerstekening, ter goedkeuring aan de gemeente Amsterdam te worden voorgelegd.

Algemene opmerkingen
- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Deze tekening dient gelezen te worden in samenhang met de overige tekeningen van het Uitvoeringsontwerp
- Coördinaten in RD-stelsel

0	Definitief		01-10-2019
1.0	Definitief		01-10-2019
versie	wijziging		datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fase 12-1 - Fase 12-1
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam
Stadsdeel Zuid

tekenaar	RICK	ALT	01-10-2019	01-10-2019	schaal	1:500
ontwerper				project nr.	19307	
tekening nr.					40	

Situatie 12.1
SCHAAL 1:500

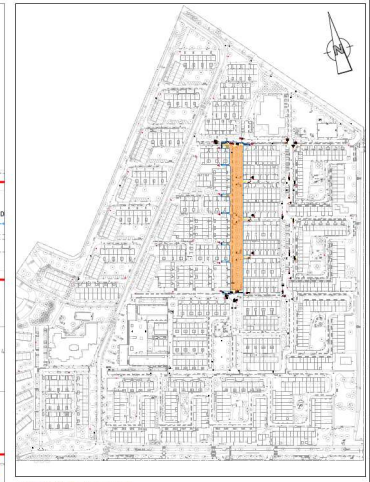

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 12500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraandeksels zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i paen kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder-validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Beboording - Fase 12-2
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

	ontwerp	gecontroleerd	getekend	projectnr.	192507	blad 21 van 31	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	folio nr.	192507-T-5020		1.0
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0				

Aveco de Bondt
ingenieursbureau
Postbus 9
1000 AA Amsterdam
1000 GE Amsterdam
T +31 (0)88 18 66 000
E amsterdam@aveco-debondt.nl

Situatie 12-2
SCHAAL 1:200

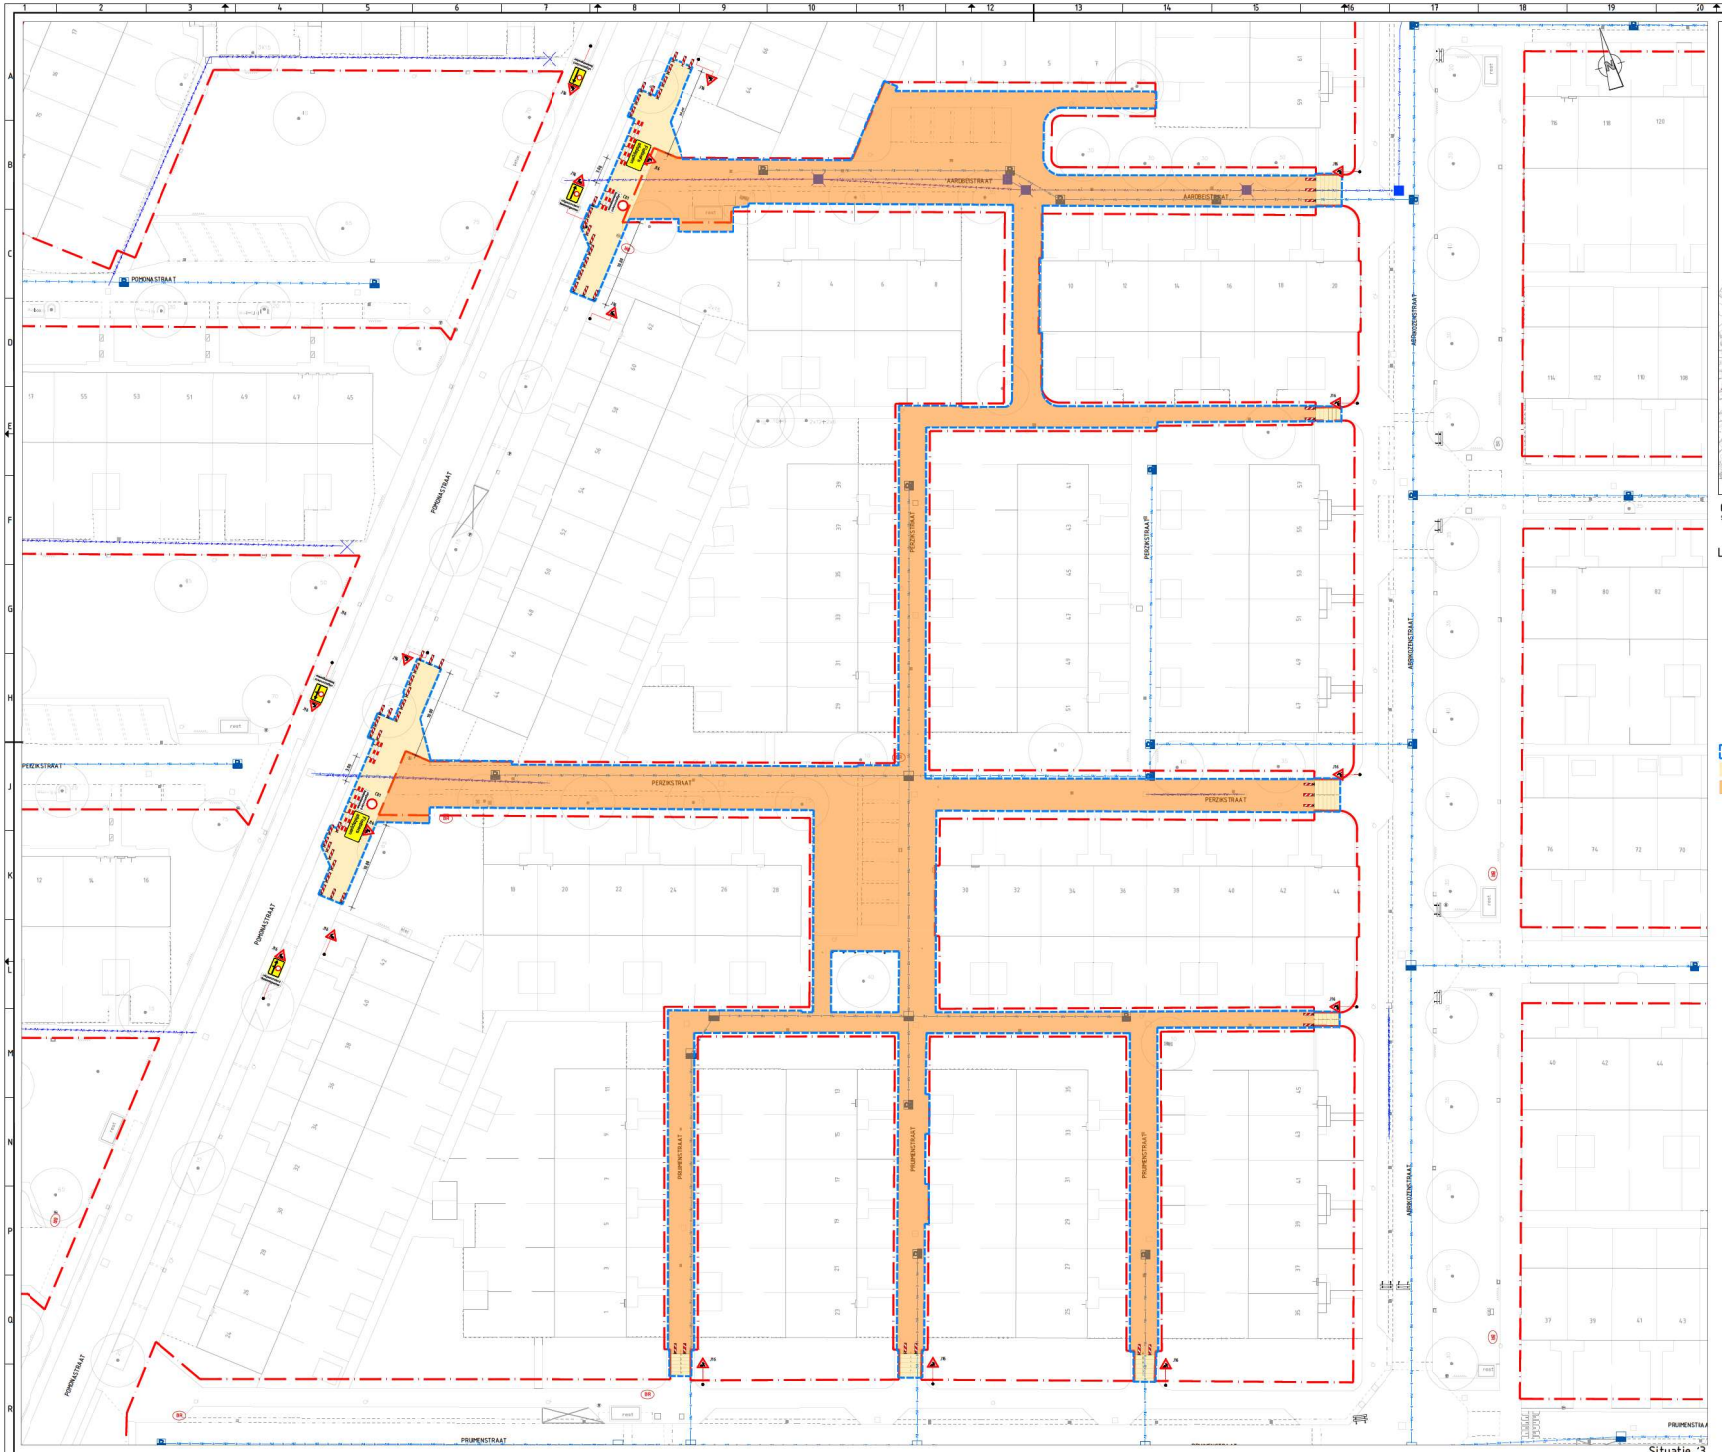
POPONSTRAAT
PERZIKSTRAAT
PRUIMENSTRAAT
AARDBEISTRAAT
ABRIKOZENSTRAAT
PERZIKSTRAAT
PRUIMENSTRAAT
PRUIMENSTRAAT
PRUIMEN

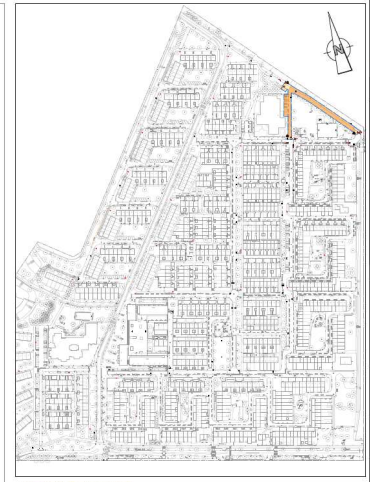

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansleutels zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 1A
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 29 van 31	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	tekst			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0	192507-T-5020			1.0

Situatie 1A
SCHAAL 1:200

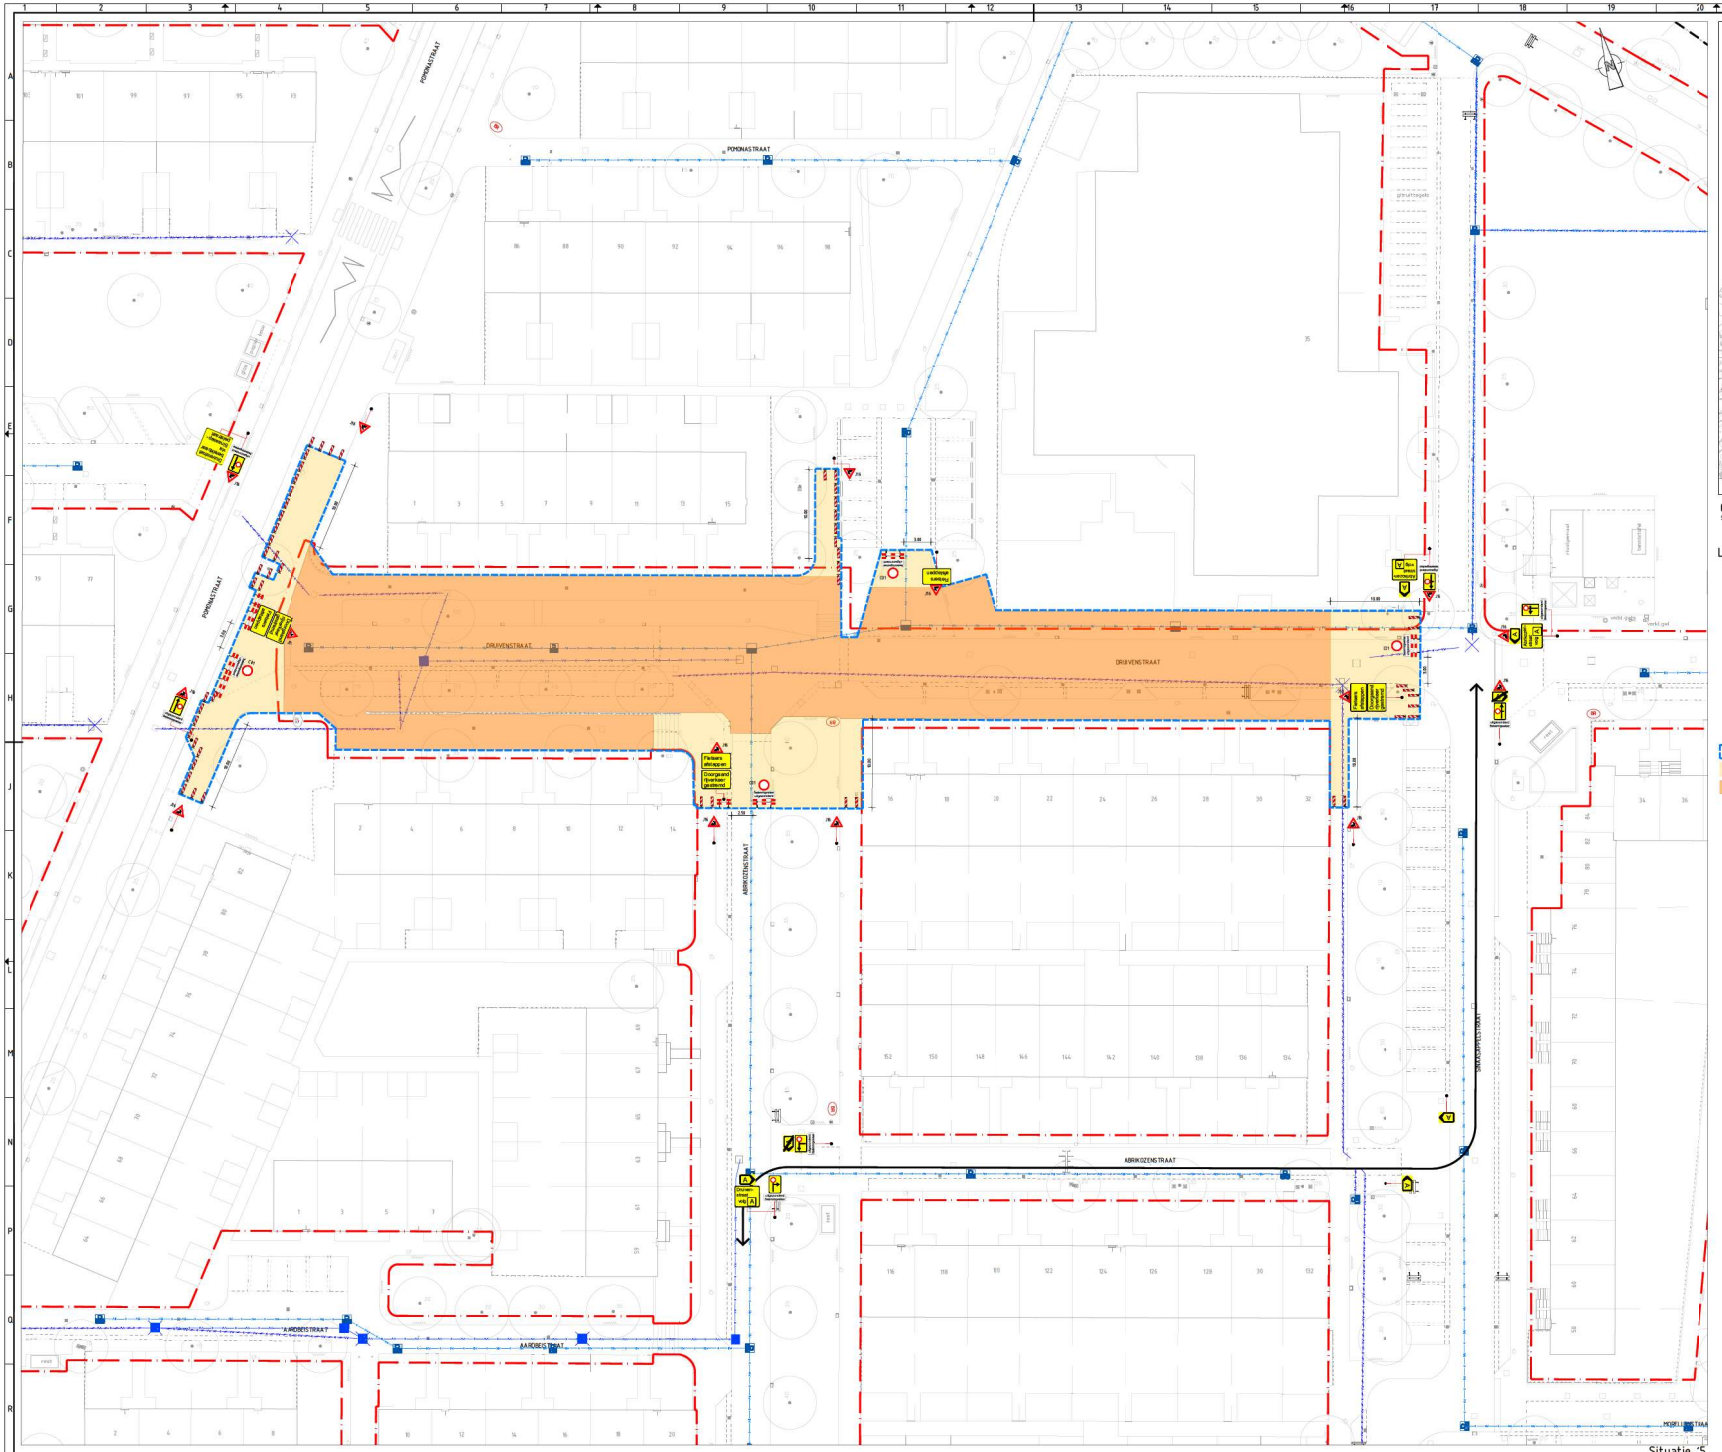

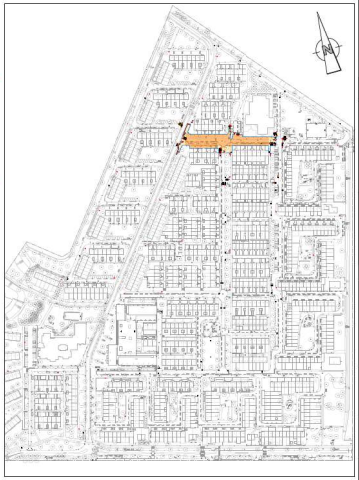

OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA



Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraansbordjes zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen ≥ goed kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minder validen en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 15
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt
ingenieursbureau

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 31 van 31	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	fabr.nr.			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0

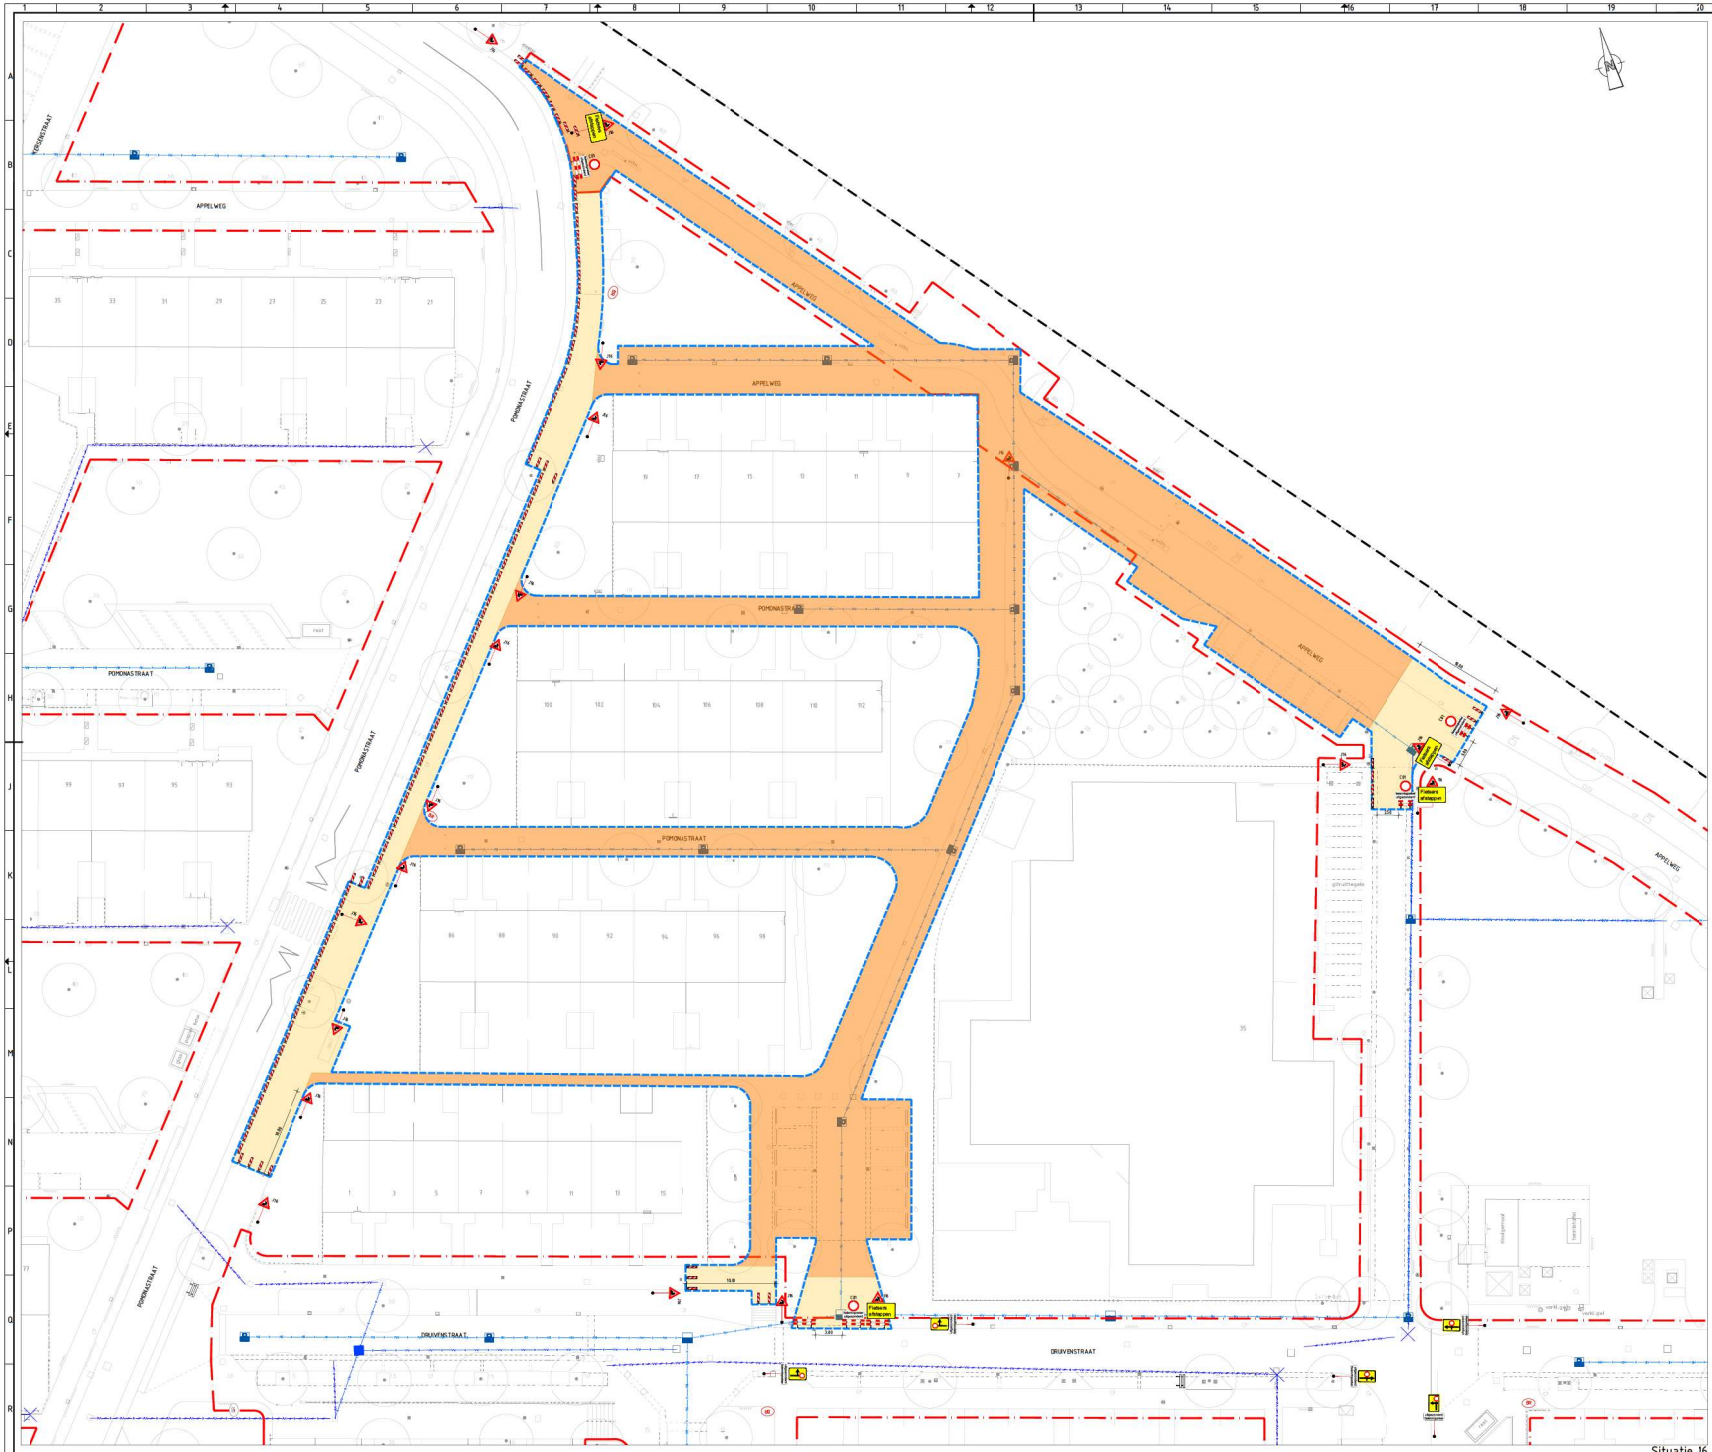



OVERZICHTSSITUATIE
SCHAAL 1:2500

LEGENDA

Eisen tijdens uitvoering:
- Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke middelen.
- Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat ten minste:
  - De brandkraankanondjes zichtbaar zijn;
  - De aansluitingen van de droge bluisleidingen vrij zijn.
- Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels.
- Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen i.p.v. kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande toegroutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor minderwaliden en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA).
- Sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken dienen te allen tijde bereikbaar en bedienbaar te zijn.

- Alle maten in meters, tenzij anders aangegeven
- Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.
- Dimensies van materialen in millimeters
- Coördinaten in RD-stelsel

1.0	Definitief	03-10-2019
0.3	Concept	01-10-2019
versie	wijziging	datum

Tuindorp Oostzaan
Groot Onderhoud
Fasering en Bebording - Fase 16
Uitvoeringsontwerp

Gemeente Amsterdam

Aveco de Bondt

	getekend	gecontroleerd	goedgekeurd	projectnr.	192507	blad 31 van 31	status	Definitief	versie
naam/paraf	PKK	ALT	RMK	schaal	1:200	fabr.:			
datum	03-10-2019	03-10-2019	03-10-2019	formaat	A0		192507-T-5020		1.0

Situatie 16
SCHAAL 1:200

Bijlage 3 Hinderkalender

Hinderkalender Tuindorp Oostzaan

Datum bijgewerkt: 3-10-2019
Revisie: 1.0
Documentnr. TDOZ-000313

Hinder	JA X
Hinder	Nee √
Hinder	Beperkt

Weken	Afsluitingen	Fase(n) West	Fase(n) Oost	OV	Auto	Fietsers	Voet-gangers	Leefbaar-heid (geluid, stof, licht, trillingen etc).
45 t/m 3	Appelweg, Pomonastraat, Kersenstraat,	1 West		√	X	beperkt	beperkt	X
52/1	*geen werkzaamheden*	(vakantie)						
45 t/m 3	Mandarijnenstraat, Dadelstraat, Kruisbessenstraat		1 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
2 t/m 7	Pomonastraat, kersenstraat,	2 West		√	X	beperkt	beperkt	X
4 t/m 9	Pomonastraat, Kersenstraat,	3 West		√	X	beperkt	beperkt	X
2 t/m 8	Amandelstraat, Rozijnenstraat		2 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
5 t/m 10	Pomonastraat, Kersenstraat,	4 West		√	X	beperkt	beperkt	X
7 t/m 12	Perzikstraat Kersenstraat	5 West		√	X	beperkt	beperkt	X
5 t/m 11	Bananenstraat, Citroenenstraat		3 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
8 t/m 14	Notenstraat		4 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
9 t/m 14	Tomatenstraat, Kersenstraat	6 West		√	X	beperkt	beperkt	X
11 t/m 16	Bessenpad	7 West		√	X	beperkt	beperkt	X
11 t/m 20	Mandarijnenstraat, Ananasplein		5 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
13 t/m 23	Frambozenstraat, Meloenenstraat, Mandarijnenstraat,	8 West		√	X	beperkt	beperkt	X
17 t/m 23	Pruimenstraat Sinaasappelstraat, Moerbeienstraat		6 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
20 t/m 28	Amandelstraat, Abrikozenstraat		7 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
25 t/m 30	Pruimenstraat		8 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
31/32/33	*geen werkzaamheden*	(vakantie)						
28 t/m 36	Sinaasappelstraat, Goudreinetstraat		9 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
34 t/m 39	Sinaasappelstraat, Morellenstraat, Druivenstraat		10 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
37 t/m 42	Abrikozenstraat		11 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
19 t/m 25	Abrikozenstraat		12 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
22 t/m 27	Pruimenstraat, Perzikstraat, Aardbeistraat		13 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
24 t/m 35	Appelweg, Druivenstraat		14 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
28 t/m 38	Druivenstraat		15 Oost	√	X	beperkt	beperkt	X
34 t/m 42	Pomonastraat, Appelweg		16 oost	√	X	beperkt	beperkt	X

*** In elke informatiebrief komt het aspect leefbaarheid/hinder terug. Op deze manier weten de stakeholders welke hinder zij evt. kunnen verwachten.**

Bijlage 4 Communicatie middelenmatrix (UP050)

Middel (schriftelijk en digitaal)	Wanneer	Doelgroep	Wie voert uit
Informatiebrief voor start uitvoering CN010,CN110, B.2.7)	4 weken voor start uitvoering	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Start fase(n) brieven B.2.11 en CN010	1 week voor start van elke fase(n)	Bewoners en ondernemers in de directe omgeving	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Informatiedeling "informatiebrief"	1 x per week versturen aan OM gem. Amsterdam	OM Gem. Amsterdam en Bewoners en ondernemers in de directe omgeving	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
BLVC-overleg met OM gem. Amsterdam	1 x per 2 weken	OM gem. Amsterdam	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Werkzaamheden aan huisaansluitingen CN120	4 weken van te voren schriftelijk aankondigen en 5 dagen van te voren schriftelijk bevestigen		[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Omgevingsbijeenkomst B.2.8	3 weken voor start uitvoering	Bewoners, ondernemers in de direct omgeving	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Omgevingsapp B.2.10	In ieder geval een bericht voor start van elke fase, indien nodig vaker	Bewoners, ondernemers en belanghebbenden	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Inloopspreekuur CN100, B.2.12	1x per week	Bewoners en ondernemers in de directe omgeving	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Keukentafelgesprekken B.2.8.1	2 weken voor start uitvoering van een fase	Bewoners en ondernemers binnen het werkgebied	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Veiligheidsles " SBO De Zeppelin" B.2.13	4 weken voor start uitvoering **fase 8**	Leerlingen van SBO DE Zeppelin	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Vooraankondigingsborden B.2.9	1 week voor de uitvoering	Bewoners, ondernemers en weggebruikers	
Omleidingsborden B.2.14	Voor start fase	Bewoners, ondernemers en weggebruikers	

Middel (schriftelijk en digitaal)	Wanneer	Doelgroep	Wie voert uit
Afstemmingsgesprek partijen B2.6	Week 37,38,39,40	Brandweer (namens de hulpdiensten), afvalservice, gebiedsbeheerder	[redacted](OM) [redacted] [redacted]@kws.nl
Omgevingsassistent B.2.15	5 dagen per week op het werk aanwezig	Bewoners, ondernemers en weggebruikers	

Bijlage 5 Communicatiekalender

Communicatiekalender Tuindorp Oostzaan

Documentnr. : TDOZ-000315

ID-nr.	Begin Datum	Eind datum	Activiteit	Doelgroepen	* B of P comm	Info naar gem. Amsterdam	Brief versturen naar bewoners	Aandachtspunten
	3-10-2019		BLVC-plan indienen (voor 12:00 uur bij WWU)					
	16-9-2019	7-10-2019	**Voor start uitvoering fase 1:** informatiebrief voor start uitvoering (4 wkn)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B	20-9-2019	7-10-2019	verwerken: inloopspreekuur, app, uitnodiging omgevingsbijeenkomst. **Tevens op de KWS app de brief zetten.**
	9-10-2019	28-10-2029	**Voor fase 1:** start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	**B**	16-10-2019	28-10-2019	
	9-10-2019	28-10-2019	**Voor fase 1:** bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B		28-10-2019	**Brief in app zetten!**
	14-10-2019	14-10-2019	**Voor fase 1:** omgevingsbijeenkomst **(3 wkn voor start uitvoering)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	**B**	n.t.b.	7-10-2019	
	14-10-2019	18-10-2019	**Voor start uitvoering fase 1:** keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B			
	4-11-2019	**22-12-2019**	**Fase 1 west (wk 45 t/m 51)**					
			Voor fase 2: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B	n.t.b.		
			Voor fase 2: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B	n.t.b.		
			Voor start uitvoering fase 2: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B	n.t.b.		
	23-12-2019	**5-1-2029**	**Vakantie KWS Infra en gem. Amsterdam?**					
	6-1-2020	**16-2-2020**	**Fase 2 west (wk 2 t/m wk 7)**					
			Voor fase 3: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B	n.t.b.	n.t.b.	
			Voor fase 3: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B			
			Voor start uitvoering fase 3: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving	B			
	20-01-209	**1-3-2020**	**Fase 3 west (wk 4 t/m 9)**					
			Voor fase 4: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 4: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 4: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	20-1-2020	**8-3-2020**	**Fase 4 west (wk 4 t/m 10)**					
			Voor fase 5: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 5: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 5: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	3-2-2020	**22-3-2020**	**Fase 5 west (wk 6 t/m12)**					
			Voor fase 6: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 6: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				

* **B** (Bouwcommunicatie) en **P** (Publiekscommunicatie)

			Voor start uitvoering fase 6: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	27-7-2020	**16-8-2020**	**bouwvak vakantie KWS Infra en gem. Amsterdam?**					
	24-2-2020	**5-3-2020**	**Fase 6 west (wk 9 t/m 14)**					
			Voor fase 7: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 7: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 7: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	9-3-2020	**19-4-2020**	**Fase 7 west (wk 11 t/m 16)**					
		0-1-1900	**Voor fase 8:** start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
		0-1-1900	**Voor fase 8:** bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 8: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	23-3-2020	**7-6-2020**	**Fase 8 west (wk 13 t/m 23)**					
			Voor fase 1: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 1: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 1: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	4-11-2019	**19-1-2020**	**Fase 1 oost (wk 45 t/m 3)**					
			Voor fase 2: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 2 bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 2: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	6-1-2020	**23-2-2020**	**Fase 2 oost (wk 2 t/m 8)**					
			Voor fase 3: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 3: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 3: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	27-1-2020	**23-2-2020**	**Fase 3 oost (wk 5 t/m 8)**					
			Voor fase 4: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 4: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 4: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	17-2-2020	**5-4-2020**	**Fase 4 oost (wk 8 t/m 14)**					
			Voor fase 5: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 5: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 5: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	9-3-2020	**17-5-2020**	**Fase 5 oost (wk 11 t/m 20)**					
			Voor fase 6: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				

* **B** (Bouwcommunicatie) en **P** (Publiekscommunicatie)

			Voor fase 6: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 6: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	20-4-2020	**7-6-2020**	**Fase 6 oost (wk 17 t/m 23)**					
			Voor fase 7: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 7: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 7: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	11-5-2020	**12-7-2020**	**Fase 7 oost (wk 20 t/m 28)**					
			Voor fase 8: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 8: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 8: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	15-6-2020	**26-7-2020**	**Fase 8 oost (wk 25 t/m 30)**					
			Voor fase 9: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 9: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 9: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	6-7-2020	**6-9-2020**	**Fase 9 oost (wk 28 t/m 36)**					
			Voor fase 10: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 10: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 10: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	17-8-2020	**27-9-2020**	**Fase 10 oost (wk 34 t/m 39)**					
			Voor fase 11: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 11: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 11: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	7-9-2020	**18-10-2020**	**Fase 11 oost (wk 37 t/m 42)**					
			Voor fase 12: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 12: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 12: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	4-5-2020	**21-6-2020**	**Fase 12 oost (wk 19 t/m 25)**					
			Voor fase 12: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 13: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 13: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	25-5-2020	**5-7-2020**	**Fase 13 oost (wk 22 t/m 27)**					
			Voor fase 14: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				

* **B** (Bouwcommunicatie) en **P** (Publiekscommunicatie)

			Voor fase 14: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 14: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	8-6-2020	**26-7-2020**	**Fase 14 oost (wk 24 t/m 30)**					
			Voor fase 15: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 15: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 15: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	6-7-2020	**20-9-2020**	**Fase 15 oost (wk 28 t/m 38)**					
			Voor fase 16: start fase brief **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor fase 16: bericht KWS app **(1 week voor start fase)**	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
			Voor start uitvoering fase 16: keukentaffelgesprekken (2 wkn voor uitvoering)	Bewoners, ondernemers in de directe omgeving				
	17-8-2020	**18-10-2020**	**Fase 16 oost (wk 34 t/m 42)**					

* **B** (Bouwcommunicatie) en **P** (Publiekscommunicatie)

Bijlage 6 Projecten/evenementen lijst

	Project/evenement	Coördinatie nummer	Start/einddatum	Contact persoon	Relatie
1	TUINDORP OOSTZAAN, gebied wordt begrensd door: Kersenstraat, Tomatenstraat, Frambozenstraat, Werktuigstraat, Appelweg en water langs de Moestuinlaan (DORA) vernieuwen straatwerk en verbeteren groen	20165501	04-11-2019 t/m 01-11-2020	Stadsdeelwerken [redacted]	
2	NAGELJONGSTRAAT, groenperk kop Nageljongenstraat / Werktuigstraat, SCHEEPSBOUWWEG en ANNABELLAWEG, groenstroken, KWEKERIJLAAN, oever kop watergangen en SCHEEPSBOUWWEG / KWEKERIJLAAN / MOESTUINLAAN en NAGELJONGSTRAAT / KLINKERWEG, kruisingen aanplant nieuwe bomen, aanleg groenstrook, realisatie steigers langs water, aanbrengen geveltuintjes, aanpassingen kruising en wijziging verharding kruising van asfalt naar elementenverharding	20176396	21-01-2019 t/m 31-12-2019	Stadsdeelwerken [redacted]	Geen raakvlak
3	DE BONGERD, deelgebied 1 begrensd door; Bongerdkade, Boomgaardlaan, Winterjanpad en Moestuinlaan inrichten maaiveld	20183697	01-04-2019 t/m 01-01-2021	Grond en Ontwikkeling [redacted]	Geen raakvlak
4	DE BONGERD, deelgebieden 2 en 3, deelgebied 2 begrensd door; Kwekerijlaan, Boomgaardlaan, Vlakkerweg en Scheepsbouwweg en deelgebied 3 begrensd door; Verlengde Kwekerijlaan, Zijkanaal I en Boomgaardlaan verwijderen c.q. omleggen bestaande kabels en leidingen en aanleggen nieuwe kabels en leidingen voor geprojecteerde nieuwbouw.	20080319	01-02-2012 t/m 01-01-2022	Stadsdeelwerken [redacted]	Geen raakvlak
5	DE BONGERD, deelgebied 4A begrensd door; Boomgaardlaan, Tuinderijlaan, Koppelingspad en Vlakkerweg aanleg ondergrondse infra en maaiveldinrichting rond oplevering woningbouw	20161100	01-01-2018 t/m 01-10-2019	Stadsdeelwerken [redacted]	Geen raakvlak
6	KOPPELINGPAD huisnr. 11. Leggen coaxkabel (74 m').	20196820	23-09-2019 t/m 13-10-2019	Ziggo B.V. [redacted]	Geen raakvlak

	Project/evenement	Coördinatie nummer	Start/einddatum	Contact persoon	Relatie
7	APPELWEG ts huisnr. 48 en Stellingweg en OOSTZANERDIJK saneren, bouwrijp maken terrein en aanbrengen stalen damwand langs oever	20170913	01-01-2019 t/m 01-01-2020	Stadsdeelwerken [redacted]	Geen raakvlak
8	TUINDORP OOSTZAAN ts COENTUNNELCIRCUIT en STELLINGWEG Verwijderen bestaande ondergrondse (pers)containers. Plaatsen nieuwe ondergrondse afvalcontainers en uitbreiden containerlocaties met ondergrondse containers voor waardefracties (glas, papier, kunststof)	20191019	08-04-2019 t/m 13-02-2020	Afval & Grondstoffen [redacted]	Geen raakvlak
	EVENEMENTEN: Tijdens de uitvoering zijn er vooralsnog geen evenementen bekend welke een raakvlak met het project opleveren.				

Bijlage 7 Meldingenregister

Meldingenregister

Melding-ID	Melding	Omschrijving	Status	Datum gemeld	Datum gereed	Reactie	Categorie	Type	Binnengekomen via	Gemeld door	Maatregel
MD-00001	melding/vraag	Van: [redacted] amsterdam.nl> Verzonden: donderdag 19 september 2019 12:10 Beste [redacted] Inmiddels is de aannemer KWS hard bezig aan het ontwerp voor de wijk. @[redacted] zou jij deze mevrouw willen beantwoorden wanneer jullie werkzaamheden ongeveer klaar zijn voor haar deur? Dank je wel, groeten [redacted] Verzonden: Thursday, September 19, 2019 11:36 Onderwerp: Abrikozenstraat xxx Beste [redacted] Kunt u mij misschien iets concreter vertellen in welke periode de werkzaamheden voor mijn deur en in de straat zullen zijn? Ik ben vorig naar oktober hier komen wonen en wil graag een terras laten leggen in de voortuin. Het is natuurlijk niet handig als ik dat voor de werkzaamheden doe. Hopelijk kunt u mij meer vertellen. Met vriendelijke groet, [redacted]	In behandeling	2019-09-19	2019-09-20	vr 20-9-2019 16:15 Beste [redacted] Ik ben vanuit KWS Infra (de aannemer) de omgevingsmanager voor het project Tuindorp Oostzaan/Terrasdorp. [redacted] heeft mij gevraagd om op uw vraag een reactie te geven. De Abrikozenstraat xxx gaan wij (vooralsnog) uitvoeren in week 29 en 30 (13 juli t/m 24 juli 2020). Dit moment is nog wel onder voorbehoud. Het kan een maand eerder of later worden. U ontvangt voor die tijd nog informatie wanneer wij bij dit gedeelte van uw wijk aan de slag gaan. Ik zal u hier tijdig over informeren. Ik hoop u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er n.a.v. mijn mail nog vragen zijn dan hoor ik het graag. Met vriendelijke groet, [redacted]			[redacted]	[redacted]	

Bijlage 8 (Bouw)Planning (UP040)

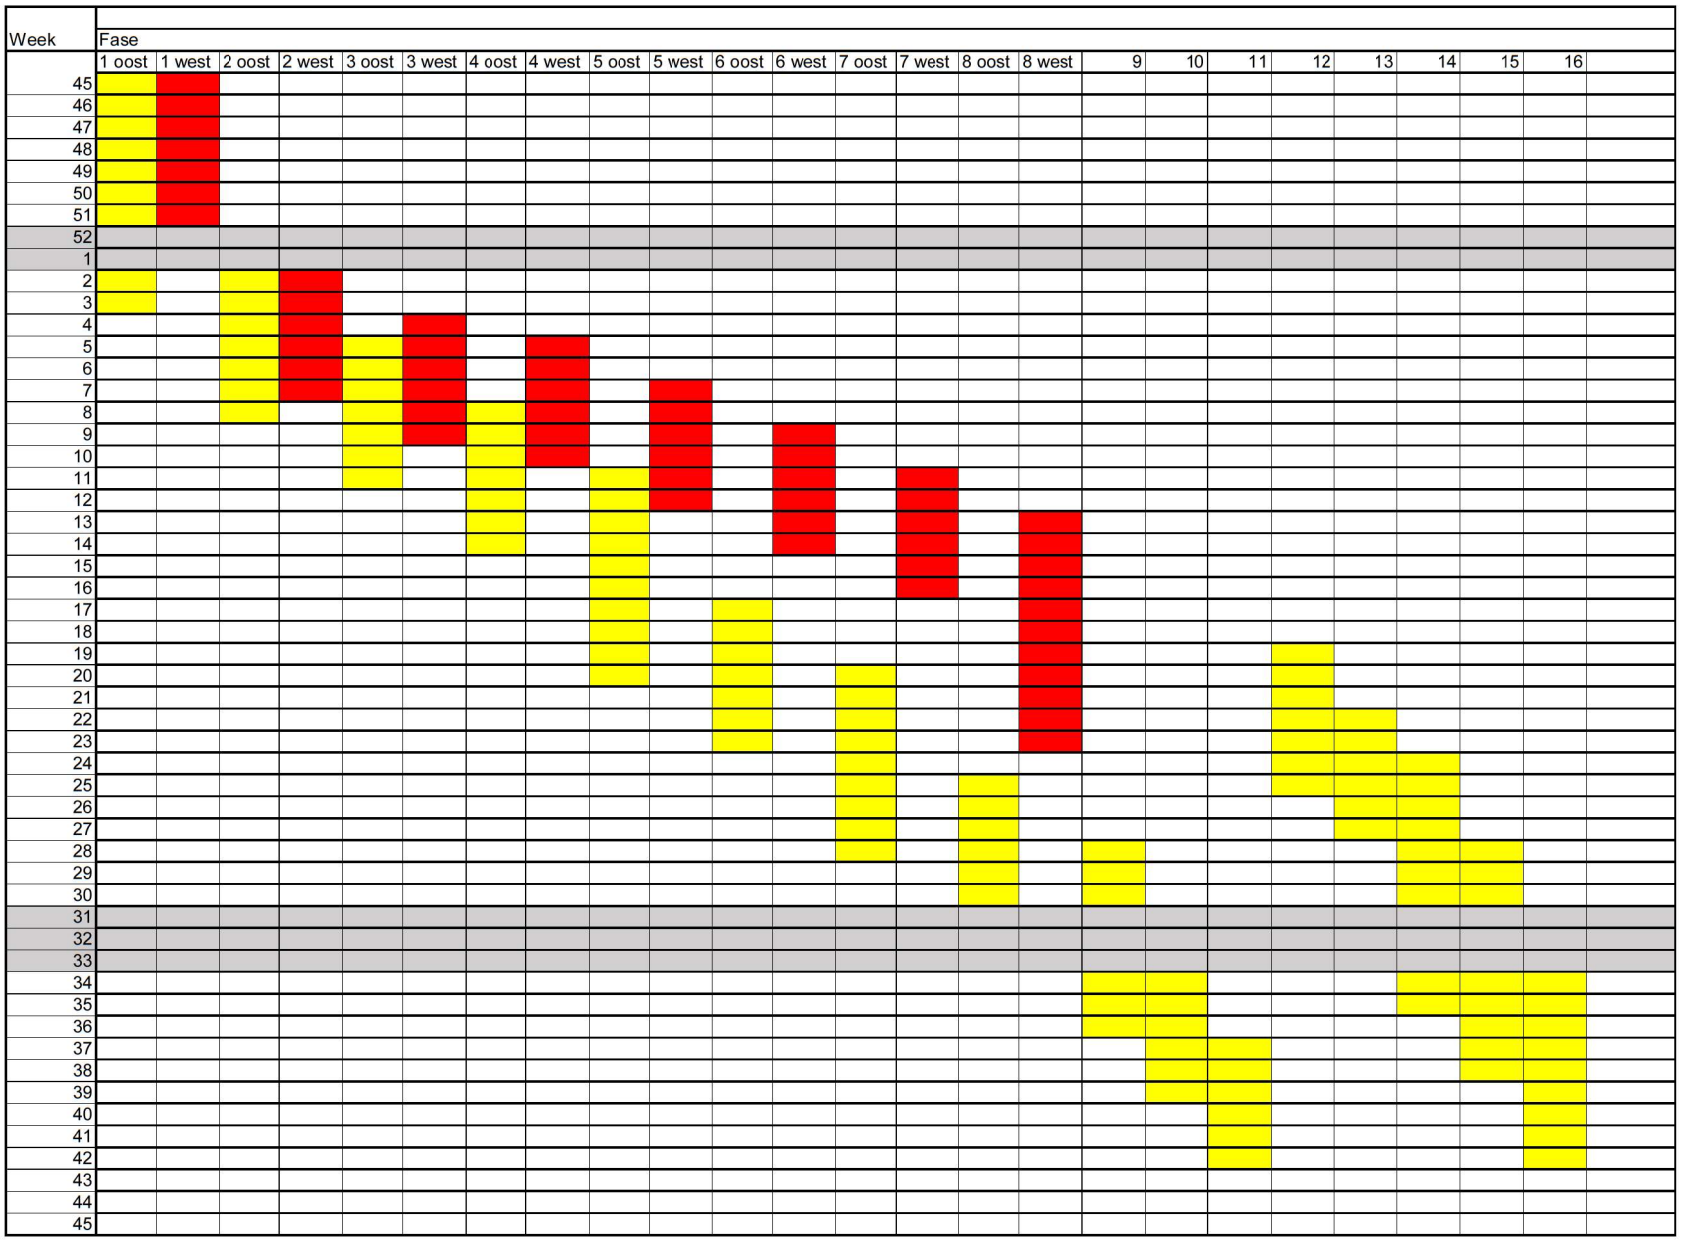

= fasering westzijde van de Pomonastraat

= fasering oostzijde van de Pomonastraat

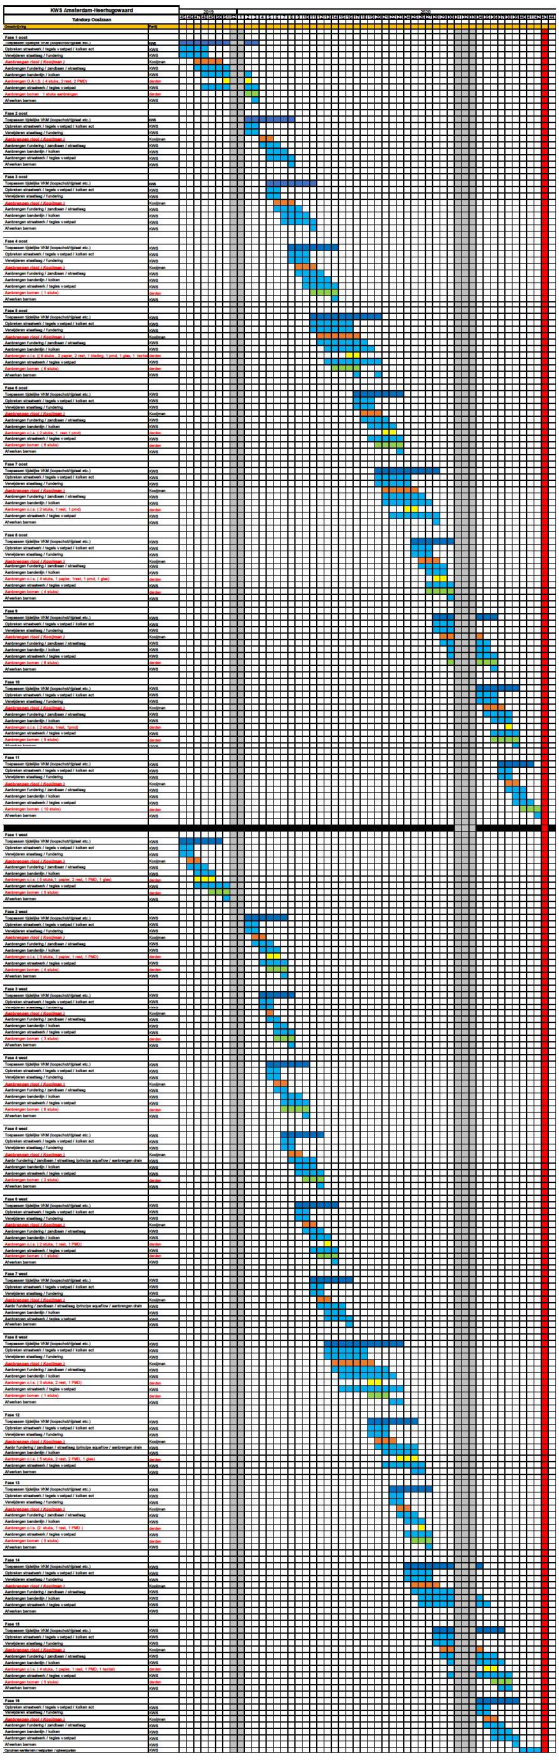
KWS Amsterdam-Heerhugowaard
Tuinbouw Overtoom
2025
2026
Activiteiten
Fase 1 zuid
Fase 2 zuid
Fase 3 zuid
Fase 4 zuid
Fase 5 zuid
Fase 6 zuid
Fase 7 zuid
Fase 8 zuid
Fase 9 zuid
Fase 10
Fase 11
Fase 1 west
Fase 2 west
Fase 3 west
Fase 4 west
Fase 5 west
Fase 6 west
Fase 7 west
Fase 8 west
Fase 9 west
Fase 12
Fase 13
Fase 14
Fase 15
Fase 16
Zandwinkelbeken / nabijzijnde / rijtweezijden

Bijlage 9 Locatie bouwkeet en opslagterrein


S.V. De Meteoor
B&B de Albatros
Locatie bouwkeet en opslagterrein
Appelweg
Pomonastraat
Druivenstraat
Ouder- en Kindteam Noord West
Pruimenstraat
SBO De Zeppelin
Ananasplein
Beautiful Houseboat Amsterdam North...
Mandarijnenstraat
Werktuigstraat
Abrikozenstraat
Moestuinlaan
Google

Bijlage 10 Verificatierapport BLVC-Uitvoeringsplan

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

WP-00023 | Aansturing omgeving

WPA-00030 | BLVC-plan (Omgeving) (Voldoen aan BLVC-kader (OM), --)

Aantal eisen:	Uitgesloten:	Aantal verificaties:
157		156

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex1-001 V-000648	**Vergunning-Moor:** Aanvragen WIOR-melding inclusief melding in MOOR **Toelichting op Eis:** Open breken openbare ruimte						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000676	zie par. 9.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex1-002 V-000658	**Vergunning-KLIC melding:** KLIC-melding als grondroerder **Toelichting op Eis:** Mechanische graafwerkzaamheden t.b.v. kabels en leidingen						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000686	zie par. 9.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex1-003 V-000677	**Vergunning-aanvragen:** De genoemde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen laten onverlet dat, indien de Opdrachtnemer meerdere vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen noodzakelijk acht, deze aanvraagt. **Toelichting op Eis:** Van Opdrachtnemer wordt verwacht middels de Acceptatieprocedure vast te leggen tot welke categorie de vergunning, ontheffingen,						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000705	zie hfst 1.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex16-001 V-000630	**Social Returnwaarde 1:** Bij deze opdracht verplicht de Opdrachtnemer zich een waarde gelijk aan tenminste 1% van de totale uiteindelijke opdrachtwaarde (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000658	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex16-002 V-000574	**Social Returnwaarde 2:** Uiterlijk zeven werkdagen na opdrachtverstrekking dient de Opdrachtnemer contact op te nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via: social.return@amsterdam.nl. **Toelichting op Eis:** Bureau Social Return adviseert de Opdrachtnemer over de invulling van Social Return. De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van deze overeenkomst.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000602	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

KWS

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Annex16-003 V-000617	**Social Returnwaarde 3:** De Opdrachtnemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR. **Toelichting op Eis:** Bureau Social Return voert een controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en gerapporteerde gegevens, en informeert de opdrachtgever over de behaalde resultaten.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000645	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
Annex16-004 V-000563	**Social Returnwaarde 4:** De Opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de doelgroep. **Toelichting op Eis:** Dit geldt ook wanneer de Opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers. De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return erplichting ligt bij de Opdrachtnemers. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000591	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
Annex16-005 V-000614	**Social Returnwaarde 5:** De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. **Toelichting op Eis:** De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van de opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WGA -/WAO-, of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en BBL niveau 1 en 2. De opdrachtnemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000642	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
Annex16-006 V-000559	**Social Returnwaarde 6:** De Opdrachtnemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. **Toelichting op Eis:** De Opdrachtnemer levert hiertoe documentatie aan ter onderbouwing, zoals een getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst. Als een persoon niet in loondienst is, dan een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In het geval van 0-uren, uitzend- en detacheringscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstrook en/of facturen van een detacheringsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overgelegd.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000587	zie hfst 8, paragraaf 8.4.13			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
B.1.1 V-000666	**B.1 Onze taken en verantwoordelijkheden m.b.t. WIOR-vergunningen, ontheffingen en meldingen bij bevoegde gezagen:** De WIOR-vergunning vragen wij per deelgebied (west- en oostzijde) aan, zodat wij het risico op stagnatie beperken; **Toelichting op Eis:** Wanneer 1 deel niet wordt goedgekeurd, starten we in het andere deel.						Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000694	zie par 1.2		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

| B.1.2
V-000659 | **B.1 Onze taken en verantwoordelijkheden m.b.t. WIOR-vergunningen, ontheffingen en meldingen bij bevoegde gezagen:** Wij verkrijgen de WIOR-vergunning uiterlijk drie weken voor start uitvoering.

Toelichting op Eis:
Onze omgevingsmanager past hiervoor
al jaren hetzelfde proces toe (gemiddeld 40 aanvragen per jaar) met als resultaat dat we de WIOR
vergunning altijd 3 weken voor start uitvoering verkrijgen.Het proces ziet er als volgt uit:
1. Start na voorlopige gunning: Binnen één week na voorlopige gunning starten wij met het opstellen van het BLVC-plan. In de eerste week na opdrachtverstrekking organiseren wij een overleg met hulpdiensten en de gebiedsbeheerder waarin we aanvullende eisen en wensen bespreken.
2. Presentatie BLVC-plan: In de tweede week na opdrachtverstrekking organiseren wij een overleg met u waarin wij ons BLVC-plan presenteren. We lichten onze visie en voorgestelde BLVC-maatregelen toe. We bespreken onduidelijkheden en bieden u de mogelijkheid om aanvullende wensen te uiten.
3. Interne controle: Voordat we het BLVC-plan opsturen naar Stadsdeel Noord voert onze projectleider een controle uit op het plan. Hij beoordeelt of het voldoet aan alle eisen uit het BLVC-kader.
4. Vooroverleg Stadsdeel Noord: In de derde week na opdrachtverstrekking organiseren wij een vooroverleg met Stadsdeel Noord. Hierin bespreken wij het aangevulde BLVC-plan en eventuele dillema's. Stadsdeel Noord bepaalt daarnaast of wij het BLVC-plan moeten laten toetsen door de Werkoverleg Werk in Uitvoering (WWU).
5. Aanvragen WIOR-vergunning. Na goedkeuring van Stadsdeel Noord, vragen wij de WIOR-vergunning aan. | | | | | | Documenttoets | 1 | checken of eis is opgenomen in plan | KPL - Kwaliteitsplan | 01. Projectfase | Omgevingsmanager | Afgerond |

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000687	zie par 1.2		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

| B.1.3
V-000636 | **B.1 Onze taken en verantwoordelijkheden m.b.t. WIOR-vergunningen, ontheffingen en meldingen bij bevoegde gezagen:** Werkzaamheden vallen nooit stil door ontbrekende ontheffingen.

Toelichting op Eis:
Onze projectleider vraagt de benodigde standaard ontheffingen daarom altijd minimaal 3 weken van tevoren aan. Het proces ziet er als volgt uit:
1. Inventarisatie benodigde ontheffingen: In de voorbereidingsfase inventariseert onze werkvoorbereider alle benodigde ontheffingen. Dit doet hij op basis van onze planning en werkplannen. Voor start van
iedere fase voert hij deze inventarisatie opnieuw uit.
2. Opnemen in planning: Wij nemen iedere ontheffing op in onze planning; zowel het moment van ontheffing als onze uiterste aanvraagdatum. Zo hebben wij tijdens de uitvoering zicht op komende ontheffingen.
3. Tijdig aanvraag ontheffingen: Onze werkvoorbereiding controleert wekelijks welke ontheffingen de week erop aangevraagd moeten worden. Hij stelt benodigde documenten op en vraagt de ontheffing
aan voordat de uiterste aanvraagdatum passeert.
4. Controle: Onze projectleider controleert 1 dag voor het passeren van de uiterste aanvraagdatum of de ontheffing is aangevraagd. Indien dit niet het geval is, vraagt hij naar de reden en zet acties uit om
de ontheffing alsnog tijdig aan te vragen.
Resultaat: Werkzaamheden vallen nooit stil door ontbrekende ontheffingen. | | | | | | Documenttoets | 1 | checken of eis is opgenomen in plan | KPL - Kwaliteitsplan | 01. Projectfase | Omgevingsmanager | Afgerond |

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000664	zie par 1.2		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

B.1.4 V-000641	**B.1 Onze taken en verantwoordelijkheden m.b.t. WIOR-vergunningen, ontheffingen en meldingen bij bevoegde gezagen:** Onvoorziene						Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	ontheffingen (bijv. langere werkdagen om vertraging in te lopen) vragen wij altijd binnen 1 dag, nadat we deze in beeld krijgen, aan. **Toelichting op Eis:** Voor start uitvoering heeft onze werkvoorbereider hier een format voor opgesteld. Hiermee borgt hij dat de benodigde documenten dezelfde dag gereed zijn en controleert onze projectleider deze op volledigheid.												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000669	zie par 1.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
B.1.5 V-000644	**B.1 Onze taken en verantwoordelijkheden m.b.t. WIOR-vergunningen, ontheffingen en meldingen bij bevoegde gezagen:** Impact hebbende ontwikkeling op de openbare ruimte telefonisch melden bij betreffende bevoegde gezagen. **Toelichting op Eis:** Indien een ontwikkeling (bijv. afwijkingen, klachten en opgetreden risico's) impact heeft op de openbare ruimte, het verkeersbeeld of andere zaken die de openbare orde beïnvloeden, melden wij dit dezelfde dag nog telefonisch bij de betreffende bevoegde gezagen (Stadsdeel Noord, gebiedsbeheerder, etc).						Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000672	zie par 1.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
B.2.10 V-000604	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Inzetten van projectspecifieke omgevingsapp **Toelichting op Eis:** Als modern communicatiemiddel zetten wij een projectspecifieke omgevingsapp in. Hiermee informeren we gebruikers wekelijks over hinder en fasewisselingen. Ook staat algemene projectinformatie, onze faseringsplanning en contactgegevens aangegeven. Gebruikers kunnen via de app meldingen doen en vragen stellen, indien gewenst met foto. Daarnaast beschikt de app over een tevredenheidsmonitor. Via 'Mening geven' kunnen gebruikers hun tevredenheid opgeven en onderbouwen. Indien we onze gemiddelde streefscore van een 8 niet halen, treden we in gesprek en voeren wij aanvullende maatregelen door						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000632	zie hfst 8, par. 8.4.7. en zie bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
B.2.11 V-000536	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Één week voor een nieuwe fase een informatiebrief rondsturen in de omgeving. **Toelichting op Eis:** Eén week voor een nieuwe fase start sturen wij een informatiebrief rond in de omgeving (binnen werkgebied en direct aanliggende straten). Hierin geven wij een update over het project waarin wij geplande werkzaamheden van komende weken beschrijven. Ook geven we aan welke hinder te verwachten valt en hoe wij deze beheersen. Deze informatie plaatsen wij op dat moment ook in onze app.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000564	zie hfst 8, par.8. 4.2. en zie bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
B.2.12 V-000575	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Organiseren van wekelijks inloopspreekuur.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis: Conform het BLVC-kader organiseren wij wekelijks een inloopspreekuur. Dit doen wij iedere vrijdag van 15:00 tot 17:00 uur. Onze OM is aanwezig om vragen of klachten te behandelen.												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000603	zie hfst 8, par 8.4.8. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B.2.13 V-000607	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Organiseren veiligheidsles op het SBO De Zeppelin. **Toelichting op Eis:** Onze OM organiseert op het SBO De Zeppelin een veiligheidsles. Hierin bespreekt zij spelenderwijs de veiligheidsrisico's van ons werk. Deze lessen vinden vier weken voor start uitvoering in de fase waar de school aan grenst plaats.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000635	zie hfst 8, par 8.4.10. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B.2.14 V-000542	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Omleidingsroute en rijrichting tijdens afsluitingsperiode aangeven met omleidingsborden. **Toelichting op Eis:** Met omleidingsborden op ieder kruispunt geven wij de rijrichting en omleidingsroute tijdens de afsluitingsperiode aan. Zo weten weggebruikers welke route ze moeten volgen om het werk te passeren.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000570	zie hfst 8, par. 8.4.12. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B.2.15 V-000592	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** In zetten van een Omgevingsassistent. **Toelichting op Eis:** Wij zetten een omgevingsassistent in. Dit is de rechterhand van de OM en uitvoerder. Hij is 5 dagen per week op het werk aanwezig om kleine ongemakken voor de omgeving te signaleren en te verhelpen. Hij veegt en ruimte het werkgebied dagelijks op en geeft antwoord op eventuele vragen van voorbijgangers. Hij heeft een werkjas aan met daarop een vraagteken, zodat voorbijgangers weten dat ze bij hem terecht kunnen.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000620	zie hfst 8, par 8.4.13. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B.2.5 V-000573	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Ter goedkeuring leggen van alle communicatiemiddelen **Toelichting op Eis:** Om de omgeving te doorgronden hebben we, in de tenderfase, per stakeholdergroep de belangen geïnventariseerd. Deze hebben we in onderstaande tabel samengevat en gekoppeld aan onze communicatiemiddelen. Voorafgaand aan de uitvoering leggen we alle communicatiemiddelen ter goedkeuring aan u voor. Zo houdt u grip op de wijze waarop wij communiceren met stakeholders						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000601	zie hfst 8.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B.2.6 V-000609	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Afstemmingsgesprek waarin planning, omleidingen en tijdelijke afsluitingen worden besproken met hulpdiensten, de afvalservice en de gebiedsbeheerder.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis: Binnen vier weken na opdrachtverlening bespreken we onze planning, omleidingen en tijdelijke afsluitingen met hulpdiensten, de afvalservice en de gebiedsbeheerder. Daarna hebben we 1 week voor een faseovergang contact over de wijzigende situatie. Bij afwijkingen die tot een ander verkeersbeeld leiden, informeren wij de partijen binnen één werkdag.												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000637	zie hfst 8.4.14			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

B.2.7 V-000531	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Informatiebrief vier weken voor start uitvoering sturen naar alle stakeholders met toelichting op het project, onze contactgegevens, onze omgevingsapp (zie communicatie tijdens uitvoering) en een uitnodiging voor onze omgevingsbijeenkomst **Toelichting op Eis:** Vier weken voor start uitvoering brengt onze OM een informatiebrief rond bij alle stakeholders met toelichting op het project, onze contactgegevens, onze omgevingsapp (zie communicatie tijdens uitvoering) en een uitnodiging voor onze omgevingsbijeenkomst.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000559	zie hfst 8, par 8.4.1.			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

B.2.8 V-000567	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Organiseren omgevingsbijeenkomst drie weken voor startuitvoering **Toelichting op Eis:** De omgevingsbijeenkomst organiseren wij drie weken voor start uitvoering. Hierin presenteren we het werk, onze planning en fasering en onze hinderbeperkende maatregelen. Ook kunnen bezoekers vragen of zorgen aan ons kwijt. Deze beantwoorden wij direct of koppelen wij uiterlijk binnen 3 dagen terug aan de vraagsteller. Zo hebben stakeholders een goed beeld bij het werk, maken wij zorgen bespreekbaar en nemen deze weg voordat het een klacht wordt.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000595	zie hfst 8, par 8.4.6. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

B.2.8.1 V-000632	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Twee weken voor start uitvoering houdt onze OM keukentafelgesprekken met stakeholders in de omgeving om het werk af te stemmen. **Toelichting op Eis:** Twee weken voor start uitvoering houdt onze OM keukentafelgesprekken met stakeholders in de omgeving om het werk af te stemmen. We bespreken hoe wij iedere stakeholder zo goed mogelijk bereikbaar houden, inventariseren wensen en belangen en stemmen onze werkzaamheden voor de deur nader af.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000660	zie hfst 8, par. 9.4.9. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

B.2.9 V-000554	**B.2b Communicatie met bewoners en overige stakeholders (beperken zachte hinder):** Vooraankondigingsborden langs de af te sluiten weg één week voor uitvoering. **Toelichting op Eis:** Wegafsluitingen kondigen wij één week van tevoren aan met vooraankondigingsborden langs de af te sluiten weg. Ook geven we hierop aan welke omleidingsroute er tijdens de afsluiting van kracht is.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000582	zie hfst 8, par 8.4.11. en zie bijlage 4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:*	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Ramon Wonink	
B.3.1 V-000556	**B.3 Klachtenafhandeling en terugkoppeling:** Klachtafhandeling met terugkoppeling van de klacht binnen één werkdag. **Toelichting op Eis:** Onze OM koppelt daarom iedere klacht binnen maximaal één werkdag terug aan de melder. Klachten en meldingen komen binnen via de telefoon, mail, omgevingsapp, of persoonlijk bij onze medewerkers. Voor het afhandelen van klachten volgen wij een vast proces dat wij in al onze projecten toepassen. Dit proces ziet er als volgt uit: 1. Registratie en afhandeling. Onze OM registreert de klacht/melding en kent de klacht toe aan een van de categorieën: 2. Terugkoppeling en beoordeling. Uiterlijk binnen één werkdag na ontvangst neemt onze OM (telefonisch) contact op met de melder om de wijze van afhandeling te bespreken. Binnen één week na afhandeling neemt onze OM nogmaals contact op om de tevredenheid van de indiener te meten. 3. Klachtenregister: Om te borgen dat we afspraken nakomen, maakt onze OM binnen twee werkdagen een klachtenrapportage van de voorgevallen klacht. De afhandeling voegen wij toe aan het klachtenregister en delen we met u. 4. Trendanalyse. Tweewekelijks analyseert onze OM de klachten en wensen om te bepalen of er trends zijn. Op basis hiervan stelt onze OM verbetermaatregelen op, bespreekt deze met de uitvoerder en neemt deze op in de klachtenrapportage. Zo bieden wij structurele oplossingen voor eventuele terugkomende klachten.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000584	zie hfst 8.6			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
B.4.1 V-000601	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** Bereikbaarheid en toegankelijkheid woningen. **Toelichting op Eis:** Bereikbaarheid en toegankelijkheid woningen: In onze fasering hebben wij het projectgebied opgedeeld in 2 stukken met de Pomonastraat als scheidingslijn. Zo voeren we het werk met 2 werkploegen gefaseerd uit (1 werkploeg aan iedere zijde) en behouden wij minimaal 2 ontsluitingswegen naar de wijk. Ook houden wij de wijk goed toegankelijk voor voetgangers. Dit doen wij door het trottoir zo lang mogelijk te handhaven, loopschotten te plaatsen bij opgebroken trottoir en voetgangersbruggen te leggen over huisaansluitingen. Zo passeren voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand ons werk en zijn woningen toegankelijk.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000629	zie hfst 5 par 5.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
B.4.2 V-000537	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** Ophalen vuilnis. **Toelichting op Eis:** Ophalen vuilnis: In de straat waar wij werkzaamheden verrichten, haalt onze omgevingsassistent elke ochtend om 9:00 uur vuilniszakken - die bewoners voor hun woning plaatsen - op. Hij brengt het vervolgens naar een centraal punt waar het door de afvalservice wordt opgehaald.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000565	zie hfst 5 par. 5.13			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
B.4.3 V-000593	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** Bouwverkeer max. 15km/u in de wijk. **Toelichting op Eis:** Om fysieke hinder als gevolg van geluid, stof en trillingen te beperken voeren wij luidruchtige werkzaamheden (stenen slijpen en verdichten) na 8:00u uit, rijdt al ons materieel max 15km/u in de wijk,						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	bevochtigen wij ons werk met een waterwagen en passen wij trillingsarme verdichtingsmethode toe.												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000621	zie hfst 6 par 6.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

B.4.4 V-000631	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** Max 13 parkeerplaasten onttrekken, realisatie van 20 tijdelijke parkeerplaatsen om te compenseren. **Toelichting op Eis:** Ons werkvak onttrekt maximaal 13 parkeerplaatsen. Deze parkeerplaatsen compenseren wij met 20 tijdelijke parkeerplaatsen langs de Kersenstraat (groenstrook westzijde) en de groenperken aan de oostzijde. Hiervoor plaatsen wij rijplaten op de groenperken. Onze medewerkers carpoolen met busjes die zij in onze keetlocatie parkeren.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000659	zie hfst 5 par 5.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

B.4.5 V-000552	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** transporteren - buiten het vaste team om (ons personeel, aan- en afvoer puin, stratenmakers en rioleurs) – (steen)leveranties alleen tussen 9:00-14:00u. **Toelichting op Eis:** Om verhoogde verkeersdrukte tijdens spits- en schooltijden te voorkomen en veilige loop- en fietsroutes naar SBO De Zeppelin te behouden, transporteren - buiten het vaste team om (ons personeel, aan- en afvoer puin, stratenmakers en rioleurs) – (steen)leveranties alleen tussen 9:00-14:00u. Om de veiligheid verder te borgen, voeren wij alle achterwaartse verkeersbewegingen onder begeleiding van een medewerker uit.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000580	zie hfst 5 par 5.12			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

B.4.6 V-000585	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** BLVC-checklist **Toelichting op Eis:** BLVC-checklist: Twee weken voor start uitvoering stelt onze OM op basis van onze maatregelen in het BLVC-plan, het handboek 'Zo werken wij in Amsterdam op straat' (ZWIA) en onze communicatiekalender een BLVC-checklist op. Dit is een lijst met alle beheersmaatregelen om hinder te beperken. Deze lijst zetten wij in onze verificatieapp. Onze uitvoerder of OM toetst elke dag met deze app of alle beheersmaatregelen zijn genomen. Wanneer beheersmaatregelen ontbreken of onvolledig zijn, herstellen wij dit dezelfde werkdag en voeren wij de toets opnieuw uit. De app is gelinkt aan VISI, zodat uitkomsten voor u op afstand inzichtelijk zijn.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000613	zie hfst 7 par 7.11			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

B.4.7 V-000620	**B.4 Fysieke hinderbeperking (beperking harde hinder):** Conformeren aan gedragscode Bewuste Bouwers **Toelichting op Eis:** Bewuste bouwers: Om het omgevingsbewustzijn van onze medewerkers te vergroten, geeft Bewuste Bouwers eenmalig voor start uitvoering een toolbox. Wij conformeren ons aan de gedragscode van Bewuste Bouwers. Zij toetsen tijdens de uitvoering tweemaal op willekeurige momenten, met een mistery guest, of we onze werkzaamheden op een omgevingsvriendelijke manier uitvoeren. Dit doen zij op de onderdelen: Bewust, Veilig, Milieu, Verzorgd en Sociaal. Bewuste Bouwers geeft ons een cijfer van 0 tot 10. Wij streven ernaar om op elke normkaart minimaal een 8 te scoren. Doen we dit niet, dan stelt onze projectleider binnen één week een verbeterplan op en voert dit na akkoord binnen twee dagen door. Daarnaast maken wij ook aan de omgeving zichtbaar dat wij conform Bewuste Bouwers werken. Dit doen wij door het ophangen van een						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	spandoek van Bewuste Bouwers aan onze bouwhekken waarmee wij de omgeving uitnodigen om onjuistheden te melden.												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000648	zie hfst 7 par 7.12			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

B-BH041 V-000582	**Afwijken van eisen hulpdiensten:** Indien de eisen voor de nood- en hulpdiensten niet haalbaar blijken of er een andere reden is om af te wijken van de eisen, mag dit in overleg en na akkoord van de afdeling BBA (bereikbaarheid, bluswatervoorzieningen en aanvalsplannen) van Brandweer Amsterdam. Te bereiken op: 020-5556202, 5556203 of 5556205 of wegwerkzaamheden@brandweeraa.nl. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000610	zie hfst 5 par 5.6			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

B-CN011 V-000594	**Communicatie in het BLVC plan:** Communicatie in het BLVC uitvoeringsplan Naast de technische (inhoudelijke) uitvoering van bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid rondom de werkzaamheden, speelt het aspect communicatie een belangrijke rol. Het loopt door alle aspecten heen, bundelt deze aspecten en vormt het gezicht naar buiten. Het hoofdstuk communicatie in het BLVC-plan moet voldoen aan de toetsingscriteria van de Gemeente Amsterdam. Er wordt antwoord gegeven op de volgende vragen: - Waar, wanneer, waarom wordt er gewerkt en wat merkt de omgeving ervan? - Wat is de communicatie boodschap? - Welke communicatiemiddelen worden ingezet en welke planning hoort daarbij? Dit resulteert in een communicatiemiddelenmatrix: Wat / wanneer / naar wie / door wie)? - Contactnummer van iemand ter plekke. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000622	zie hfst 8 par 8.2			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

BH010 V-000616	**Functies bereikbaar tijdens uitvoering werk:** Tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden dienen alle functies in het invloedsgebied van de Werkzaamheden bereikbaar te zijn met alle daarvoor noodzakelijke modaliteiten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000644	zie hfst 5 par 5.1			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

BH020 V-000547	**Stremming afstemmen met wegbeheerder:** Bij een onvermijdelijke stremming van een modaliteit dient het werkgebied, de omleidingsroute en het bebordingsplan vooraf te worden afgestemd met de betreffende wegbeheerder. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000575	zie hfst 5 par 5.7			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
BH030 V-000588	**Woonwijk twee ontsluitingswegen:** De woonwijk dienen ten minste twee ontsluitingswegen te hebben. Waarbij straten bij voorkeur ook 2-zijdig bereikbaar zijn. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000616	zie hfst 4 par 4.2		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH040 V-000530	**Eisen voor hulpdiensten:** Voor nood- en hulpdiensten geldt het onderstaande 1. Een rijbaanbreedte van 3,5 meter. 2. Een rijbaanbreedte van minimaal 5,5 in geval van tweerichtingsverkeer. 3. Een doorrijdhoogte van minimaal 4,20 meter (of bestaande hoogte). 4. Een bochtstraal van ten minste R7 5. Een maximale verticale helling van 7%. (ca. 12°). 6. Een toelaatbare asbelasting hebben van min. 10 ton. (VK 30) **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000558	zie hfst 5 par 5.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH050 V-000622	**Eisen tijdelijke stremming t.a.v. redvoertuigen:** In verband met het bereik van ladderwagens (redvoertuig) mag een tijdelijke stremming van een aanvalsroute voor nood- en hulpdiensten geen grotere lengte hebben dan 35 meter. De maximale afstand tussen twee opstelvakken is 35 meter. Redvoertuigen kunnen zich binnen maximaal 10 meter vanuit de gevel opstellen en hebben een opstelvlak te van minimaal 5x10 meter nodig. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000650	zie hfst 5 par 5.5		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH070 V-000612	**Gebied rond brandkraan of aansluitpunt vrijhouden:** Het gebied rondom een brandkraan of aansluitpunt dient binnen een straal van 1 meter te worden vrijgehouden, zodat tenminste: - De brandkraanbordjes zichtbaar zijn; - De aansluitingen van de droge blusleidingen vrij zijn. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000640	zie hfst 5 par 5.5		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH080 V-000526	**Toegangen bijeenkomst- en gezondheidsgebouwen vrijhouden:** Toetredingen, uitgangen en nooduitgangen van bijeenkomst- en gezondheidsgebouwen dienen vrijgehouden te worden van obstakels. De deuren van nooduitgangen dienen volledig naar buiten open te kunnen draaien. Vluchtroutes dienen vrij te zijn van obstakels. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000554	zie hfst 5 par 5.8		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
BH090 V-000570	**Woningen, winkels en voorzieningen bereikbaar voor voetgangers:** Voetgangers dienen altijd alle woningen, winkels en voorzieningen op een kwalitatief veilige wijze te bereiken. Doorgaande looproutes dienen tijdens de uitvoering geschikt te zijn voor mindervaliden en te voldoen aan de richtlijnen uit het handboek "Zo werken wij in Amsterdam op straat" (ZWIA). **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000598	zie hfst 5 par 5.4		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH100 V-000535	**Bouwverkeer (vrachtwagens) niet toegestaan tijdens spitsuren:** Bouwverkeer (vrachtwagens) is niet toegestaan op het stedelijk wegennet tijdens het hoogtepunt van de spitsuren. Die perioden zijn als volgt gedefinieerd: maandag t/m vrijdag tussen 07.30 en 09.30 en 16.30 en 18.30 uur. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000563	zie hfst 5 par 5.9		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH110 V-000586	**Bouwverkeer niet stilstaan op de Pomonastraat of de Werktuigstraat:** Bouwverkeer mag niet wachten/stilstaan op de Pomonastraat of de Werktuigstraat. Voordat de chauffeur vertrekt dient hij zich er van te vergewissen dat er voldoende plaats is op het werkterrein / bouwterrein om te laden/lossen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000614	zie hfst 5 par 5.9		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH120 V-000626	**Openbare ruimte zo kort mogelijk onttrekken aan openbaarheid:** Openbare ruimte wordt zo kort mogelijk onttrokken aan de openbaarheid. Hierbij wordt nagestreefd om onttrekkingen zoveel mogelijk in aaneengesloten perioden te laten plaatsvinden, zodat wordt voorkomen dat (verkeer)situaties frequent wijzigen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000654	zie hfst 5 par 5.10		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH130 V-000555	**Ophalen huisvuil dient doorgang te vinden tijdens uitvoering:** Het ophalen van huisvuil en bedrijfsafval door de gemeente in de omliggende straten binnen het projectgebied dient tijdens de uitvoering doorgang te kunnen vinden. Indien de reguliere ophaalplekken tijdelijk niet beschikbaar zijn, dient de Opdrachtnemer in overleg met de wegbeheerder tijdig een alternatieve locatie in te richten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000583	zie hfst 5 par 5.13		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

BH140 V-000618	**Openbare parkeerplaatsen dienen bereikbaar te zijn tijdens uitvoering:** Openbare parkeerplaatsen dienen bereikbaar te zijn. Indien						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	een openbare parkeerplaats tijdelijk opgeheven moet worden, dient de Opdrachtnemer dit tijdig met de wegbeheerder af te stemmen. **Toelichting op Eis:**												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000646	zie hfst 5 par 5.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
BH150 V-000562	**Minimaal 48 uur van tevoren aanduiden dat parkeerplaats tijdelijk wordt opgeheven:** Opdrachtnemer dient minimaal 48 uur van tevoren ter plaatse een duidelijke aanduiding aan te brengen dat een parkeerplaats tijdelijk wordt opgeheven. Vooraf dient dit verzoek ingediend te worden bij het Stadsloket. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000590	zie hfst 5 par 5.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
BH160 V-000625	**Voorzieningen van nutsvoorzieningen bereikbaar/bedienbaar houden:** Opdrachtnemer dient sifons, afsluiters, kabelmoffen en putafdekkingen van nutsvoorzieningen binnen de bouwhekken bereikbaar en/of bedienbaar te houden. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000653	zie hfst 6, paragraaf 6.4.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
BH170 V-000553	**Omleidingsroutes voor langzaam verkeer tot minimum beperken:** Omleidingsroutes voor langzaam verkeer dient tot een minimum te worden beperkt en dienen te zijn gebaseerd op de kortste route. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000581	zie hfst 5 par 5.3			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
BH180 V-000596	**Gelijk aantal alternatieve parkeerplaatsen beschikbaar stellen bij afsluiting parkeerplaatsen:** Bij het buiten gebruik stellen van parkeerplaatsen dienen minimaal een gelijk aantal alternatieve parkeerplaatsen ter beschikking te worden gesteld. Voor mindervaliden op maximaal 75 meter van de woning. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000624	zie hfst 5 par 5.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
B-KL100.1 V-000643	**5.5.1 Algemeen:** Definities in het kader van deze paragraaf. *Kabels en Leidingen Gemeente Amsterdam: Alle kabels en leidingen die in beheer zijn of komen bij de Gemeente Amsterdam. *Kabels en Leidingen Derden: Alle kabels en leidingen die niet in beheer zijn bij de Gemeente Amsterdam. *Kabels en Leidingen Derden Categorie 1: De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I (Vergunningen etc.), tabel 1. Deze zijn reeds aangepast/aangelegd vóór de datum van opdracht of mogen niet worden aangepast.		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	*Kabels en Leidingen Derden Categorie 2: De Kabels en Leidingen Derden opgenomen in annex I (Vergunningen etc.), tabel 2. Hiervoor heeft de Opdrachtgever met de kabel- en leidingbeheerders vóór de datum van opdracht afspraken gemaakt over minimaal de technische oplossing en doorlooptijden. Tijdens het verrichten van de Werkzaamheden zullen deze kabels en leidingen moeten worden aangepast/aangelegd. *Kabels en Leidingen Derden Categorie 3: De Kabels en Leidingen Derden die niet behoren tot de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 of 2. Hiervoor dient de Opdrachtnemer namens de Opdrachtgever alle afspraken met de kabel- en leidingbeheerders te maken. **Toelichting op Eis:**											
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000671	zie hfdst 9			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B-KL100.2 V-000640	**5.5.1 Algemeen:** *Wenstracéprodure: Binnen de gemeente Amsterdam gehanteerde procedure zoals bepaald in de [WIOR] en [Nadere regels WIOR]. De wenstracéprocedure heeft twee doelen: 1. Het informeren van de betrokken kabel- en leidingbeheerders over de voorgenomen plannen. 2. Het verkrijgen van een inventarisatie van de door deze kabel- en leidingbeheerders uit te voeren werkzaamheden met betrekking tot kabels en leidingen (wenstracés). De wenstracéprocedure heeft formeel een doorlooptijd van 12 maanden voor de uitvoering van een project worden gestart. In totaal neemt de procedure tot opstellen DTA 18 weken in beslag, waarna de kabel- en leidingbeheerders de voorbereiding van de werkzaamheden opstarten. *DTA (Definitief Tracé Akkoord): Een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een kabel- en leidingbeheerder over de aanleg, verlegging, de verwijdering of de permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden. Tevens is een DTA een verzoek tot het nemen van maatregelen in het kader van de Telecomwet. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000668	zie hfst 9.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B-KL101 V-000638	**5.5.1 Algemeen:** De Opdrachtgever heeft bij aanvang van de opdracht de volgende stappen afgerond: Stap 1a. aanvraag wenstracé Stap 1b. reactietermijn kabel- en leiding beheerders aanvraag wenstracé Stap 3a. akkoord wenstracé Stap 3b. reactietermijn kabel- en leiding beheerders akkoord wenstracé Stap 4. Definitief Tracé Akkoord **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000666	zie hfst 9 par 9.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B-KL240 V-000668	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** De werkzaamheden voor de bescherming van de Kabels en Leidingen Derden komen voor rekening van de Opdrachtnemer. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000696	zie hfst 9 en par 9.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
B-KL340 V-000650	**5.5.3 Leveren gegevens kabels en leidingen:** De Opdrachtnemer dient op de te verstrekken liggingsgegevens (conform de WION) eveneens de		KL320				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	buiten functie gestelde Kabels en Leidingen alsook de verwijderde Kabels en Leidingen te registreren. **Toelichting op Eis:**												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000678	zie hfst 9 en par 9.5			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
B-KL720 V-000675	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** Indien de Opdrachtnemer ondanks voldoende inspanningen niet tot een akkoord met de kabel- of leiding beheerder kan komen, dan kan hij om assistentie van de Opdrachtgever vragen. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000703	zie hfst 9 par 9.6			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
B-LH012 V-000576	**Geluid en trillingen monitoren tijdens uitvoering:** Tijdens de uitvoering dienen geluid en trillingen te worden gemonitord. In het contract wordt aangegeven aan welke eisen deze opname en monitoring moet voldoen. In algemene zin dient de opdrachtnemer te voldoen aan vigerende wet- en regelgeving of, indien strikter, Amsterdams beleid. Indien men voornemens is af te wijken van de wet- en regelgeving zal een ontheffing op het Bouwbesluit 2012 aangevraagd moeten worden. De aanvraag dient tijdig (6 weken voor aanvang van de werkzaamheden) ingediend te worden. Het College van burgemeester en wethouders, voor deze het dagelijks bestuur van het stadsdeel, kan eisen stellen met betrekking tot maximale geluidbelasting en desgewenst een prognose onderzoek en/of geluidmetingen eisen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000604	zie hfst 6 en par 6.2			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
B-OM020 V-000661	**4 Omgevingsmanagement (OM):** Onder hinder wordt verstaan: een negatieve beïnvloeding van de bereikbaarheid, leefbaarheid en/of veiligheid voor de omgeving. **Toelichting op Eis:**		OM010				Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000689	zie inleiding hfst. 1			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
B-UP052 V-000649	**Werken conform WIOR vergunning:** De Gemeente Amsterdam heeft verordonneerd dat eenieder die werkzaamheden uitvoert in de openbare ruimte een WIOR-vergunning (werken in de openbare ruimte) moet aanvragen. Hiervoor dient de Opdrachtnemer te voldoen aan de voorwaarden in de WIOR-vergunning. Zie: https://www.amsterdam.nl/ondernemen/vergunningen/ Om een WIOR-vergunning aan te kunnen vragen is een goedgekeurd BLVC-uitvoeringsplan nodig. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000677	zie hfst 1.2			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
B-UP053 V-000655	**Proces vaststelling BLVC-uitvoeringsplan en WIOR vergunningaanvraag:** Het proces om tot vaststelling van het BLVC-uitvoeringsplan te komen en een WIOR vergunning aan te vragen ziet er als volgt uit: 1. Opdrachtnemer bespreekt het concept BLVC-uitvoeringsplan met de Opdrachtgever. 2. Opdrachtnemer brengt het in het bovenstaande overleg aangepaste concept BLVC-uitvoeringsplan in het WIOR-vooroverleg van het Stadsdeel (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/overleggen/vooroverleg/) Tijdens dit overleg geeft de Opdrachtnemer een toelichting op het BLVC-uitvoeringsplan en bespreekt eventuele dilemma's. 3. Als er Werkzaamheden worden uitgevoerd op/aan een hoofdnet, brengt de Opdrachtnemer het op het bovenstaande overleg aangepaste concept BLVC-uitvoeringsplan in de Werkgroep werk in Uitvoering (WWU) (https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/organisatie/overige/coordinatiestelsel/overleggen/wwu/). 4. Na akkoord van het WIOR-vooroverleg of resp. de WWU dient Opdrachtnemer de WIOR-vergunning aan te vragen. https://formulieren.amsterdam.nl/TriplEforms/LoketAmsterdam/formulier/nl-NL/evDIVV/scWIOR.aspx/flnleiding **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000683	zie hfst 1 par 1.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

B-VH101 V-000561	**Afwegingen type hekken aangeven:** Het zicht rondom het projectgebied kan door het plaatsen van afzettingen worden verminderd. De wijze van afzetten (een open, dicht, hoog of laag hek), de locaties waar het werkterrein in- en uitgereden wordt zijn zaken die van invloed zijn op de veiligheid en leefbaarheid van het projectgebied. De opdrachtnemer dient helder aan te geven waarom gekozen wordt voor een hoog of laag hek en/of waarom eventueel afgeweken wordt van een dicht hek (geredeneerd vanuit veiligheid, functionaliteit, leefbaarheid). **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000589	zie hfst 6 par 6.5			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

CN010 V-000534	**Communicatie uitvoeren zodat omgeving op de hoogte is:** De communicatie dient zodanig te worden uitgevoerd, dat de omgeving tijdig op de hoogte is van de (reden van de) uit te voeren werkzaamheden, de duur, de tijdelijke maatregelen die genomen worden en de gevolgen van de werkzaamheden. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000562	zie hfst 8, par 8.4.1 en 8.4.2 en bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

CN020 V-000523	**Opdrachtnemer zorgt voor eerste aanspreekpunt:** De Opdrachtnemer zorgt voor een eerste aanspreekpunt voor de omgevingsmanager van de Opdrachtgever. Deze persoon is dagelijks te bereiken voor vragen en opmerkingen vanuit de Opdrachtgever. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000551	zie hfst 8, par 8.1.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

CN030 V-000564	**Gemeente Amsterdam is afzender van alle communicatie:** Alle communicatie-uitingen naar omwonenden, externe professionele stakeholders en de pers is de gemeente Amsterdam de afzender.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor omgevingsmanagement inclusief externe communicatie en voert regie over de communicatie naar buiten. **Toelichting op Eis:**												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000592	zie hfst 8, par 8.1.1			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN040 V-000603	**Opdrachtgever periodiek van informatie voorzien:** De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever periodiek en tijdig van alle relevante informatie (omtrent het project, voortgang, planning, fasering, omleidingen, verwachte overlast) te voorzien, zodat er voldoende gelegenheid is om de doelgroepen tijdig te informeren. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000631	zie hfst 8, par 8.1.2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN050 V-000551	**Communicatiekalender opstellen:** De Opdrachtgever stelt samen met de Opdrachtnemer een communicatiekalender op. In de communicatiekalender staat wat, wanneer en op welke manier (met welke communicatiemiddelen) aan de omgeving wordt verteld over de uitvoering van het project. Op basis hiervan wordt ook inzichtelijk voor de aannemer wat 'tijdig aanleveren van informatie' is. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000579	zie hfst 8 par 8.5			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN060 V-000599	**Niet toegestaan om zelf communicatiemiddelen of informatie verspreiden of publiceren zonder expliciete toestemming van opdrachtgever:** Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan zelf communicatiemiddelen of informatie (inclusief publicaties in vakbladen, beeldmateriaal zoals foto's en perscontacten) betreffende de werkzaamheden, alsmede de binnen het werkterrein gelegen objecten te verspreiden of te publiceren, zonder expliciete toestemming van de Opdrachtgever. Evenmin mag de Opdrachtnemer zelf evenementen organiseren in of rond de bouwplaats, zonder expliciete toestemming van de Opdrachtgever. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000627	zie hfst 8, par 8.4.15 en 8.4.16			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN070 V-000539	**Opdrachtnemer houdt klachtenregister bij:** De Opdrachtnemer houdt gedurende de uitvoering van het werk een klachtenregister bij. Hierin worden alle klachten over de werkzaamheden opgenomen en geregistreerd, alsmede aangegeven hoe en wanneer met de klacht wordt omgegaan in relatie tot de oplossing van de klacht. De Opdrachtgever dient op de hoogte gehouden te worden over de klachten die binnenkomen, maar de verantwoordelijkheid ligt bij de Opdrachtnemer. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000567	zie hfst 8 par 8.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
CN080 V-000581	**Binnen twee dagen terugkoppeling geven op opvolging van klachten:** De Opdrachtnemer dient uiterlijk binnen twee werkdagen Opdrachtgever te laten weten welke maatregelen worden getroffen en houdt Opdrachtgever op de hoogte van de actuele vorderingen omtrent het verhelpen van een klacht. Opdrachtnemer dient de terugkoppeling naar de melder te verzorgen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000609	zie hfst 8 par 8.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN090 V-000623	**Opdrachtnemer tijdens en buiten werkzaamheden 24/7 telefonisch bereikbaar, tijdens uitvoeringswerkzaamheden aanspreekbaar persoon aanwezig:** De Opdrachtnemer dient zowel tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden als daarbuiten 24/7 telefonisch bereikbaar te zijn. Tevens dient de Opdrachtnemer ervoor te zorgen dat er tijdens de Uitvoeringswerkzaamheden op de bouwplaats een voor derden aanspreekbaar persoon aanwezig is. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000651	zie hfst 8, par 8.4.17 en bijlage 1			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN100 V-000560	**Wekelijks inloopspreekuur faciliteren:** De Opdrachtnemer dient wekelijks een inloopspreekuur te faciliteren en te bemensen voor bewoners en andere belanghebbenden. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000588	zie hfst 8, pragraaf 8.4.8. en zie bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN110 V-000600	**Bewoners en andere belanghebbenden op de hoogte brengen van activiteiten:** De Opdrachtnemer dient voor en tijdens de uitvoering bewoners en andere belanghebbenden op de hoogte te brengen van de activiteiten en de te verwachten overlast. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000628	zie hfst 8, par 8.4.1. en zie bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN120 V-000528	**Werkzaamheden aan huisaansluitingen vier weken van tevoren melden:** Werkzaamheden aan huisaansluitingen dienen minimaal vier weken van tevoren schriftelijk te worden aangekondigd en vervolgens vijf dagen van tevoren schriftelijk bevestigd te worden aan de betreffende bewoner. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000556	zie hfst 8, par 8.4.5. en zie bijlage 4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
CN130 V-000571	**Twee werkplekken voor opdrachtgever faciliteren:** De Opdrachtnemer dient twee werkplekken voor Opdrachtgever te faciliteren en per werkplek te						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

KWS

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	voorzien van bureau met bureaustoel, beeldscherm, verwarming, elektriciteit en Wifi. **Toelichting op Eis:**												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000599	zie hfst 8, par 8.4.18			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

KL010 V-000645	**5.5 Leggen en verleggen kabels en leidingen (KL):** De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen of verleggen van kabels en leidingen te coördineren dan wel te verrichten, zodanig dat de functies van kabels en leidingen ongestoord in stand worden gehouden en de voortgang van de Werkzaamheden niet wordt belemmerd. Hieronder kunnen vallen de coördinatie van de Werkzaamheden van (voorgeschreven) zelfstandige hulppersonen en nevenopdrachtnemers. **Toelichting op Eis:**		OM010	B-KL100.1 | B-KL100.2 | B-KL101 | KL110 | KL120 | KL130 | KL140 | KL200 | KL320 | KL500 | KL600 | KL630 | KL800			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000673	zie hfst 9 par. 9.1			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

KL110 V-000634	**5.5.1 Algemeen:** De Opdrachtnemer dient de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen, verleggen of uitnemen van kabels en leidingen te verrichten overeenkomstig de bepalingen in de [WIOR] en [Nadere regels WIOR]. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000662	zie hfst 9 par 9.4			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

KL120 V-000676	**5.5.1 Algemeen:** De Opdrachtnemer dient de kosten ten behoeve van BLVC-maatregelen met de betrokken kabel- en leidingbeheerders te verrekenen, conform de [WIOR] en [Nadere regels WIOR]. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000704	zie hfst 9 par 9.4			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

KL130 V-000674	**5.5.1 Algemeen:** De Opdrachtnemer dient in verband met de in eis KL010 benoemde Werkzaamheden, het vooraf openbreken en na het voltooien van deze Werkzaamheden, het herstellen van het maaiveld te verzorgen. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000702	zie hfst 9 par 9.1			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

KL140 V-000670	**5.5.1 Algemeen:** Tekeningen die in het kader de onder eis KL010 genoemde Werkzaamheden worden opgesteld dienen getekend te worden conform de NLCS en de lijnstijlen die aan aanvullend op de NLCS worden zijn meegeleverd.		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis:												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000698	zie hfst 9 par 9.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL200 V-000665	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** De Opdrachtnemer dient te zorgen voor de ongestoorde instandhouding van alle kabels en leidingen tijdens het verrichten van de Werkzaamheden, behoudens voor zover met kabel- en leidingbeheerders anders is overeengekomen. Hiertoe behoort het in acht nemen van de (veiligheids)voorschriften van onder andere de kabel- en leidingbeheerders. **Toelichting op Eis:**		KL010	B-KL240 | KL210 | KL220 | KL230 | KL250 | Kl260			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000693	zie hfst 9 par 9.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL210 V-000663	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te verrichten conform de CROW-publicatie 500, "Richtlijn zorgvuldig graafproces" en de WIBON. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000691	zie hfst 9 par 9.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL220 V-000660	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** De Opdrachtnemer dient voorafgaand aan de Uitvoeringswerkzaamheden een detectie naar de ligging van kritische of risicovolle kabels en leidingen uit te voeren met inachtneming van het bepaalde in CROW-publicatie 500 Schade voorkomen aan kabels en leidingen, waarbij de wijze van detectie afhankelijk van de eisen die de locatie met zich meebrengt. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000688	zie hfst 9 par 9.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL230 V-000656	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** Indien de Opdrachtnemer bij het verrichten van de Werkzaamheden een kabel of leiding beschadigt, dient de Opdrachtnemer dit terstond te melden aan de betrokken kabel- of leidingbeheerder en de Opdrachtgever. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000684	zie hfst 9 par 9.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL250 V-000654	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** Indien tijdelijke bescherming van een kabel of leiding noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden, dient de Opdrachtnemer de noodzakelijke maatregelen te nemen. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000682	zie hfst 9 par 9.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:*	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Ramon Wonink	
KI260 V-000652	**5.5.2 Instandhouden en beschermen:** De Opdrachtnemer dient van de kabel- of leiding beheerder instemming met de te nemen maatregelen te verkrijgen, aanvullend op de maatregelen zoals is omschreven in de DTA en VSE. **Toelichting op Eis:**		KL200				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000680	zie hfst 9 par 9.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL320 V-000647	**5.5.3 Leveren gegevens kabels en leidingen:** Indien kabels en leidingen waarvan Waternet beheerder wordt of is, worden gelegd of verlegd, uitgenomen of buiten dienst gesteld, dient de Opdrachtnemer uiterlijk 30 dagen voor de geplande aanvangsdatum aan de beheerder de geplande leggingsgegevens met betrekking tot de betreffende kabels en leidingen te verstrekken. **Toelichting op Eis:**		KL010	B-KL340 | KL330			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000675	zie hfst 9 par 9.5			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL330 V-000646	**5.5.3 Leveren gegevens kabels en leidingen:** De Opdrachtnemer dient uiterlijk 15 dagen na voltooiing van de Werkzaamheden met betrekking tot het leggen, verleggen, uitnemen of buiten dienst stellen van kabels en leidingen, in (toekomstig) beheer bij Waternet, de liggingsgegevens aan de beheerder te verstrekken. Deze gegevens dienen te voldoen aan onderstaande kenmerken: 1. Zie [Aanvullende bepalingen Waternet]. **Toelichting op Eis:**		KL320				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000674	zie hfst 9 par 9.5			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL500 V-000642	**5.5.4 Handhaven Kabels en Leidingen Derden Categorie 1:** De Opdrachtnemer dient de ligging van de Kabels en Leidingen Derden Categorie 1 te handhaven. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000670	zie hfst 9 par 9.6			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
KL600 V-000639	**5.5.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2:** De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van zijn Werkzaamheden de afspraken in acht te nemen die de Opdrachtgever heeft gemaakt met betrekking tot de verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de Kabels en Leidingen Derden (Categorie 2), zoals omschreven in de geproduceerde wenstracé producten en bijbehorende correspondentie. **Toelichting op Eis:**		KL010	KL610			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000667	zie hfst 9 par 9.6			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
KL610 V-000637	**5.5.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2:** De Opdrachtnemer dient nadere afspraken te maken met de kabel- en leidingbeheerders en de gebiedsbeheerder van Stadsdeel Noord. Dit overleg moet leiden tot het verkrijgen van een akkoordverklaring door kabel- en leidingbeheerders. **Toelichting op Eis:**		KL600				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000665	zie hfst 9 par 9.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
KL630 V-000678	**5.5.5 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 2:** De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met degenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 2 feitelijk (ver)leggen, verwijderen of permanent beschermen. **Toelichting op Eis:**		KL010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000706	zie hfst 9 par 9.1			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
KL700 V-000673	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** Indien verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is in verband met de Werkzaamheden of de daaruit resulterende beheersituatie, dient de Opdrachtnemer tijdig het proces daartoe op te starten, conform de [WIOR] en [Nadere regels WIOR]. De uiteindelijke afspraken zullen door de Opdrachtgever worden verwerkt in een DTA (wijziging). **Toelichting op Eis:**			B-KL720 | KL705 | KL710 | KL730 | KL740 | KL750 | KL770			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000701	zie hfst 9 par 9.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
KL705 V-000669	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** Bij het vormgeven en het maken van de afweging van de wijze waarop de in eis KL700 benoemde verlegging, verwijdering of permanente bescherming van de kabel of leiding zal worden uitgevoerd, dienen als doorslaggevende criteria te worden aangehouden: 1. het beperken van de maatschappelijke kosten en; 2. het op conventionele wijze kunnen uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de kabel- en leidingenassets. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000697	zie hfst 9 par 9.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
KL710 V-000667	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** De Opdrachtnemer dient tijdig en namens de Opdrachtgever overeenstemming te bereiken met de betrokken kabel- of leiding beheerders over de inhoud van de DTA wijziging. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000695	zie hfst 9 par 9.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
KL730 V-000664	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** De DTA wijziging dient te voldoen aan de volgende voorwaarden: 1. ze zijn in overeenstemming met [WIOR] en [Nadere regels WIOR]; 2. de technische oplossing behartigt de belangen van de betreffende beheerders. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000692	zie hfst 9 par 9.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

KL740 V-000662	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** De door de Opdrachtgever op basis van de DTA (wijziging) aan de kabel- of leidingbeheerder betaalde voorlopige en definitieve vergoedingen met betrekking tot een Kabel of Leiding Derden Categorie 3, komen voor rekening van de Opdrachtnemer en dienen door de Opdrachtnemer op eerste verzoek aan de Opdrachtgever te worden betaald. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000690	zie hfst 9 par 9.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

KL750 V-000657	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** De Opdrachtnemer mag niet eerder beginnen met Werkzaamheden waarvoor een verlegging, verwijdering of permanente bescherming van een Kabel of Leiding Derden Categorie 3 noodzakelijk is, dan nadat daarvoor een (gewijzigde) DTA is verstuurd . Afhankelijk van de wijziging zal overeenstemming moeten zijn met de kabel- en leiding beheerders over de benodigde voorbereidingstijd. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000685	zie hfst 9 par 9.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

KL770 V-000653	**5.5.6 Afstemmen Kabels en Leidingen Derden Categorie 3:** De Opdrachtnemer dient het verrichten van de Werkzaamheden af te stemmen met diegenen die de Kabels en Leidingen Derden Categorie 3 feitelijk verleggen, verwijderen of permanent beschermen. **Toelichting op Eis:**		KL700				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000681	zie hfst 9 par 9.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

KL800 V-000651	**5.5.7 Beheerderspecifieke eisen K&L:** Met betrekking tot de objecten van Watermet dient de Opdrachtnemer aanvullend de beheerderspecifieke eisen aan te houden. **Toelichting op Eis:**		KL010	KL810			Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000679	zie hfst 9 par 9.5		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
KL810 V-000635	**5.5.7 Beheerderspecifieke eisen K&L:** De beheerderspecifieke eisen zijn opgenomen in [Aanvullende bepalingen Waternet] **Toelichting op Eis:**		KL800				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000663	zie hfst 9 par 9.5			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

LH010 V-000532	**Werkzaamheden uitvoeren met beperking hinder:** Opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden zodanig uit te voeren dat de hinder voor de omgeving beperkt wordt. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000560	zie hfst 6			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

LH020 V-000613	**Geluidsreducerende maatregelen toepassen:** Opdrachtnemer dient aan te tonen dat hij alle eenvoudig toepasbare en betaalbare mogelijkheden t.b.v. geluid reducerende maatregelen heeft onderzocht en toegepast. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000641	zie hfst 6 par 6.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

LH030 V-000544	**Bouwverlichting niet richten op omgeving:** Bouwverlichting mag niet worden gericht op: de openbare weg, gebouwen of woningen en voorzieningen in de omgeving van de bouwplaats. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000572	zie hfst 6 par 6.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

LH040 V-000543	**Bouw- en werkterrein dagelijks opruimen:** Het bouw- en werkterrein moet netjes en schoon zijn en dagelijks te worden opgeruimd. Opdrachtnemer dient verspreiding van (opwaaiende) materialen en bodem- en stofdeeltjes vanaf het werkterrein te minimaliseren/voorkomen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000571	zie hfst 6, par 6.4.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

LH050 V-000587	**Schoon bouwmaterieel dat bouwplaats verlaat:** Het bouwmaterieel dat het werkterrein verlaat dient schoon te zijn, zodat het de openbare ruimte niet vervuild. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000615	zie hfst 6, par 6.4.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
LH060 V-000628	**Emissiereducerende maatregelen toepassen:** Opdrachtnemer dient aan te kunnen tonen dat hij alle eenvoudig toepasbare en betaalbare mogelijkheden t.b.v. emissie reducerende maatregelen heeft onderzocht en toegepast bij de aan- en afvoer van materialen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000656	zie hfst 6, par 6.6		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	

LH070 V-000557	**Werkzaamheden zo snel mogelijk afronden, werkbare uren:** Het Amsterdamse college van B&W wenst dat werkzaamheden zo snel mogelijk worden afgerond, uiteraard rekening houdend met de leefbaarheid voor de omgeving. De Opdrachtnemer mag van ma t/m za van 7.00 – 19.00 uur werken. Voor werkzaamheden buiten de periode van 07.00 tot 19.00 uur (reguliere werktijden) is een ontheffing nodig. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000585	zie hfst 6 par 6.1		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	

LH080 V-000595	**Bouwhekken voorwaarden:** De Opdrachtnemer dient bouwhekken toe te passen die aan de volgende voorwaarden voldoen: - Bouwhekken hebben een hoogwaardige uitstraling; - Bouwhekken zijn afgestemd op de omgeving; - Bouwhekken zijn minimaal halfdicht; - Bouwhekken geven geen ruimtebeperking aan openbare zijde; - Aan bouwhekken kunnen geen fietsen worden bevestigd; - Bouwhekken mogen geen uitstekende onderdelen bevatten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000623	zie hfst 6, paragraaf 6.5.1		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	

LH090 V-000525	**Locatie bouwhekken:** De Opdrachtnemer dient bouwhekken zodanig te plaatsen dat de bouwafscheiding aan de volgende voorwaarde voldoet: - De bouwhekken staan in een rechte lijn - De bouwhekken zijn onderling gekoppeld - De bouwhekken blokkeren niet het zicht tussen de verkeersdeelnemers - Bouwhekken worden zodanig geplaatst dat er geen nissen en onoverzichtelijke hoeken ontstaan. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Verificatietaak:	Verwijzing en onderbouwing	Afwijkingen	Bewijs			Uitgevoerd door:	Oordeel:
VT-000553	zie hfst 6, paragraaf 6.5.2		Document(en):	Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
			TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan	1.0 2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	

LH100 V-000568	**Uitingen bouwhekken:** Uitingen op de bouwhekken zijn niet toegestaan anders dan bij onvindbaarheid / onzichtbaarheid van ondernemingen. Uitingen op de bouwhekken dienen altijd ter akkoord voorgelegd te worden aan de Opdrachtgever.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis:												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000596	zie hfst 6, paragraaf 6.5.3			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
LH110 V-000608	**Materiaal en materieel binnen bouwhekken opslaan:** De Opdrachtnemer dient materiaal en materieel binnen de afzetting van het werkterrein (tijdelijk) op te slaan. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan materiaal tegen de bouwhekken op te slaan. Materiaal dient minimaal 1 meter uit de bouwhekken te worden opgeslagen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000636	zie hfst 6, paragraaf 6.4.2			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
LH120 V-000540	**Na gereedkomen werk rapportage met foto's maken voor overdracht naar gemeente Amsterdam:** Na het gereedkomen van het werk dient de uitvoerende partij het gebied dat tijdelijk uit verkeer genomen is weer over te dragen aan de Gemeente Amsterdam en dit schriftelijk vast te leggen in een rapportage ondersteund met foto's (eindmeting). **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000568	zie hfst 6 par 6.8			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
LH130 V-000579	**Onderhouden afzettingen:** De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhouden van alle afzettingen en tijdelijke verkeersmaatregelen op en rondom het werkterrein. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000607	zie hfst 6, par 6.4.3			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
LH150 V-000621	**Onttrekking is aaneengesloten periode:** Een onttrekking dient een aaneengesloten periode te zijn waarin alle werkzaamheden plaatsvinden. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000649	zie hfst 6, par 6.4.3			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		
LH160 V-000615	**Maatregelen treffen tegen geluidsproductie van materieel binnen werkterrein:** Te behoeve van het gebruik van materieel binnen de begrenzing van het bouwterrein dienen technische en/of organisatorische maatregelen getroffen te worden om de geluidproductie van de stationaire en mobiele installaties te beperken. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000643	zie hfst 6 par 6.2			Document(en):						Revisie(s):	Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:*	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan						1.0	2019-09-27 2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Ramon Wonink	
LH170 V-000545	**Verhuizingen en verbouwingen mogelijk:** Verhuizingen en verbouwingen dienen mogelijk te blijven c.q. gefaciliteerd te worden. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000573	zie hfst 6 par 6.9			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
LH180 V-000584	**Geen tegengesteld verkeer in eenrichting straten:** In smalle straten en straten met eenrichtingsverkeer is geen tegengesteld verkeer toegestaan. De definitie van smalle straten luidt: Een smalle straat is een straat met een rijbaanbreedte tot 4,25 meter. Dit heeft een relatie met tegengesteld gemotoriseerd verkeer. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000612	zie hfst 5 par 5.11			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
LH190 V-000524	**Aantal uren dat geen gebruik kan worden gemaakt van nutsvoorzieningen en riool zoveel mogelijk beperken:** Het aantal uren dat bewoners geen gebruik kunnen maken van de vuilwaterafvoer, de gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen dient zoveel mogelijk te worden beperkt. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000552	zie hfst 6, paragraaf 6.4.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
OM010 V-000672	**4 Omgevingsmanagement (OM):** De Opdrachtnemer dient zijn Werkzaamheden te managen (plannen, organiseren, bewaken, beheersen, rapporteren en corrigeren), zodanig dat het Werk wordt gerealiseerd met minimale hinder voor de omgeving en optimaal past in zijn omgeving, conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen. **Toelichting op Eis:**		PM010	AW010 | B-OM020 | FF010 | KL010 | NE010 | OM030 | OM100 | VE010			Documenttoets	1	checken of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000700	zie hfst 6			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
OM030 V-000671	**4 Omgevingsmanagement (OM):** De Opdrachtnemer dient als sleutelfunctionaris een omgevingsmanager aan te stellen, die voldoet aan de eisen gesteld in bijlage 'Eisen aan zelfstandige hulppersonen en sleutelfunctionarissen' bij deze Vraagspecificatie Proces. **Toelichting op Eis:**		OM010				Documenttoets	1	Check of eis is opgenomen in plan	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000699	Bijlage 1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
OM100 V-000577	**4.1 Voldoen aan BLVC-kader (OM):** De Opdrachtnemer dient te voldoen aan de eisen in hoofdstuk 3 van het BLVC-Kader Tuindorp Oostzaan.		OM010				Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis:												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000605	zie hfst 1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
UP010 V-000580	**BLVC-Uitvoeringsplan ter kennis brengen:** Opdrachtnemer dient een BLVC-Uitvoeringsplan ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000608	zie hfst 1 par 1.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
UP020 V-000549	**BLVC-Uitvoeringsplan nadere uitwerking van eisen:** Het BLVC-Uitvoeringsplan dient een nadere uitwerking te zijn van de BLVC-eisen in dit BLVC-kader en de Aanbieding. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000577	zie hfst 1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
UP030 V-000610	**BLVC-Uitvoeringsplan beschrijving inhoud hoofdlijnen:** In het BLVC-uitvoeringsplan dient ondubbelzinnig te zijn beschreven waar, wanneer en hoe er gewerkt wordt en welke maatregelen getroffen worden om de hinder voor de omgeving te beperken en de bereikbaarheid van alle aanwezige modaliteiten te borgen (zoals voetganger, brommer, fiets, taxi, auto, laden en lossen, openbaar vervoer). **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000638	zie hfst 1 par 1.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
UP040 V-000546	**BLVC-Uitvoeringsplan beschrijving inhoud specifiek:** Het BLVC-uitvoeringsplan dient te bestaan uit de volgende zaken: 1. Uitvoeringsplan 2. Faseringstekeningen 3. Omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen 4. Bouwplanning. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000574	zie hfst 1en bijlage 8			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
UP050 V-000590	**BLVC-Uitvoeringsplan beschrijving onderdelen:** Het uitvoeringsplan dient uit ten minste de volgende onderdelen te bestaan: 1. Inleiding (aanleiding, doel, leeswijzer) 2. Projectbeschrijving (wat) 3. Omgevingsanalyse (waar / wie) 4. Toelichting fasering in woord en beeld (Hoe: dit is de kern van het BLVC-uitvoeringsplan) a. Een beschrijving van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden; b. Een toelichting per fase wat de impact is voor de omgeving met betrekking tot bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid en de maatregelen die de Opdrachtnemer treft om te voldoen aan de in dit BLVC-kader gestelde eisen. Bij het bepalen van de BLVC-maatregelen en bij de uitvoering zelf dienen ook de uitvoeringsvoorschriften van de netbeheerders in acht worden genomen. De beschrijving in dit onderdeel dient samen te hangen met, en						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	te worden ondersteund door de in eis UP051 beschreven de faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen. c. De te verwachten hinder, in de vorm van een 'hinderkalender'. 5. Communicatieparagraaf met een communicatie middelenmatrix (wat / wanneer / naar wie / door wie). 6. Contactpersonenoverzicht (naam / rol / email / telefoonnummer). **Toelichting op Eis:**												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000618	zie hfst 1 par 1.3 (hier staat aangegeven waar in welk hoofdstuk wat staat beschreven).			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
UP051 V-000629	**BLVC-Uitvoeringsplan tekeningen eisen:** De faserings-, omleidings-, bebordings- en bebakeningstekeningen dienen aan de volgende eisen te voldoen: 1. Elke tekening dient één fase en/of aanpassing van de verkeerssituatie te bevatten. 2. Uit de tekeningen dient ondubbelzinnig de verkeerssituatie af te lezen te zijn. 3. De locatie van het werkterrein inclusief alle onttrekkingen van de openbare ruimte dienen te zijn weergegeven. 4. De bouwrouting (vanaf de autoweg) naar/binnen het projectgebied en de routes van de overige modaliteiten (fietsers, bestemmingsverkeer, nood- en hulpdiensten enz.) dienen te zijn aangegeven. 5. De bouwplaatsinrichting (bouwketen/opslag) dient te zijn aangegeven. 6. Per fase blijkt op welke locatie de Opdrachtnemer en eventuele derden (die door Opdrachtnemer gecoördineerd worden) werkzaamheden uitvoeren. 7. Voor locaties die kritisch zijn met betrekking tot bereikbaarheid of veiligheid dienen dwarsprofielen te zijn opgenomen in de tekeningen. 8. De tekeningen dienen tenminste voorzien te zijn van een stempel van het bedrijf, een status van de tekening, datum, handtekening/paraaf, een schaalindeling en te zijn gerefereerd aan een vast en bekend punt. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000657	zie hfst 4 par 4.1, bijlage 2			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH010 V-000565	**Veiligheid maximaliseren:** De Opdrachtnemer dient er alles aan te doen om de veiligheid gerelateerd aan de werkzaamheden te maximaliseren. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000593	zie hfst 7			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH020 V-000602	**Tijdelijke situatie voldoen aan veiligheidseisen:** De tijdelijke situatie dient te voldoen aan de veiligheidseisen, zowel voor de werknemers als voor de bewoners en overige verkeersdeelnemers. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000630	zie hfst 7			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH020-01 V-000529	**Tijdelijke verkeersmaatregelen eenduidig en helder en conform de CROW:** Tijdelijke verkeersmaatregelen dienen eenduidig en helder te zijn en te voldoen aan de passende situatie conform de richtlijnen uit de CROW-publicatiereeks Werk in uitvoering 96B.						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
	Toelichting op Eis:												
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000557	zie hfst 7 en par 7.1			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
VH030 V-000572	**Vervuiling of beschadiging door ON buiten werkterrein op eigen kosten repareren:** De Opdrachtnemer dient tijdens de bouwperiode vervuiling / beschadiging door zijn schuld (of onderaannemers) buiten het werkterrein in de openbare ruimte te herstellen op zijn kosten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000600	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
VH040 V-000611	**Schade aan openbare weg binnen 24 uur herstellen:** Schade aan de openbare weg ten gevolge van Werkzaamheden dienen binnen 24 uur te worden hersteld. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000639	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
VH050 V-000538	**Wegbeheerder en omgevingsmanager controleren toestand/comfort van de wegen:** De wegbeheerder en de omgevingsmanager (van OG en/ of ON) controleren de toestand/comfort van de wegen, fiets- en voetpaden regelmatig tijdens het zogenaamde 'rondje om de bouwplaats' **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000566	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
VH060 V-000578	**Schades aan weg herstellen voor rekening opdrachtnemer:** Eventuele schades aan de weg zullen in overleg met de wegbeheerder ofwel zelf worden hersteld ofwel door de wegbeheerder worden hersteld voor rekening van de Opdrachtnemer. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000606	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	
VH070 V-000624	**Situatie veilig stellen als herstel niet binnen 24 uur kan plaatsvinden:** Indien het niet mogelijk of wenselijk is om schade binnen 24 uur na constatering te herstellen, dient de Opdrachtnemer binnen 24 uur na constatering de situatie veilig te stellen en te onderbouwen waarom herstel binnen de gestelde termijn niet mogelijk is. Binnen 2 werkdagen komt Opdrachtnemer met een herstelplan en zal deze overleggen aan Opdrachtgever. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000652	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03	*Geautoriseerd door:*	

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Ramon Wonink	
VH080 V-000550	**Nulmeting uitvoeren bij aanvang werkzaamheden:** Bij aanvang van de werkzaamheden dient de ON een 0-meting uit te voeren om schade bij de aanvang van de werkzaamheden vast te stellen. Deze 0-meting wordt schriftelijk vastgelegd in een rapportage en ondersteund met foto's. Indien deze 0-meting niet wordt uitgevoerd is observatie van de wegbeheerder bindend. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000578	zie hfst 7, par 7.2			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
VH090 V-000591	**Tijdelijke verhardingen rekening houdend met mensen met mobiliteitsbeperking:** Bij alle in te stellen tijdelijke verhardingen dient expliciet rekening gehouden te worden met mensen met een mobiliteitsbeperking conform de comforteisen die zijn opgenomen in de [ZWIA] (Zo Werken Wij In Amsterdam op straat). Daarom mag een tijdelijke voetgangersvoorziening geen hoogteverschil bevatten hoger dan 2cm en geen kieren. Indien een tijdelijke voetgangersvoorziening een hoogteverschil bevat hoger dan twee cm, dient de Opdrachtnemer de overbruggingsconstructie van dat hoogte verschil aan de Opdrachtgever voor te leggen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000619	zie hfst 7, par 7.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
VH100 V-000633	**Bouwterrein afsluiten:** De opdrachtnemer is vierentwintig uur per dag verantwoordelijk voor de veiligheid op het bouwterrein. Daarom moet hij het werkterrein zo afsluiten dat het betreden van het werkterrein door onbevoegden wordt voorkomen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000661	zie hfst 7, par 7.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
VH110 V-000597	**Toegangsdeuren en -poorten buien werktijd afsluiten:** Alle toegangsdeuren en -poorten van de bouwplaatsafscheiding worden buiten werktijd afgesloten met sloten. De opdrachtnemer dient de brandweer te voorzien van een 'loper' waarmee toegang verschaft kan worden tot het werkterrein in geval van een calamiteit. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000625	zie hfst 7, par 7.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
VH120 V-000527	**ISO/VCA bebording aan buitenzijde bouwterrein:** Aan de buitenzijde van het bouwterrein is aan beide zijden van de entree de ISO/VCA bebording aangebracht. Ook is een telefoonnummer vermeld waarmee 24/7 contact kan worden opgenomen bij calamiteiten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000555	zie hfst 7, par 7.4			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Geautoriseerd door: Ramon Wonink	
VH130 V-000569	**Installaties, machines en werktuigen binnen bouwplaats opbergen:** Elektrische installaties, machines en werktuigen die binnen de bouwplaats aanwezig zijn, zullen worden vergrendeld of opgeborgen om te voorkomen dat deze door onbevoegden in werking kunnen worden gesteld. Buiten de bouwplaats (voor zover dit zal voorkomen) zullen dergelijke middelen nooit onbeheerd worden achtergelaten. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000597	zie hfst 7, par 7.4			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH140 V-000605	**Overzichtelijke en veilige in- en uitritten:** Opdrachtnemer dient te zorgen voor veilige en overzichtelijke in- en uitritten bij het werkterrein, door deze op een goede manier in te richten en bij elke in- en uitrit verkeers- en tekstborden te plaatsen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000633	zie hfst 7, par 7.5			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH150 V-000533	**Bouwverkeer vooruit in- en uitrijden:** Bij de inrichting van het bouw- en werkterrein dient de Opdrachtnemer maatregelen te nemen om het bouwverkeer altijd vooruit het werkterrein in- en uit te laten rijden zodat de chauffeur goed zicht heeft op te kruisen verkeersstromen. Achteruitrijdend bouwverkeer is slechts toegestaan indien Opdrachtnemer kan aantonen dat er geen andere oplossing mogelijk is, en Opdrachtgever akkoord is. In dergelijke situaties is begeleiding met een verkeersregelaar vereist. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000561	zie hfst 7, par 7.5			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH160 V-000541	**Verkeersregelaars voorzien van aanstellingscertificaat:** Verkeersregelaars dienen in het bezit te zijn van een aanstellingscertificaat verkeersregelaar geldig voor Amsterdam. De verkeersregelaars dienen dit certificaat bij uitvoering van de werkzaamheden bij zich te dragen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000569	zie hfst 7, par 7.5			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH170 V-000583	**Gebied rondom werkterrein verlichten conform ROVL 2011:** Het gebied rondom het werkterrein dient te worden verlicht ten behoeve van het creëren van een sociaal veilige omgeving, conform richtlijn ROVL 2011. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000611	zie hfst 7, par 7.6			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	 2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger	Voldoet

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
												Geautoriseerd door: Ramon Wonink	
VH180 V-000619	**Bouwkranen niet draaien of hijsen over rijbanen, voetpaden, fietspaden of werkterreinen van derden:** Bouwkranen mogen niet over rijbanen, voetpaden, fietspaden of werkterreinen van derden hijsen/draaien. Indien afwijking hiervan noodzakelijk is, dient de Opdrachtnemer aan te tonen dat er geen andere oplossing mogelijk is. De Opdrachtnemer dient dit te beschrijven in het BLVC-uitvoeringsplan. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000647	zie hfst 7, par 7.8			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH190 V-000548	**Hijswerkzaamheden in/over openbare ruimte onder begeleiding van verkeersregelaar:** Hijswerkzaamheden in/over de openbare ruimte vinden altijd plaats onder begeleiding van een verkeersregelaar. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000576	zie hfst 7, par 7.8			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH200 V-000589	**Opdrachtnemer richt organisatie in die in geval van calamiteiten 24/7 bereikbaar is:** Opdrachtnemer dient een organisatie in te richten die in geval van calamiteiten altijd (24/7) bereikbaar is, met toegang tot de hoofduitvoerder of omgevingsmanager van Opdrachtnemer. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000617	zie hfst 7, par 7.9			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH210 V-000627	**Besmetting van drinkwaterleiding voorkomen:** Besmetting van de drinkwaterleiding dient te worden voorkomen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000655	zie hfst 7, par 7.10			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
VH220 V-000558	**Werkzaamheden aan riolering en drinkwaterleiding separaat:** Werkzaamheden aan de riolering en de drinkwaterleiding dienen separaat plaats te vinden. In verband met het waarborgen van de hygiëne van drinkwaterleidingen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000586	zie hfst 7, par 7.10			Document(en): TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					Revisie(s): 1.0	2019-09-27	Datum oordeel: 2019-10-03	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet

VERIFICATIERAPPORT WERKPAKKETACTIVITEIT

Eis-ID: Ver. ID:	Eistekst:	Criterium en Tolerantie:	Bovenliggende eisen:	Onderliggende eisen:	Wijzigingen	Van toep. zijnde doc.:	Verificatiemethode:	Frequentie:	Hoe:	Registratiewijze:	Verificatiemoment:	Verificateur:	Verificatiestatus:
VH230 V-000598	**Gereedschappen en materieel schoon bij werkzaamheden:** De reinheid van gereeedschappen en materieel voor de werkzaamheden aan de drinkwaterleiding dienen de hygiëne te waarborgen. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000626	zie hfst 7, par 7.10			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VH240 V-000566	**Tijdelijke verhardingen vlak en stroef:** Tijdelijke verhardingen dienen vlak en stroef te zijn. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000594	zie hfst 7, par 7.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		

VH250 V-000606	**Gaten en sleuven afzetten of afdekken:** Gaten en sleuven dienen duidelijk te zijn afgezet of afgedekt. **Toelichting op Eis:**						Documenttoets	1	checken of eis in plan is opgenomen	KPL - Kwaliteitsplan	01. Projectfase	Omgevingsmanager	Afgerond
Verificatietaak:	*Verwijzing en onderbouwing*	*Afwijkingen*		*Bewijs*								*Uitgevoerd door:*	*Oordeel:*
VT-000634	zie hfst 7, par 7.3			Document(en):					Revisie(s):		Datum oordeel:	Djenna Burger *Geautoriseerd door:* Ramon Wonink	Voldoet
				TDOZ-000314 | TDOZ-000314 - BLVC-Uitvoeringsplan					1.0	2019-09-27	2019-10-03		
