Bijlage 2: Registratieformulier onderzoeksbomen
Straatnaam en raknaam: Singel 112-168 SIN0401
Datum: 15-10-2021
Opname door: 5.1,2,e


Boomnr in onderzoek	Gemeentelijk boomnummer	Straatnaam locatie	Huis-nummer	Boomsoort	Boomsoort Nederlandse naam	Beleidstatus	Boomtype	Standplaats	(A) Stam-diameter exact (cm) Op 1,3 m hoogte	(B) Boom-hoogte (m) Point-cloud	(C) Kroon- diameter (m) in de lijn huis-kade Pointcloud	(C) Kroon- diameter (m) in de lijn langs de kade Pointcloud	(D) Overhang takken over de kade (m) Pointcloud	(E) Takvrije stamlengte (m)	(F) Vrije ruimte tussen bovenkant kademuur en kroon (m) Pointcloud	(G) Afstand bovenkant kademuur (visueel doorgetrokken) en onderkant buitenkant boom kroon (m) Point cloud	(H) Afstand buitenkant (waterkant) kademuur en buitenzijde stam van de boom	(I) Afstand bovenkant kademuur en gemiddelde waterstand (m)	Conditie (cijfer)	Conditie- klasse (goed, voldoende, onvoldoende, slecht, zeer slecht, afgestorven)	Opmerkingen conditie	Inschatting toekomst-verwachting (jaar)	Opmerkingen veiligheid en algemeen boomstructuur	Opmerkingen flora en fauna	Projectinvloed in % snoeiverlies veiligheidscon-structie op 2 m afstand van de kademuur + extra werkruimte. Snoeilijn op 1 m van de kademuur	Projectinvloed in % snoeiverlies veiligheidscon-structie op 3 m afstand van de kademuur + extra werkruimte. Snoeilijn op 2 m van de kademuur	Opmerkingen projectinvloed	Boomleeftijd (plantjaar - 8 jaar)	Plantjaar (data gemeente Amsterdam)
1	342350	Singel	110	*Ulmus* 'Rebona'	Iep cv	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding eenzijdig belast parkeerplaats	20,00	9,00	5,0	5,0	0,0	3,1	3,5	nvt	3,6	2,2	8,00	Goed		>15			nvt	nvt		13	2016
2	348530	Singel	12036	*Ulmus* 'Rebona'	Iep cv	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding eenzijdig belast parkeerplaats	24,00	9,00	6,0	6,0	0,0	3,3	4,0	nvt	3,0	1,0	8,00	Goed		>15			nvt	nvt		13	2016
3	342292	Singel	124	*Ulmus* 'Dodoens'	Iep cv	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	36,00	15,00	7,5	8,0	1,5	4,7	5,7	6,0	3,0	1,0	8,00	Voldoende		>15			<5	nvt		44	1985
4	342281	Singel	130	*Ulmus x hollandica* 'Belgica'	Hollandse iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding eenzijdig belast parkeerplaats	56,00	20-24	11,0	13,0	3,0	3,6	3,6	3,6	3,0	1,0	8,00	Voldoende		>15			5-10	<5		69	1960
5	342316	Singel	136	*Ulmus x hollandica* 'Belgica'	Hollandse iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	60,00	20-24	11,0	10,0	4,0	3,4	3,0	1,5	3,0	1,0	4,00	Onvoldoende	Stagnerende groei	>15			10-15	5-10		69	1960
6	342313	Singel	140	*Ulmus x hollandica* 'Belgica'	Hollandse iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	65,00	20-24	12,0	11,0	5,0	3,6	4,5	2,0	3,0	1,0	4,00	Onvoldoende	Stagnerende groei	>15			25-30	20-25		69	1960
7	341975	Singel	144	*Ulmus x hollandica* 'Belgica'	Hollandse iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding eenzijdig belast parkeerplaats	65,00	20-24	13,0	13,0	6,0	3,3	5,0	2,0	3,0	1,0	8,00	Voldoende		>15			30-35	20-25		69	1960
8	341957	Singel		*Ulmus x hollandica* 'Belgica'	Hollandse iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	Gekapt	69	1960
9	341962	Singel	hoek bergstraat	*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	verharding tweezijdig belast parkeerplaats	47,00	18-20	9,5	10,0	3,0	3,9	5,5	5,5	3,0	1,0	6,00	Voldoende		>15			5-10	<5		69	1960
10	341996	Singel	158	*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	25,00	12,00	6,0	5,0	0,0	4,2	nvt	nvt	3,0	1,0	2,00	Slecht	Gestagneerde groei	<10			nvt	nvt		44	1985
11	341992	Singel	158	*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	25,00	10,00	3,0	3,0	0,0	3,2	nvt	nvt	3,0	1,0	2,00	Slecht	Gestagneerde groei, dode gesteltak	<10	Gestagneerde groei, dode gesteltak		nvt	nvt		44	1985
12	941984	Singel	162	*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding eenzijdig belast parkeerplaats	36,00	18-20	7,5	8,0	1,5	5,0	6,0	7,0	3,0	1,6	6,00	Voldoende		>15			<5	<5		44	1985
13	341983	Singel	164	*Ulmus* 'Dodoens'	Iep cv	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	Verharding tweezijdig belast parkeerplaats	28,00	10,00	6,5	5,5	1,0	5,0	5,0	6,0	3,0	1,9	4,00	Onvoldoende	Gestagneerde groei	>15			<5	<5		44	1985
14	341998	Singel	172	*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	In verharding onbelast	75,00	24-30	14,0	13,0	5, (klein gedeelte van de kroon)	3,5	3,5	3,5	nvt	nvt	6,00	Voldoende		>15			<5	<5		69	1960
15	341997	Singel		*Ulmus x hollandica* 'Vegeta'	Huntingdon iep	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	69	1960
16	344016	Singel		*Ulmus* 'Dodoens'	Iep cv	Hoofdbomenstructuur	Niet vrijuitgroeiend	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	28	2001

Boom met knelpunt projectinvloed snoeien met meer dan 20 % kroonmassa

Boom niet aanwezig

Veldopname profielbreedte straat: Afstand huisno ....110. gevel tot buitenzijde kademuur ongeveer 12,7meter

Afstand huisno ..... gevel tot buitenzijde kademuur ongeveer ..... meter

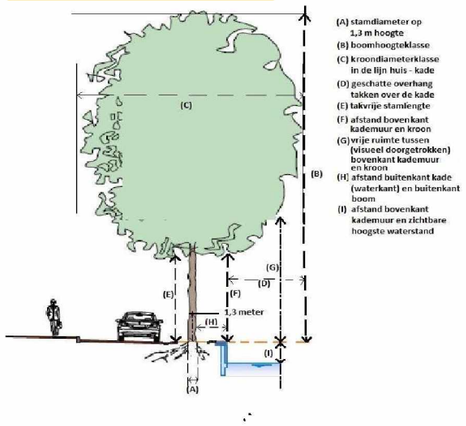

(A) stamdiameter op 1,3 m hoogte
(B) boomhoogteklasse
(C) kroondiameterklasse in de lijn huis - kade
(D) geschatte overhang takken over de kade
(E) takvrije stamlengte
(F) afstand bovenkant kademuur en kroon
(G) vrije ruimte tussen (visueel doorgetrokken) bovenkant kademuur en kroon
(H) afstand buitenkant kade (waterkant) en buitenkant boom
(I) afstand bovenkant kademuur en zichtbare hoogste waterstand
