Gemeente Amsterdam

Opnamerapport

Amsterdam - AI 2020-0143 - Deelopdracht Spaklerweg - Uitvoering

23 mei 2023

Ingebruikname en overdrachtsrapport Spaklerweg.

Op maandag 22-05 om 09:30 heeft er een opname van het werk Spaklerweg plaats gevonden. De opname is voor de vooroplevering aan Beheer en V&OR en het ingebruik nemen van de Spaklerweg door dagelijks Beheer. Nadat onderstaande aandachtspunten zijn afgehandeld wordt het werk definitief opgeleverd en volgt er een proces van oplevering. De volgende personen waren aanwezig bij de opname:

5.1, 2, e, V&OR grijs
5.1, 2, e, V&OR grijs
5.1, 2, e 5.1, 2, e, Beheer
5.1, 2, e, V&OR groen
5.1, 2, e, V&OR groen
5.1, 2, e, projectleider
5.1, 2, e, integraal projectleider
5.1, 2, e, directievoerder

Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023

09:57

GPS 52.33468, 4.92289

Daniël Goedkoopstraat 13, Amsterdam

Half bewolkt 19°C wind 4 km/u

01. Bermen kruising Spaklerweg - D. Goedkoopstraat puin verwijderen, afwerken en inzaaien;
02. 10x20 band in trottoir verwijderen;
03. Tegelwerk rondom handhold hertegelen;
04. Tegelwerk herstellen;
05. Puin uit berm verwijderen en berm bijzaaien;
06. Tegelwerk herstellen;
07. Zand uit berm verwijderen;
08. Scheg verwijderen en tegels schiften;
09. Beheer, Distels verwijderen;
10. Tegelwerk herstellen;
11. Berm bijzaaien;
12. Hele werk, tussen geleide- en noppentegels 30 cm grijze vlakke tegel;
13. Hele werk, tussen geleide- en noppentegels 30 cm grijze vlakke tegel;
14. Hele werk, tussen geleide- en noppentegels 30 cm grijze vlakke tegel;
15. Spelregels gebruik kruising delen met het Bajeskwartier;
16. Hele werk, tussen geleide- en noppentegels 30 cm grijze vlakke tegel;
17. Geleidelijn aanbrengen;
18. Algemeen, lalo plaatsen verkeersbord, extra witte 30x15 tegels aanbr. en hertegelen in juli;
19. Zijn de boomroosters conform puccini, wat wordt eventueel het alternatief;
20. Algemeen, lalo plaatsen verkeersbord op ov-mast aanbr. extra witte 30x15 tegels aanbr. en hertegelen in juli;
21. Stam van boom beschadigd;
22. Stam van boom beschadigd;
23. Stam van boom beschadigd;
24. Inmeldlus t.b.v. VRI aansluiten, (23-05 uitgevoerd);
25. Verkeersbord incl. onderbord verplaatsen naar ov-mast;
26. Ononderbroken markering aanbrengen op rotonde langs 28/30 band;
27. Berm bijzaaien;

Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023

28. Straatwerk invegen;
29. Noppentegel verwijderen en vervangen voor grijze gladde tegel;
30. Algemeen, lalo plaatsen verkeersbord, extra witte 30x15 tegels aanbr. en hertegelen in juli;
31. Ononderbroken markering aanbrengen op rotonde langs 28/30 band;
32. Markeringspijlen aanbrengen op het fietspad t.h.v. de Welnastraat;
33. Kabel t.h.v. ov-mast verwijderen;
34. Algemeen, lalo plaatsen verkeersbord, extra witte 30x15 tegels aanbr. en hertegelen in juli;
35. Verkeersbord incl. onderbord verplaatsen op ov-mast;
36. Inspectieput verkeerd geboord, herstellen;
37. BM18 plaatsen, kan niet i.v.m. overrijdbare berm;
38. Schrikhekken plaatsen, dubbele geleiding, betonvoet in straatwerk;
39. Straatwerk afmaken;
40. 8 st betonvoet t.b.v. uitneembare paal lev. en aanbrengen in berm;
41. Kapotte tegel door VKM herstellen;
42. Verwijderen legoblok;
43. Verwijderen logoblok en plaatsen zwerfkei van depot;
44. Verwijderen logoblokken en plaatsen zwerfkeien 2 st. van depot;
45. Figuratie herstellen conform nieuwe situatie tekening;
46. Opleverpunten ov herstellen;
47. Revisie mantelbuizen aanleveren.













Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023























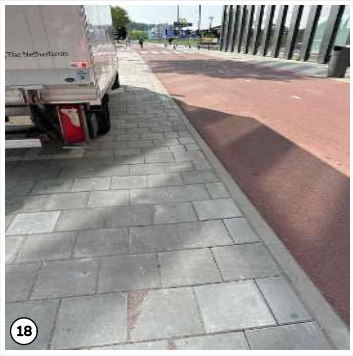

Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023

























Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023

























Opnamerapport

Amsterdam - AI 2020-0143 - Deelopdracht Spaklerweg - Uitvoering

23 mei 2023

Werkzaamheden week 21 - 2023

maandag 22 mei 2023





