Ac IC	\	Nr.	Activity Name	Start	lemaining Duration	Finish
Verkeerscirculatie Kolenkitbuurt						
Gemeente						
		1	Opstellen Verkeerscirculatie gehele buurt (concept)	01-03-16 A	0	07-03-16 A
		2	1ste bespreking CVC (advies)	10-05-16 A	0	
		3	Verder uitwerken Verkeerscirculatie gehele buurt (concept)	10-05-16 A	0	11-07-16 A
		4	2de bespreking CVC (besluit)	21-02-17*	0	
		5	Bestuurlijke besluitvorming Verkeerscir, i.r.t NvB B&L-weg	09-06-17	20	06-07-17
Jan van Schaffelaarplantsoen / Leeuwendalersweg / Akbarstraat						
Gemeente Maaiveldinrichting						
		6	Start	16-10-15 A	0	
		7	Uitwerken maaiveld ontwerp	19-10-15 A	0	26-02-16 A
		8	Inlichten bestuur over ontwerp, vrijgave voor participatie	18-04-16 A	0	20-05-16 A
		9	(Voorbereiden van) Bewonersavond	01-04-16 A	0	25-04-16 A
		10	Verslaglegging bewoners en belangheb. avond en versturen	26-04-16 A	0	25-05-16 A
		11	Onderzoeken	29-02-16 A	0	26-05-16 A
		12	Uitwerken Voorsontwerp naar voorlopig Defintief Ontwerp	27-05-16 A	0	22-07-16 A
		13	Inlichten bestuur over Definitief Ontwerp, vrijgave voor participatie	02-12-16 A	0	06-01-17 A
		14	Participatie bewoners over voorlopig DO	09-01-17 A	26	10-03-17
		15	Bestuurlijke besluitvorming over DO	13-03-17	45	17-05-17
		16	Opstellen OMOP Bestek, inclusef ZV fase 3 & 4	11-11-16 A	29	15-03-17
		17	Openbare Aanbesteding (dlt in kalenderdagen, min 27)	16-03-17	40	24-04-17
		18	Gunning incl advies Leadbuyer en Alcatel	25-04-17	30	07-06-17
		19	Uitwerken 1ste Deelopdracht (Do)	01-06-17	30	12-07-17
		20	Uitvoering Nuonwarmte	01-02-16 A	0	21-07-16 A
		21	START Wenstracé	09-01-17 A	0	
		22	Verzenden aanvraag wenstracé	30-01-17 A	0	
		23	Wenstracé	30-01-17 A	81	31-05-17
		24	Definitief Tracé Akkoord		0	31-05-17
		25	Voorbereiding K&L-bedrijven	01-06-17	171	30-01-18
		26	Uitvoering WNA	01-02-16 A	0	30-06-16 A
		27	Bouwrijp maken overige delen	09-05-16 A	0	12-08-16 A
		28	Bouwrijp maken Jan van Schaffelaar veldje	16-08-16 A	0	17-10-16 A
		29	Aansluiting WNA op perceel	14-09-17*	15	04-10-17
		30	K&L gereed voor uitvoering	31-01-18	0	
		31	Uitvoering K&L	31-01-18	60	25-04-18
		32	Tijdelijke maaiveld inrichting rondom uitgang parkeergarage	14-09-17	20	11-10-17
		33	Definitieve Maaiveld inrichting totaal. JvS-plantsoen & Lwndalersw.(oost)	03-05-18	65	01-08-18
		34	Maaiveld inrichting Leeuwendalerweg tus. Akbarstr. & de Schaapherderstr.	03-05-18	65	01-08-18
		35	Maaiverld gereed		0	01-08-18
Jan van Schaffelaar plantsoen						
Gemeente uitgifte						
		36	Goedkeuren Voorontwerp Rapsody	28-09-15 A	0	23-10-15 A
		37	Uitgifte op basis van Definitief Ontwerp	18-01-16 A	0	21-07-16 A
		38	Levering (Passeren Akte)	19-12-16 A	0	30-12-16 A
Rapsody in West						
		39	Bouwrijp opgeleverd		0	16-12-16 A
		40	Opstellen Voorontwerp Rapsody(bouwblokken)	01-07-15 A	0	29-09-15 A
		41	Opstellen maaiveld ontwerp binnem terrein	19-10-15 A	0	19-01-16 A
		42	Voorbereidende Werkzaamheden bouw blokken	19-12-16 A	0	27-01-17 A
		43	Start bouw	30-01-17 A	0	
		44	Bouw t/m 1ste blok gereed (Blok A)	30-01-17 A	171	04-10-17
		45	Oplevering 1ste blok	05-10-17	20	01-11-17
		46	Bouw t/m laatste blok gereed	30-01-17 A	380	01-08-18
		47	OPENBARE RUIMTE omgeving Rapshody gereed		0	01-08-18
		48	Oplevering laatste blokken	02-08-18	101	20-12-18
		49	Onderbouw afbouw	01-02-18	226	18-12-18
		50	Rapsody in West opgeleverd		0	20-12-18

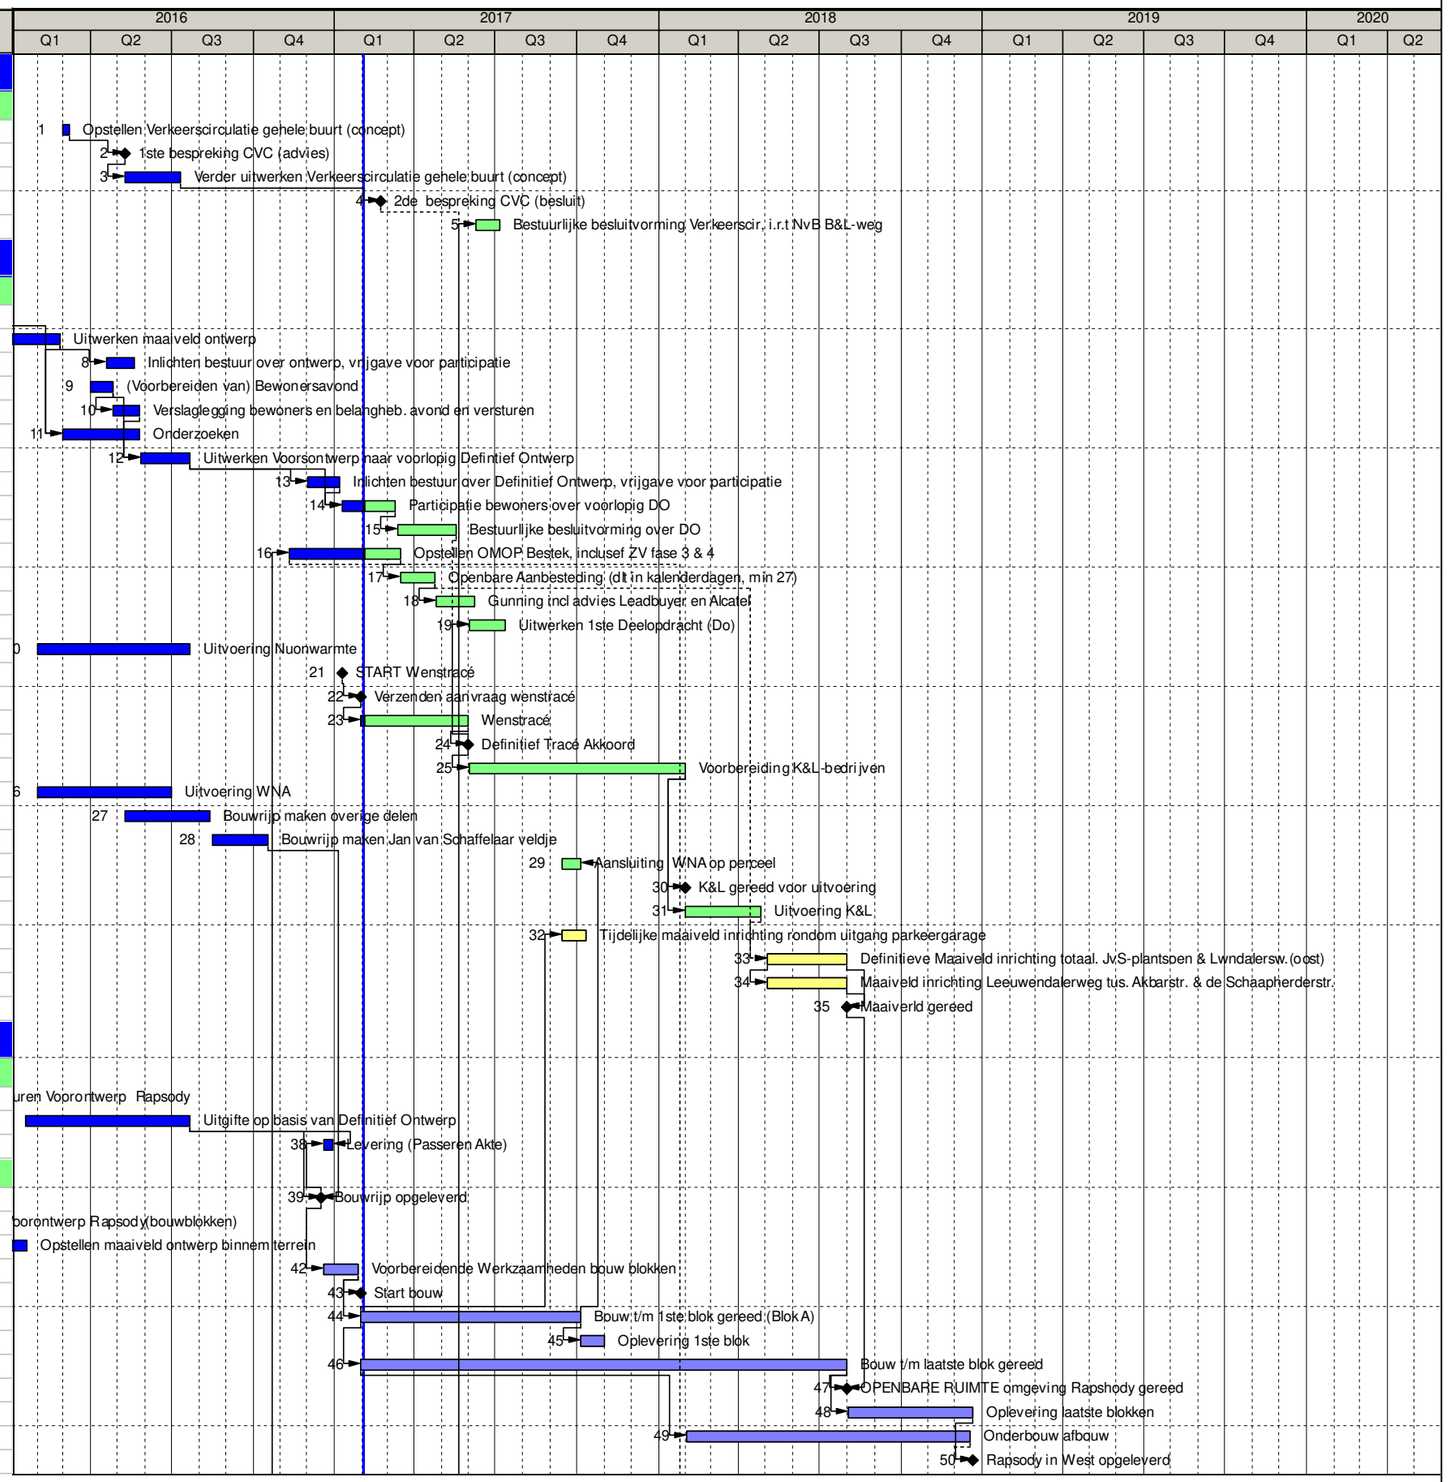

Projectnummer: IB 267.20/21/22/23/30
Projectmanager: 5.1, 2, e
Planningsadviseur: 5.1, 2, e
Peildatum: 03-02-17 / Printdatum: 03-02-17 - 14:54

Remaining Level of Effort
Actual Work
Critical Remaining Work
Milestone
Remaining Work
Maaiveld
K&L
Bouwen
ROOD
(New Bar)

Versie concept 15

Maaiveld inrichting Kolenkitbuurt
Globale Hoofdlijnen planning
Geactualiseerd en Uitgebreid

Gemeente Amsterdam

Ac ID	Nr.	Activity Name	Start	Remaining Duration	Finish
Middengebied Akbarstraat					
Gemeente Maaiveldinrichting					
	51	Overleg met Inkoop over contractstrategie / samenwerkinhgsovereenkomst	05-09-16 A	0	30-09-16 A
	52	Opstellen SamenwerkingsOcereenKomst (SOK)	03-10-16 A	0	11-11-16 A
	53	Overleg met Eigenhaard over SOK	17-10-16 A	0	09-01-17 A
	54	Definitief maken SOK, vasstellen (gem.) en akkoord	10-01-17 A	42	03-04-17
	55	Opstellen contract	14-02-18	65	18-05-18
	56	Openbare Aanbesteding en gunning	11-06-18	80	28-09-18
	57	Maaiveld inrichting Bouwkavel Akbarstraat ter hoogte van EH blok 3	01-10-18*	127	29-03-19
Middengebied					
Gemeente uitgifte					
	58	Goedkeuren ontwerp maaiveld binnenzijde middengebied	02-12-15 A	0	30-12-15 A
Antea					
	59	Opstellen Voorontwerp maaiveld binnen rondom bouw blokken	02-09-15 A	0	01-12-15 A
	60	Bouwrijp maken er hoogte van bl. 2 en 3	11-07-16 A	0	23-12-16 A
	61	K&L middengebied midden tussen bouwbl. 2	02-09-16 A	0	27-01-17 A
	62	Maaiveld inrichting Rondom school en tussen bouwblokken 2	20-02-17*	30	31-03-17
	63	Tijdelijke Maaiveld inrichting Bos en Lommerweg	20-03-17	10	31-03-17
	64	K&L middengebiedbuitenkant rondom blokken 3	05-11-18*	63	04-02-19
	65	Bouwrijp maken maaiveld	18-07-17	45	18-09-17
	66	Def. Maaiveld inrichting Leeuwendalerweg ter hoogte van bl. 2 en 3	18-06-19	72	25-09-19
Middengebied Fase 2					
Eigen Haard					
	67	Start bouw	01-09-15 A	0	
	68	Bouw blokken 2	09-11-15 A	0	27-12-16 A
	69	Oplevering blokken 2	30-12-16 A	0	26-01-17 A
Middengebied Fase 3					
Eigen Haard					
	70	Sloop blokken 3 en bouwrijpmaken	02-01-17 A	179	16-10-17
	71	Bouw blokken 3 (en 4|)	21-11-17*	400	17-06-19
	72	Maaiveldinrichting	01-04-19	55	17-06-19
Middengebied Fase 4					
Eigen Haard					
	73	Verplaatsen Cruijff-court	02-05-16 A	0	13-06-16 A
	74	Oude school vrijgegeven	15-05-17	0	
	75	Sloop oude school	22-05-17*	25	23-06-17
	76	Sloop blokken	04-04-17*	148	31-10-17
	77	Bouw blokken 4	21-11-17	380	12-06-19
	78	Maaiveld inrichting fase 4	27-03-19	55	12-06-19
	79	Uitvoering Speelterrein El Amienschool	17-02-17	30	30-03-17*
	80	Uitvoering uitbreidng El Amienschool	02-09-16 A	36	24-03-17
Middengebied Fase 5					
Eigen Haard					
	81	Sloop blokken	08-08-19	80	27-11-19
	82	Bouw blokken 5	28-11-19	400	22-06-21
Ringspoorzone Noord					
Gemeente					
	83	Aanpassen bestemmingsplan	23-11-16 A	294	29-03-18
	84	Voorbereiding/ investeringsbesluit/verwerven & ontruimen	02-01-17 A	411	13-09-18
	85	Tender (Contractvorming tot en met Gunning en acceptatie)	03-07-17*	402	28-01-19
Gemeente Maaiveldinrichting					
	86	Voorbereiding bouwrijp maken en maaiveld	03-01-17 A	377	27-07-18
	87	Uitvoering sloop eventueel incl. asbestsanering	30-04-19	45	01-07-19
	88	Uitvoering bouwrijp maken (incl. event. sanering), watercompensatie	02-07-19	65	30-09-19
	89	Uitoering maaiveld	01-04-21	65	02-07-21
Ontwikkelaar					
	90	Bouwvoorbereiding	01-02-18	265	14-02-19
	91	Omgeving functievrij	01-04-21	0	
	92	Bouw blokken	01-10-19*	450	02-07-21
Ringspoorzone Midden					

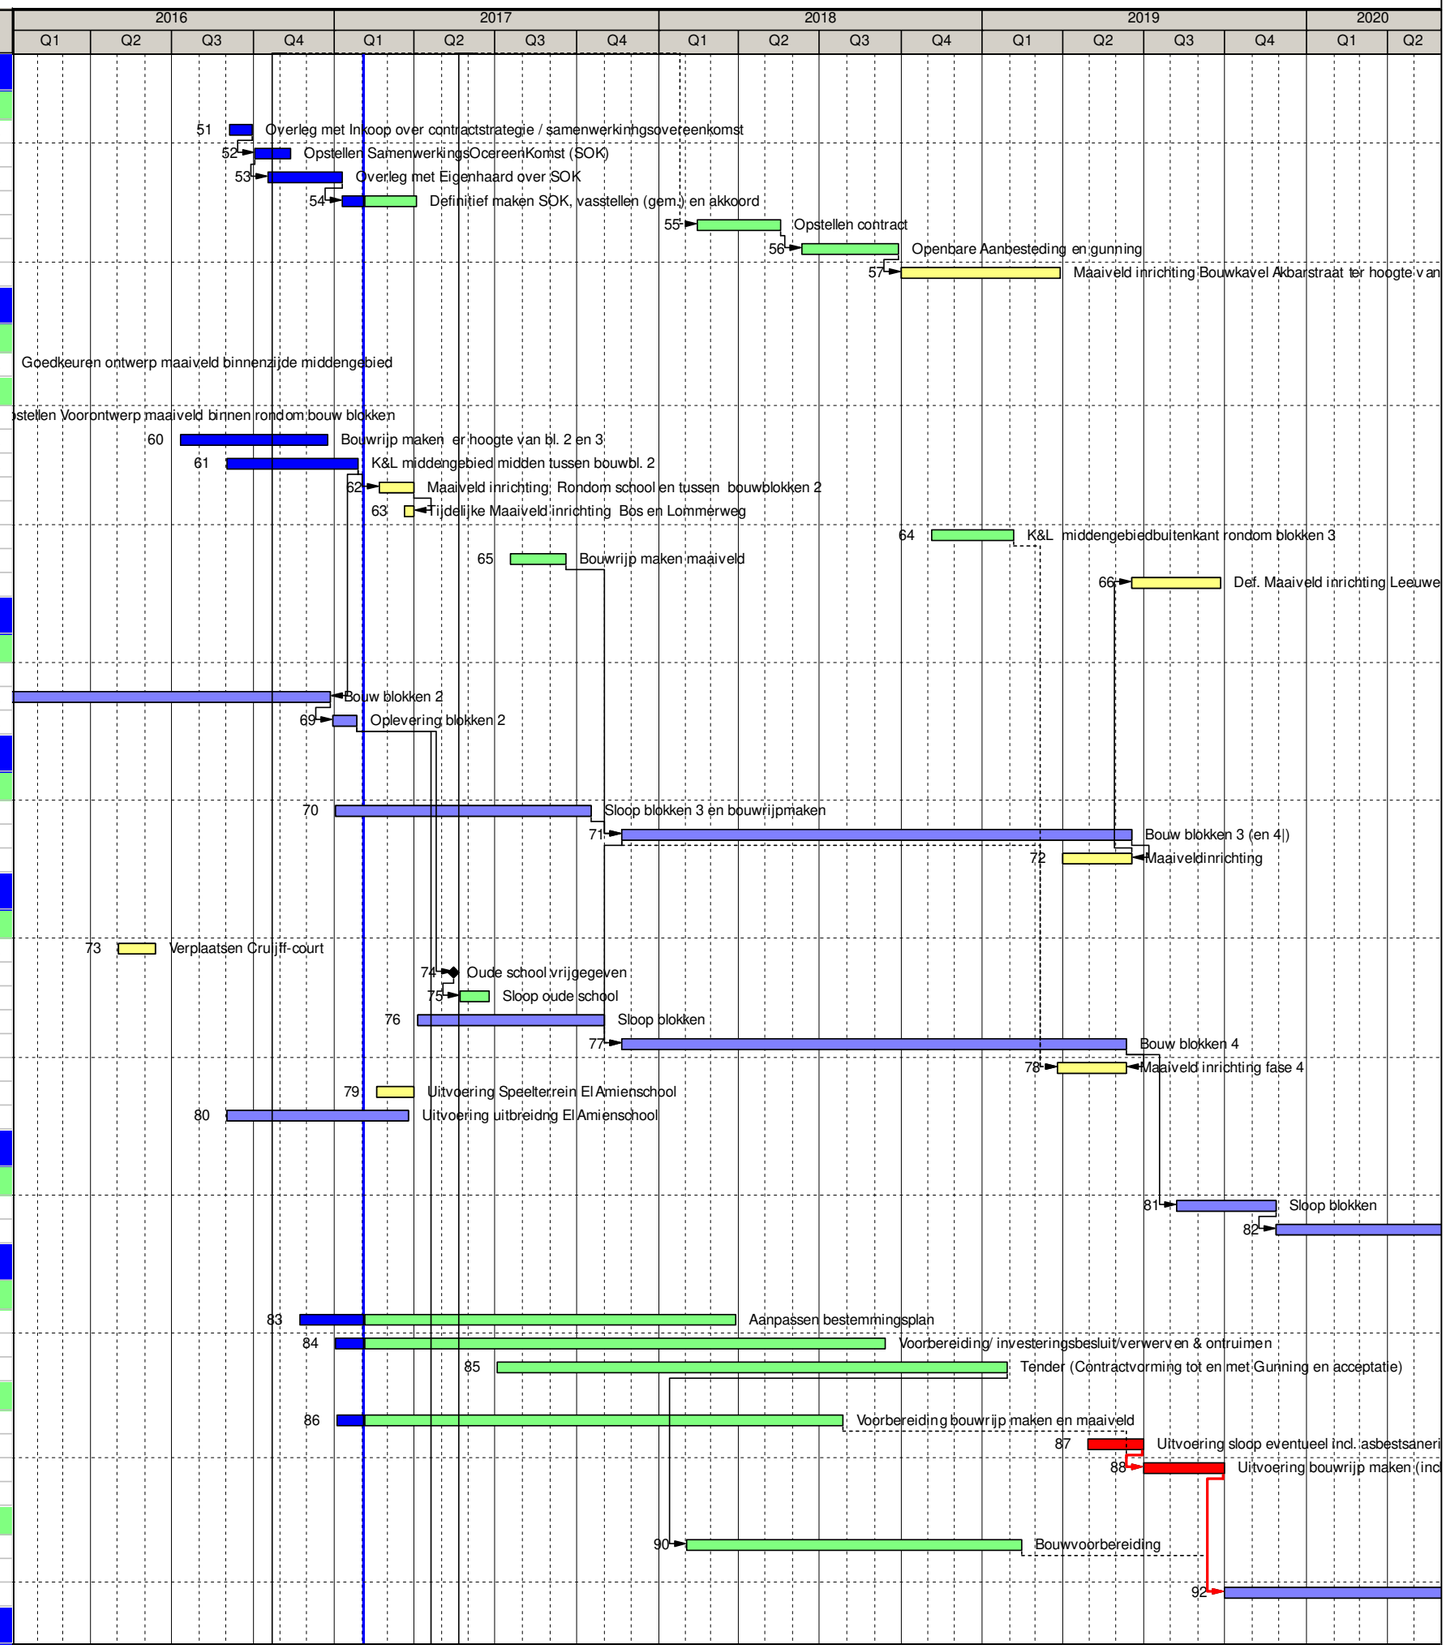

Activity ID	Nr.	Activity Name	Start	Remaining Duration	Finish
		Gemeente			
	93	Planvorming	24-07-17*	250	16-07-18
	94	Planvoorbereiding	17-07-18	250	05-07-19
	95	Uitvoering maaiveld	08-07-19	200	16-04-20
		Ringspoorzone Zuid			
		Gemeente			
	96	Planvorming	07-03-17*	250	27-02-18
	97	Planvoorbereiding	28-02-18	250	20-02-19
	98	Uitvoering maaiveld	21-02-19	200	28-11-19
		Bos en Lommerweg			
		Gemeente tijdelijke Maaiveldinrichting			
	99	Start tijdelijk maaiveld bij school	09-11-15 A	0	
	100	Uitwerken maaiveld ontwerp	09-11-15 A	0	05-01-16 A
	101	Opstellen Voorontwerp	17-06-16 A	0	11-08-16 A
	102	Opstellen Definitief ontwerp	12-08-16 A	0	06-10-16 A
	103	Opstellen Deelopdracht	07-10-16 A	0	27-10-16 A
	104	Overleg prijsafspraak en deelopdracht aannemer	28-10-16 A	0	17-11-16 A
	105	Opstellen BLVC-kader	12-08-16 A	0	06-10-16 A
	106	Uitvoering tijdelijke maaiveld inrichting (samen met inrichting rondom school)	20-03-17*	10	31-03-17
		Gemeente Maaiveldinrichting			
		Ontwerp en Nota van Uitgangspunten & Eisen			
	107	Start maaiveld inrichting	02-09-16 A	0	
	108	Opstellen Verkeerscirculatieplan Kolenkitbuurt	02-09-16 A	0	13-10-16 A
	109	Opstellen Plan van Aanpak	02-09-16 A	0	30-12-16 A
	110	Uitwerken maaiveld ontwerp	30-12-16 A	46	07-04-17
	111	Opstellen Nota van Uitgangspunten en Eisen (NvUE)	02-09-16 A	0	02-01-17 A
		Besluitvorming uitgangspunten			
	112	Overleg met BC	03-01-17 A	0	23-01-17 A
	113	Opstellen concept flap	09-01-17 A	0	23-01-17 A
	114	Afstemming met AOG	23-01-17 A	0	26-01-17 A
	115	Aanleveren Integrale tafel	27-01-17 A	7	13-02-17
	116	Integrale tafel (maandag)	14-02-17	0	
	117	Aanleveren voor DB	14-02-17	6	21-02-17
	118	DB (dinsdag)	22-02-17	0	
	119	Aanleveren voor Agenda commissie	22-02-17	6	01-03-17
	120	Agenda commissie	02-03-17	1	02-03-17
	121	Aanleveren AB	03-03-17	14	22-03-17
	122	Voorbereiding AB	23-03-17	0	
	123	Besluitvorming AB	06-04-17	0	
		Participatie, NvB en Besluitvorming			
	124	Opstellen tekeningen en documenenten t.b.v. Inspraak	22-02-17	25	29-03-17
	125	Laatste voorbereidings termijn vooradvertentie in krant, website, etc	06-04-17	3	10-04-17
	126	Inspraakperiode	11-04-17	40	08-06-17
	127	Einde Inspraakperiode, start opstellen Nota van Beantwoording	09-06-17	0	
	128	Afronden Nota van Uitgangspunten en Eisen (NvUE) o.b.v. Inspraak	09-06-17*	35	27-07-17
	129	Opstellen Nota van Beantwoording	09-06-17	35	27-07-17
	130	Opstellen concept flap	17-11-17	11	01-12-17
	131	Afstemming met AOG	01-12-17	4	06-12-17
	132	Aanleveren Integrale tafel	07-12-17	12	22-12-17
	133	Integrale tafel (maandag)	27-12-17	0	
	134	Aanleveren voor DB	27-12-17	6	04-01-18
	135	DB (dinsdag)	05-01-18	0	
	136	Aanleveren voor Agenda commissie	05-01-18	6	12-01-18
	137	Agenda commissie	15-01-18	1	15-01-18
	138	Aanleveren AB	16-01-18	14	02-02-18
	139	Voorbereiding AB	05-02-18	0	
	140	Besluitvorming AB	19-02-18	0	
		Planuitwerking			
	141	Onderzoeken	07-04-17	60	05-07-17
	142	Opstellen Voorontwerp	30-12-16 A	46	07-04-17
	143	Definitief ontwerp (incl. BLVC)	28-07-17	80	16-11-17
	144	Opstellen bestek	19-02-18	100	11-07-18
	145	Verwerken DTA en afronden Bestek, definitief	19-02-18	15	09-03-18
	146	Europese Openbare Aanbesteding en gunning	12-07-18	100	28-11-18
	147	START Wenstracé	07-04-17	0	

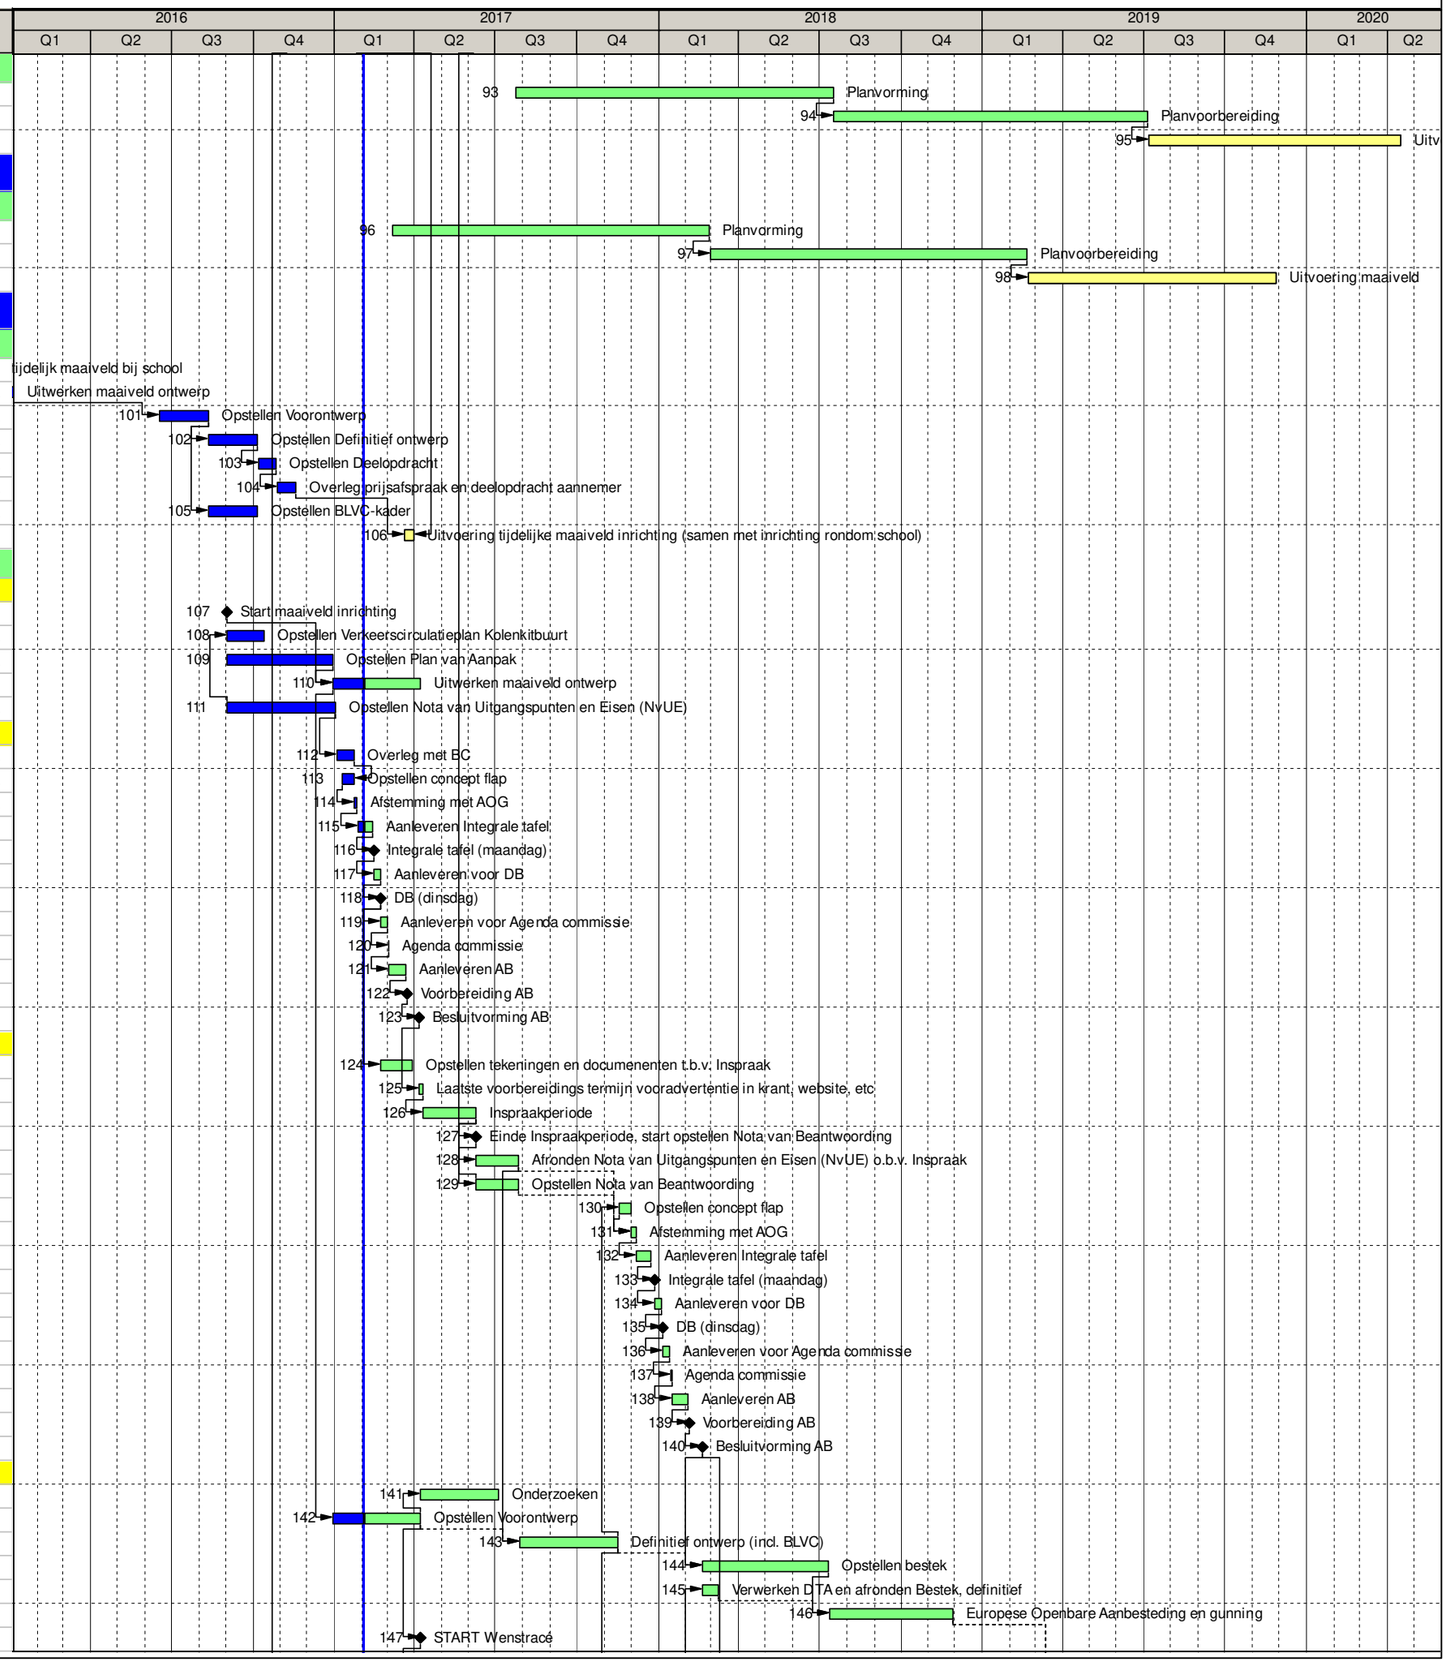

Ac IC	\	Nr.	Activity Name	Start	lemaining Duration	Finish
		148	Aanvraag Wenstracé t/m reacties K&L	07-04-17	40	07-06-17
		149	Vervolg Wenstracéprocedure	17-11-17	45	23-01-18
		150	Definitief Tracé Akkoord		0	19-02-18
		151	Voorbereiding K&L-bedrijven	19-02-18	171	18-10-18
		152	K&L gereed voor uitvoering	19-10-18	0	
			Planuitvoering			
		153	START Ulitvoering na werkzaamheden HAARLEMMERWEG	02-04-19*	0	
		154	Uitvoering maaiveld inrichting gefaseerd	02-04-19*	195	03-01-20
			Kolenkit kerk			
			Gemeente Maaiveldinrichting			
		155	Planvorming	01-09-17*	250	24-08-18
		156	Planvoorbereiding	27-08-18	250	15-08-19
		157	Uitvoering maaiveld	06-01-20	200	13-10-20
			Borstblok			
			Gemeente			
		158	Herhuisvesting t.b.v. renovatie	03-06-13 A	0	30-03-15 A
		159	Ultvoering renovatie (gefaseerd)	01-07-15 A	0	18-03-16 A
		160	Financiële afwikkeling renovatie	01-04-16 A	0	29-04-16 A
		161	Verkoop blok (t/m overeenstemming)	01-07-15 A	0	29-01-16 A
		162	Verkoop blok (t/m eigendomseoverdracht)	11-05-16 A	0	19-10-16 A
			Gemeente Maaiveldinrichting			
		163	START Wenstracé	08-01-18*	0	
		164	Verzenden aanvraag wenstracé	05-02-18	0	
		165	Wenstracé	05-02-18	85	06-06-18
		166	Definitief Tracé Akkoord		0	06-06-18
		167	Voorbereiding K&L-bedrijven	07-06-18	171	05-02-19
		168	K&L gereed voor uitvoering	06-02-19	0	
			Zuidelijk veld fase 2			
			Gemeente Maaiveldinrichting			
		169	Opstellen ontwerp speeltuin	02-05-16 A	0	06-06-16 A
		170	Overleg met Inkoop over participatie i.r.t. aanbestedings (on-)mogelijkheden	08-06-16 A	0	22-08-16 A
		171	Inlichten bestuur overvoorlopig Definitief Ontwerp, vrijgave voor participatie	08-06-16 A	0	14-06-16 A
		172	Participatie bewoners over voorlopig DO Speeltuin	15-06-16 A	0	05-07-16 A
		173	Bestuurlijke besluitvorming over DO	06-07-16 A	0	02-08-16 A
		174	Definitief ontwerp (incl. BLVC)	06-07-16 A	0	16-08-16 A
		175	Opstellen Bestek	23-08-16 A	0	03-10-16 A
		176	Nationaal Meervoudig onderhandse aanbesteding en gunning	04-10-16 A	0	05-12-16 A
		177	Aanleg en inrichting speeltuin	09-01-17 A	26	10-03-17
			Zuidelijk veld fase 3 & 4			
			Gemeente Maaiveldinrichting			
		178	Bestuurlijke besluitvorming vrijgave tot inspraak	26-02-16 A	0	18-04-16 A
		179	Bewonersavond	11-05-16 A	0	18-05-16 A
		180	Opstellen Nota van Beantwoording	19-05-16 A	0	08-06-16 A
		181	Bestuurlijke besluitvorming Nota van Beantwoording	12-05-16 A	0	30-06-16 A
		182	Onderzoeken	26-02-16 A	0	03-05-16 A
		183	Opstellen Voorontwerp	04-05-16 A	0	28-06-16 A
		184	Overleg vaststellen CVC	02-08-16 A	0	11-08-16 A
		185	Definitief ontwerp (incl. BLVC)	02-09-16 A	0	28-10-16 A
		186	Bestuurlijk Besluitvorming over DO	11-11-16 A	0	13-12-16 A
		187	Opstellen Bestek (OMOP), inclusief Jan van Schaffelaarplantsoen	11-11-16 A	29	15-03-17
		188	Opstellen Contract strategie	11-11-16 A	0	08-12-16 A
		189	Openbare Aanbesteding (dlt in kalenderdagen, min. 27 dgn)	16-03-17	40	24-04-17
		190	Gunning, incl. Alcatel en leadbuyer advies	25-04-17	30	07-06-17
		191	Uitrwerken eerste Deelopdracht (Do)	16-03-17	45	22-05-17
		192	Eerste Deelopdracht (Do)	08-06-17	0	
		193	START Wenstracé	03-08-15 A	0	
		194	Verzenden aanvraag wenstracé	12-04-16 A	0	
		195	Wenstracé	13-05-16 A	0	02-09-16 A
		196	Definitief Tracé Akkoord		0	05-09-16 A
		197	Voorbereiding K&L-bedrijven	06-09-16 A	64	08-05-17
		198	K&L gereed voor uitvoering	09-05-17*	0	
			Zuidelijk veld fase 3			
			Gemeente Maaiveldinrichting			

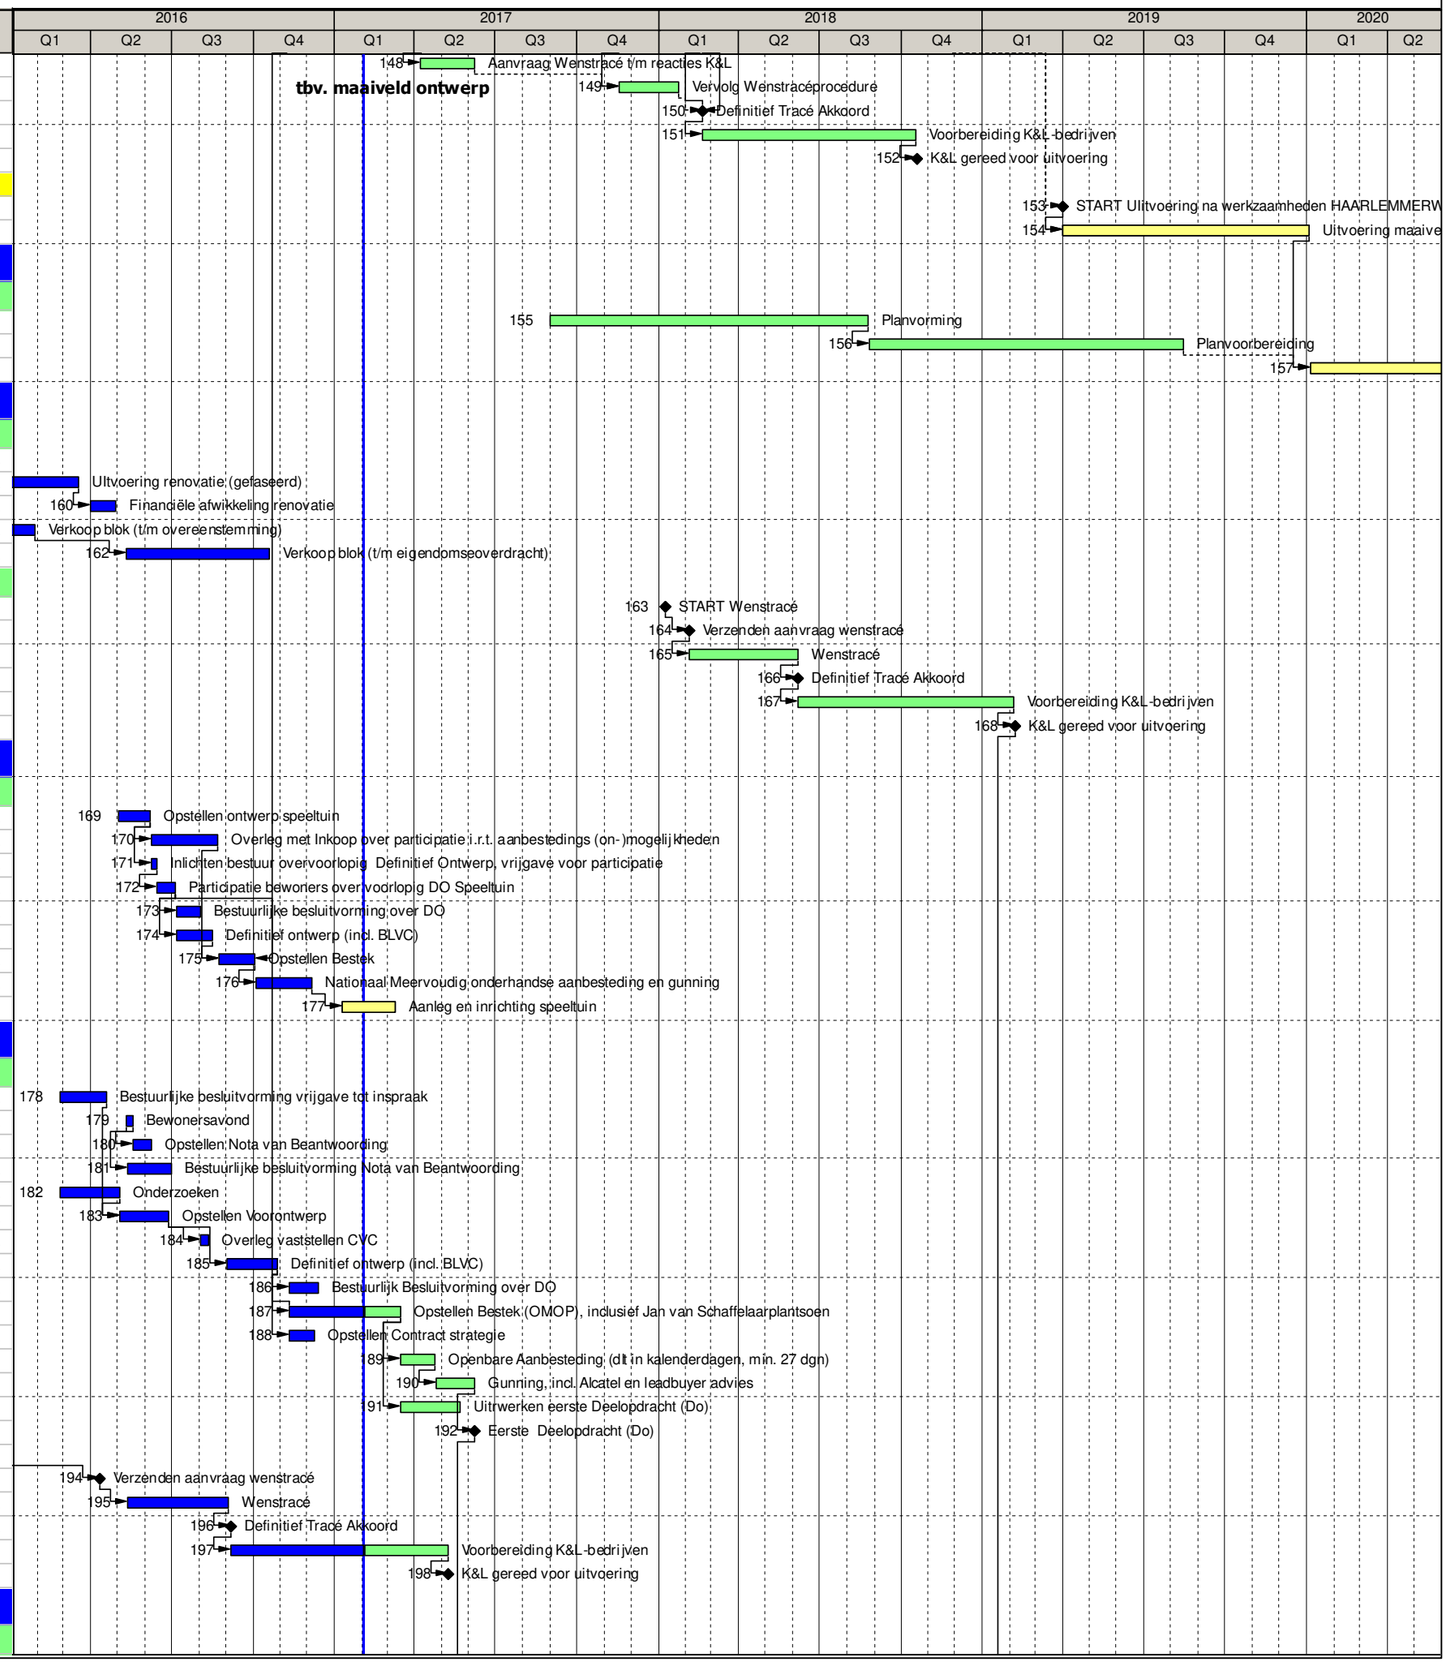

Ac ID	Nr.	Activity Name	Start	lemaining Duration	Finish
	199	Maaiveld inrichting rondom bl. 1	08-06-17*	55	23-08-17
	200	Maaiveldinrichting rondom bl. 2 en 3	22-01-18	50	30-03-18
	201	Maaiveldinrichting rondom bl. 3 en 4	03-04-18	50	13-06-18
		ROCHDALE Renovatie per portiek			
	202	ZV3a BLOK 1 Uitvoering	01-04-16 A	36	24-03-17
	203	ZV3a BLOK 2, 3 en 4 tegelijkertijd Uitvoering	01-09-17*	148	30-03-18
		Zuidelijk veld fase 4			
		Gemeente Maaiveldinrichting			
	204	Maaiveldinrichting Rondom bl. 1 en 2	30-06-17	55	14-09-17
	205	Maaiveldinrichting Rondom bl. 3 en 4	01-10-18	55	14-12-18
	206	Maaiveld inrichting Wouter Pieterstraat	06-02-19	75	22-05-19
		STADGENOOT Renovatie (Sloop-Nieuwbouw)			
	207	BLOK 1 (Jacob van Arteveldestraat NRD) Sloop Uitvoering	09-05-16 A	0	09-09-16 A
	208	BLOK 2 (Baas Gansendonckstraat) Sloop Uitvoering	23-05-16 A	0	04-10-16 A
	209	BLOK 1 en BLOK 2 Nieuwbouw Uitvoering	14-10-16 A	102	29-06-17
	210	BLOK 3 en BLOK 4 Sloop- Nieuwbouw	01-12-17*	210	28-09-18

