Presentatie werken 2026 2027 2028 en 2029

Maart 2026

Jaarlijkse update werken

Wat hebben we gedaan?

- De programmering is besproken en vastgesteld in het DT van PBK
- De programmering is afgestemd met bureau stadsregie en is bestempeld als leidende opgave
- We hebben de werken voor de komende 4 jaar uit de programmering gehaald.
- Deze lijst is in DT besproken en vastgesteld als ambitie

Hoe is de programmering gemaakt?

- Hij is gebaseerd op de BTM’s (besluiten toekomstige maatregelen). Hierin staat de urgentie en welk deel van een rak vernieuwd moet worden of onderzocht op mogelijkheid tot renovatie.
- In de BTM bepalen we hoe snel een rak (deel) moet worden aangepakt.
- Programma varen heeft een eis gesteld mbt werken op langsgrachten en dwarsgrachten.
- We werken zoveel mogelijk in treintjes om de stad te ontlasten

Jaarlijkse update werken

Hoe is de toedeling naar de aannemers gedaan?

- In het DT is voor de toewijzing naar aannemers een besluit vastgesteld waarin proces beschreven hoe de keuze van aannemers plaatsvindt.
- In hoofdlijnen, bomen zijn belangrijk voor de stad dus zitten hoog in de afweging, het doorvaartprofiel is ook een bepalende factor
- We hebben integrale afwegingen gemaakt. IPK partijen eerst volprogrammeren en dan de overige aannemers inzetten.
- Kademakkers zijn (zoveel mogelijk) verdeeld naar de gebieden.
- Renovaties naar de Klerk/Hakkers (contr tot nov 2027) daarna bekijken in combinatie met kademakkers

Welke onzekerheden zit nog in deze lijst met werken?

- Aantal woonboten in rakken, voor ca 100st in 2028/2029 moet eea nog geregeld worden
- De eisenset voor IPK wordt vernieuwd, impact analyse wordt uitgevraagd.
- Waar zijn nog bomen te kappen? kunnen we die maximaal behouden.
- Capaciteit personeel, zowel bij gemeente, SOK-ID als aannemers
- Inclusief rakken die op haalbaarheid worden getoetst leveren

Gebieden

1. Burgwallen/ Stopera
2. Westelijke grachtengordel
3. Leidsebuurt
4. Oud west
5. Amstel/ Zuidelijke grachtengordel
6. Overige

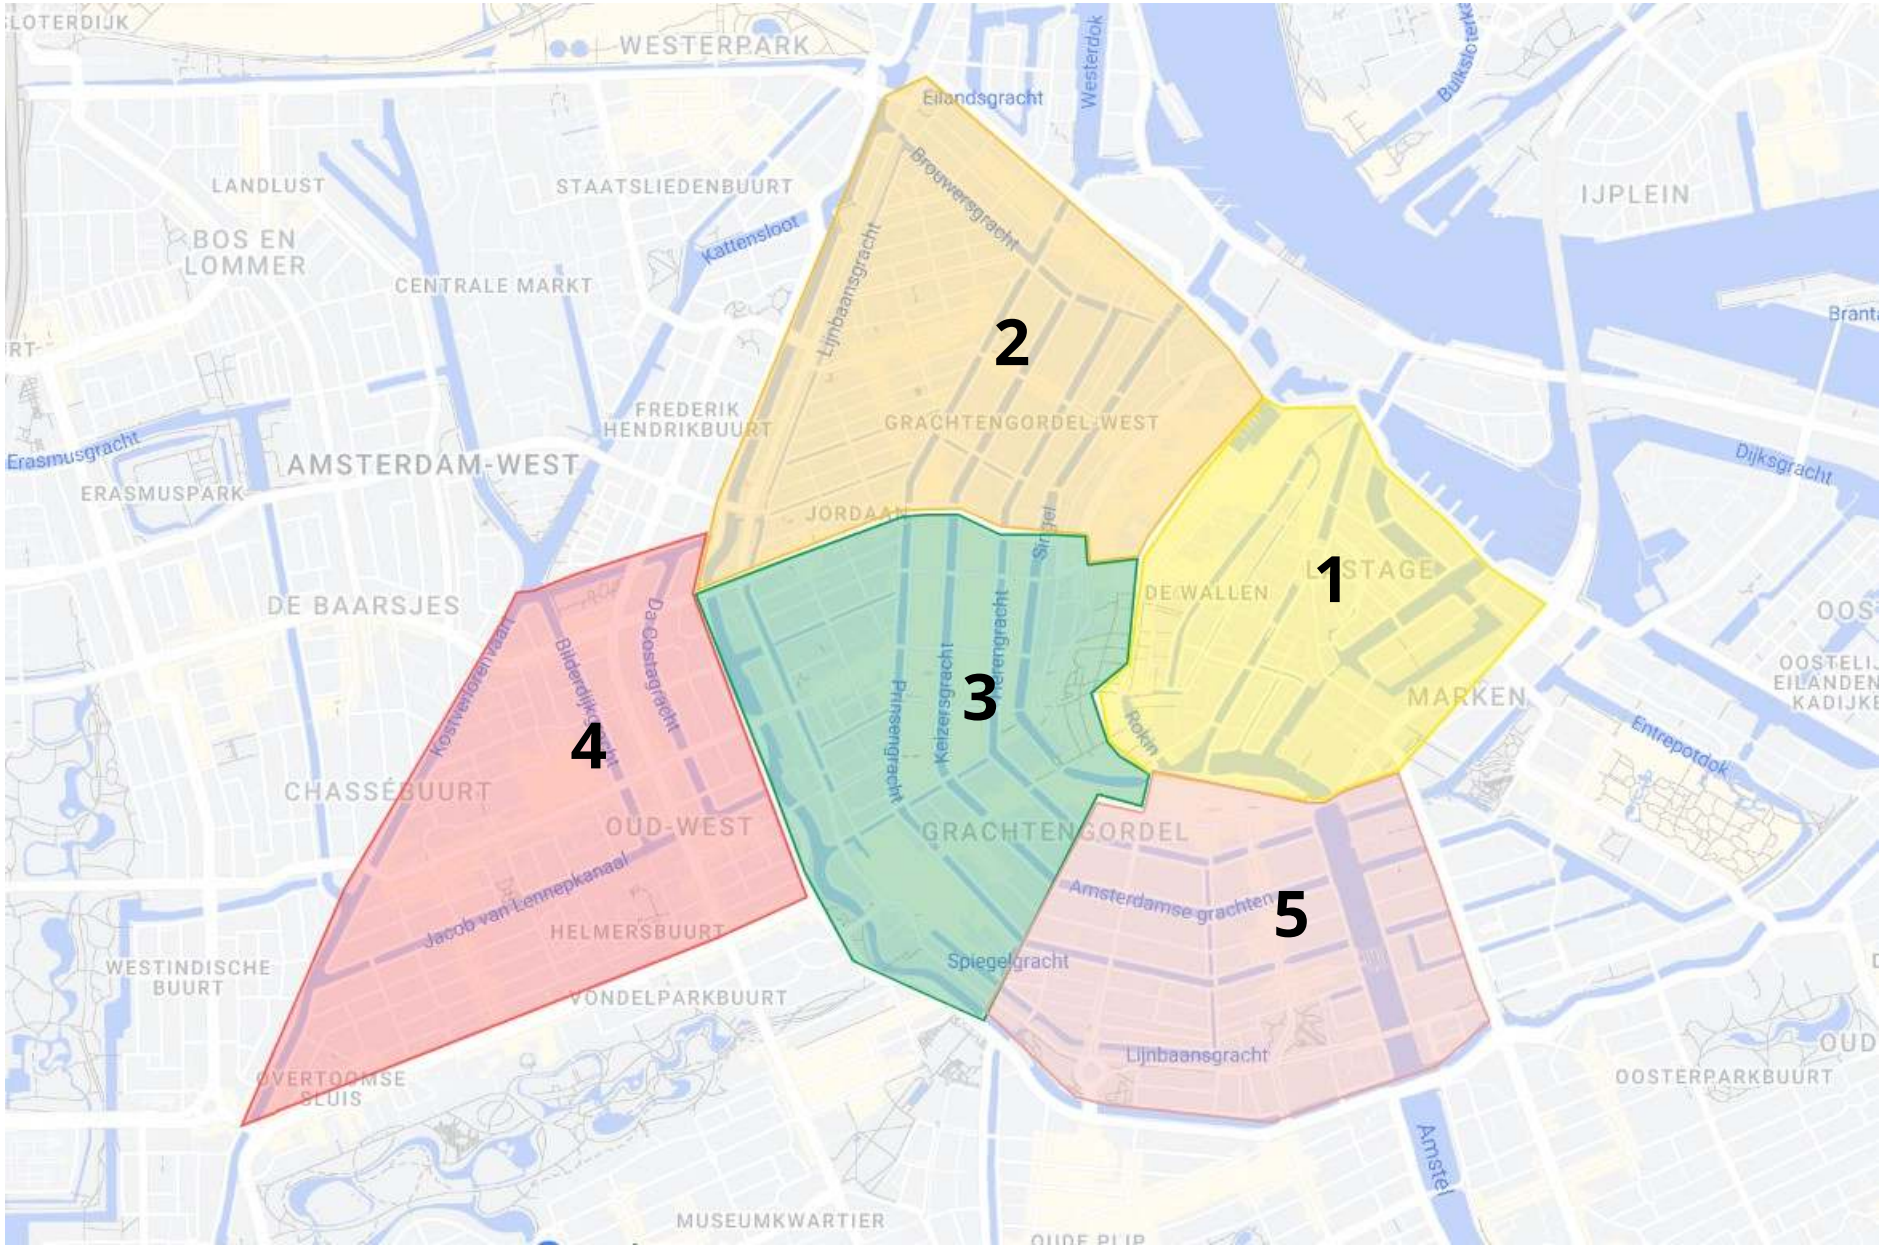

4.1, 4

4.1, 4


4.1, 4

Presentatie werken 2026 2027 2028 en 2029

Maart 2026

4.1, 4

Beens

Aannemer 2 (SPC)	Straat	Rakken	Som van 2026	Som van 2027	Som van 2028	Som van 2029
Beens						
	Heren racht	HEG0202	-	200	14	-
Totaal Beens			258	447	259	142


5.1, 2, e - 4.1, 4


5.1, 2, e - 4.1, 4


4.1, 4

Presentatie werken 2026 2027 2028 en 2029

Maart 2026
