

Project Oostbrug

Onderdeel van: Inrichtingsplan Rijkswateren Amsterdam

Stand van zaken rapportage - **februari 2026**
Bestemd voor: interne projectorganisatie + externen vanuit Haskoning

Management samenvatting

Projectmanagement

De tervisielegging van de concept definitienota en een nieuwe voortgangsrapportage over het eerste kwartaal van 2026 zullen gelijktijdig aangeboden worden in juni van dit jaar. Op 19 maart staat een nieuw overleg met de stuurgroep Oostbrug ingepland waarin de geactualiseerde besluitvormingsagenda/termijnplanning en planning van de Oostbrug. Daarnaast een stand van zaken over de NRD, het voornemen van de smallere nevengeulen en een maandrapportage met een algemene stand van zaken.

Projectbeheersing

De planning tot het definitiebesluit is geactualiseerd t.b.v. OSF. Voor bij de definitienota wordt een actualisatie gemaakt voor de periode na het definitiebesluit (integrale planning). De ramingen worden geactualiseerd en gereviewed, en er worden kansen en besparingen in beeld gebracht. De risico's zijn geactualiseerd en geprioriteerd. De kansen en besparingen worden in de vorm van een VTW met integrale afweging voorgelegd aan IPM/AOG/Wethouder.

Communicatie en Omgevingsmanagement

De NRD en Nota van antwoord wordt door het College vastgesteld in juni 2026. De Commissie MER komt op locatiebezoek op 3 maart en begin april volgt dan het adviesgesprek. Een aantal onderzoeken binnen de omgevingseffectrapportage (OER) krijgen prioriteit ten behoeve van de tervisielegging van de concept definitienota.

Technisch management

Eind maart wordt een review verwacht op het Integrale Referentie Ontwerp. Haskoning werkt verder aan het referentieontwerp binnen de nieuw opgestelde NOK24 met onder andere varianten voor de aanvaarbescherming en fundering van de Oostbrug. Duurzaamheidsaspecten en nieuwe kansen daarbij worden door [5.1, 2, e] inzichtelijk gemaakt ten behoeve van de concept definitienota.

Contractmanagement

De Tenderboard Oostbrug kan zich vinden in inkoopscenario C+. In juni van dit jaar wordt de overkoepelende inkoopstrategie ook voorgelegd aan de Tenderboard Oostbrug zodat deze mee kan in de definitienota en planning. Daarna wordt deze inkoopstrategie verder uitgewerkt



Projectmanagement

Gemeente Amsterdam

Projectmanagement

Terugblik afgelopen maand

Besluitvorming

- In overleg met de wethouder is besloten de voortgangsrapportage over het tweede halve jaar van 2025 samen te voegen met de voortgangsrapportage over het eerste halve jaar van 2026.
- In twee raadsvergaderingen op 12 februari en 19 februari zijn er vragen aan wethouder van Buren gesteld over het collegevoornemen te stoppen met de zeecruise. Een definitieve keuze wordt gemaakt bij het volgende college.
- Er is overeenstemming tussen de gemeente Amsterdam en Ketjen waardoor de bouwopgave in het Hamerkwartier voor 6500 woningen is herstart. Start van de bouw is in 2027 en in 2030 worden de woningen opgeleverd.

Organisatie

- 5.1, 2, e is gestart per 2 februari als junior omgevingsmanager
- 5.1, 2, e is gestart per 9 februari als projectleider integraliteit, hij maakt deel uit van het IPM team.
- 5.1, 2, e is gestart per 2 februari als stagiair in het technische team.

Projectmanagement

Vooruitblik komende maand

Besluitvorming

- De eerstvolgende voortgangsrapportage zal gelijktijdig worden aangeboden met het collegebesluit over de tervisielegging van de concept-definitienota.
- OSF vaststellen in het opdrachtgeversoverleg van 9 maart
- Beoogde onderwerpen in de stuurgroep van 19 maart:
  - Update besluitvormingskalender 2026 + termijnagenda
  - Geactualiseerde planning (onder voorbehoud van vaststelling in opdrachtgeversoverleg)
  - Eerste terugkoppeling inspraakperiode concept NRD
  - Ter bespreking het voornemen onderzoek versmalling nevengeulen vanuit TM, incl reactie RWS
  - Ter kennisname rapportage februari project Oostbrug
- Directeurenoverleg IJ 31 maart

Organisatie

- 5.1, 2, e stopt per 12 maart als communicatie adviseur, 5.1, 2, e neemt haar rol over per 5 maart.

Projectmanagement: vooruitblik besluitvorming

Datum	Overleg	(Beoogde) onderwerpen:
Maandag 9 maart	Opdrachtgeversoverleg (OSF)	OSF2026-1 rapportage
Dinsdag 10 maart	Periodiek overleg wethouder	
Maandag 16 maart	Afstemmingsoverleg Oostbrug	
Donderdag 19 maart	Stuurgroep Oostbrug	n.t.b. aan de hand van termijnagenda
Dinsdag 31 maart	Directeurenoverleg IJ	

n.b. als gevolg van de gemeenteverkiezingen zijn er nog geen data bekend voor het college en de raad



Omgevingsmanagement & Participatie

Gemeente Amsterdam

Omgevingsmanagement

Terugblik afgelopen maand

Voortgang Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

- Er is een verslag gemaakt van de twee informatieavonden op 28 en 29 januari en verstuurd naar alle deelnemers.
- De beantwoording van alle reacties op de NRD komen in een Nota van Antwoord waarna de eventueel op onderdelen gewijzigde NRD op 23 juni ter vaststelling aan het College wordt aangeboden.
- Er ligt een adviesvraag over de NRD bij de stadsdeelbesturen, de wettelijke maatschappelijke partners en de Commissie MER.
- Op dinsdag 3 februari was er een technische sessie inzake de NRD met de stadsdeelcommissies Oost en Noord.
- Beide stadsdeelcommissies vergaderden over de NRD.
- Op 19 februari was er een webinar over de NRD voor vertegenwoordigers van vaarweggebruikers.

Voortgang Omgevingseffectrapport (OER)

- Uitgangspunten notitie OER is gereed.
- PvA OER en onderzoeken OER worden opgestart.

Voortgang participatieproces

- Wethouder vd Horst heeft het vervolg participatieplan vastgesteld.

Omgevingsmanagement

Vooruitblik komende maand

Voortgang NRD en OER

- De Commissie MER komt op locatiebezoek op 3 maart. Begin april volgt een adviesgesprek.
- Prioritaire onderzoeken OER
- Overleg met nautische partijen en Haskoning over Uitgangspunten OER
- Overleg met nautische partijen en Haskoning over Nota van Antwoord

Voortgang participatieproces

- Alle verslagen in het kader van de participatie (gesprekstafels etc) worden gebundeld in een participatieverslag, dat meegaat naar het bestuur bij het Definitiebesluit (Q1 2027).

Overig

- Op 2 maart is er een gesprek met de initiatiefnemers van een ‘snelbrug’ over het IJ
- Op 4 maart is er een kennismaking en kennisuitwisselingsbijeenkomst met projecten in Noord.
- Op 24 maart is er overleg met het expertiseteam Fietser & Voetganger Oostbrug over de voortgang van het project
- Gezamenlijke inloopbijeenkomst voor de raakvlakprojecten Noord (JvH, Hamerkwartier, Oostbrug, etc .)

Communicatie

Terugblik afgelopen maand

- Evaluatie informatiebijeenkomsten
- Aanvullen Q+A met vragen die mensen hebben gesteld en er wellicht niet opstonden (evaluatieformulieren doornemen van collega's)
- Q + A webinar : NRD en bedienconcept
- Stakeholdersanalyse faciliteren
- Proberen tot een globale jaarplanning te komen.
- Overdracht communicatie

Vooruitblik komende maand

- Nieuwe communicatieadviseur inwerken

Social media en publicaties

Platform	Onderwerp	Link	Statistieken

Medium/website	Link	Onderwerp
Het Parool – 9 februari 2026	Opinie van elf stedenbouwkundigen en architecten: 'Geef voorrang aan de Westbrug over het IJ, desnoods tijdelijk' | Het Parool	Westbrug vs Oostbrug
Het Parool – 10 februari 2026	Opinie: 'Nee, ook de Westbrug over het IJ is geen oplossing. Tijd voor een tunnel' | Het Parool	Tunnel vs brug
Het Parool – 11 februari 2026	https://www.parool.nl/amsterdam/ambtenaren-stopera-waarschuwen-stoppen-met-zeecruises-kan-bruggen-over-het-ij-in-gevaar-brengen~b240b3d4/	Zeecruise
At5– 12 februari 2026	https://www.at5.nl/artikelen/236832/ambtenaren-tegen-stoppen-zeecruises-amsterdam	Zeecruise
At5– 13 februari 2026	https://www.at5.nl/artikelen/236856/wethouder-stelt-definitieve-keuze-cruiseschepen-uit-maar-de-bruggen-gaan-voor-alles	Zeecruise
Het Parool – 18 februari 2026	https://www.parool.nl/columns-opinie/opinie-van-reizigersorganisatie-rover-scherm-vanaf-2027-een-rijbaan-van-de-ijtunnel-af-voor-fietsers~bbd19993/	IJtunnel
Het Parool – 20 februari 2026	https://www.parool.nl/amsterdam/bouwplannen-voor-6500-woningen-in-hamerkwartier-amsterdam-noord-weer-op-koers-na-compromis-met-chemiefabriek-ketjen~bf2183cb/	Hamerkwartier
Het Parool – 26 februari 2026	https://www.parool.nl/amsterdam/aparte-fietsbrug-naast-amsterdamsebrug-stap-dichterbij-het-is-nu-soms-al-hartstikke-druk~b96a929a/	Fietsbrug Amsterdamsebrug



Projectbeheersing

Gemeente Amsterdam

Projectbeheersing

Terugblik en vooruitblik

Planning

- Actualiseren integrale planning t/m definitiebesluit voor vaststelling AOG in OSF gesprek. T.a.v. referentie ontwerp, onderzoeken en NRD-OER proces;
- Er zijn twee dagdeelsessies georganiseerd om de onderlinge relaties in beeld te brengen tussen: Inkoopstrategie; Ontwerptraject(en); Planologisch Juridische processen; Bestuurlijke besluitvorming;
- *Resultaten van de sessies worden verwerkt in integrale planning t.b.v. definitienota eind Q2;*
- *Op de iets langere termijn komen we i.s.m. TM tot een actueel beeld rond de uitvoering(sfasering). Dit inzicht wordt ook meegenomen in planning t.b.v. de definitienota eind Q2.*

Kostenraming

- Tussenraming in ruimtelijke kwaliteitsvarianten "verzorgde stadsbrug" en "high end" o.b.v. referentie ontwerp zijn in resp. december en februari geleverd, geeft inzicht in grote kostenstijgingen;
- *In vervolg wordt door Haskoning geschat (expert judgement) wat de financiële gevolgen zijn van negental kansen en besparingen. Vier daarvan nemen we mee in de definitienota (stijgpunten, OV, coherente vaarweg varianten en 3 extra ligplaatsen). Overige krijgen plek in het vervolg naar uitvoeringsbesluit (hellingspercentage, 4-> 2 kleppen – nevengeul, 12 meter variant, aanbruggen in beton);*
- *Tussenraming is ter review beschikbaar gesteld aan Ingenieursbureau Rotterdam.*

Scope

- Uitwerken proces scoperegistratie en wijzigingen;
- Inrichten Relatics;
- *Gebruiken VTW formulier;*
- *Doorlopen proces (changes) voor kansen en besparingen (zie welke bij kostenraming).*

Projectbeheersing

Terugblik en *Vooruitblik*

Risico's

- Risico's met IPM team geactualiseerd en geprioriteerd, input voor OSF;
- Tijd, geld en kans klassen in lijn gebracht met projectomvang;
- *Verder uitwerken risicodatabase als onderbouwing risicoreserve in SSK (met name technische risico's)*

Financiën

- Inwerken 5.1, 2, e die weer terug is op het oude nest. 5.1, 2, e doet Oostbrug en Sprong, 5.1, 2, e doet Toeleidende routes Oost;
- *Verbeteren proces rond inkoop t/m factuur;*
- *Actualiseren capaciteitsoverzicht (* 5.1, 2, e *in gesprek met…)*

Kwaliteitsmanagement

- *Verder ontwikkelen documentmanagement m.b.v. sharepoint: insteek optimaal sharepoint en metadata gebruiken.* 5.1, 2, e *heeft het voor TM ingericht, stap naar andere disciplines volgt;*
- *Kwaliteitssysteem verder verbeteren;*
- *Organiseren gatereview door externe partij.*



Technisch management

Gemeente Amsterdam

Technisch management

Terugblik afgelopen maand

Integraal Referentie Ontwerp Oostbrug

- Er is een review gevraagd van het Integraal Referentie Ontwerp aan het Ingenieursbureau Rotterdam als externe kwaliteitscontrole, TM werkt ook nog aan een verzoek tot review aan RWS Grote Projecten (RWS – GPO). Het Integraal Referentie Ontwerp is ook gedeeld met de nautische partners RWS-WNN en PoA (5.1, 2, e en 5.1, 2, e) en met de vraag mee te lezen of hun belangen voldoende mee zijn genomen in het ontwerp.
  Ook is een interne review aan collega's IB gevraagd, via 'de toets van Langedoen'.
  Naar verwachting kunnen eind maart de opmerkingen op het Integraal Referentie Ontwerp verwerkt worden en zal het technisch team het ontwerp volledig afronden.
- Aanbieding (concept) NOK24 is binnen. Hierin diverse onderwerpen om tot afronding IRO te komen. Plus technische uitwerking aantal varianten t.b.v. kansen/besparingen. Afstemming moet nog plaats vinden op prioritering van de varianten.
- 5.1, 2, e is voortvarend gestart met afstudeerstage 'brugdekverwarming'

Vaste en onzekere elementen binnen het ontwerpproces

- ORG (Alexander D'Hooghe) heeft in 2025 werksessies begeleid over de bruginpassing. Daarbij is voor vier onderwerpen afgesproken dat binnen bepaalde marges kan worden afgeweken van de uitgangspunten, waaronder die van de doorvaartbreedte van de nevengeulen in relatie tot de beweegbare delen. In navolging op deze uitkomst heeft TM op 20 feb jl. een onderbouwing gedeeld met RWS mbt smallere nevengeulen en beoogt hiermee draagkracht om dit verder te kunnen onderzoeken binnen de OER. Het onderwerp komt ter bespreking in de stuurgroep Oostbrug op 19 maart.
- Het ontwerpproces – met toevoeging van een aantal vaste en een aantal onzekere elementen - wordt beter inzichtbaar in de afbeelding op de volgende sheet:

Ontwerppproces Oostbrug

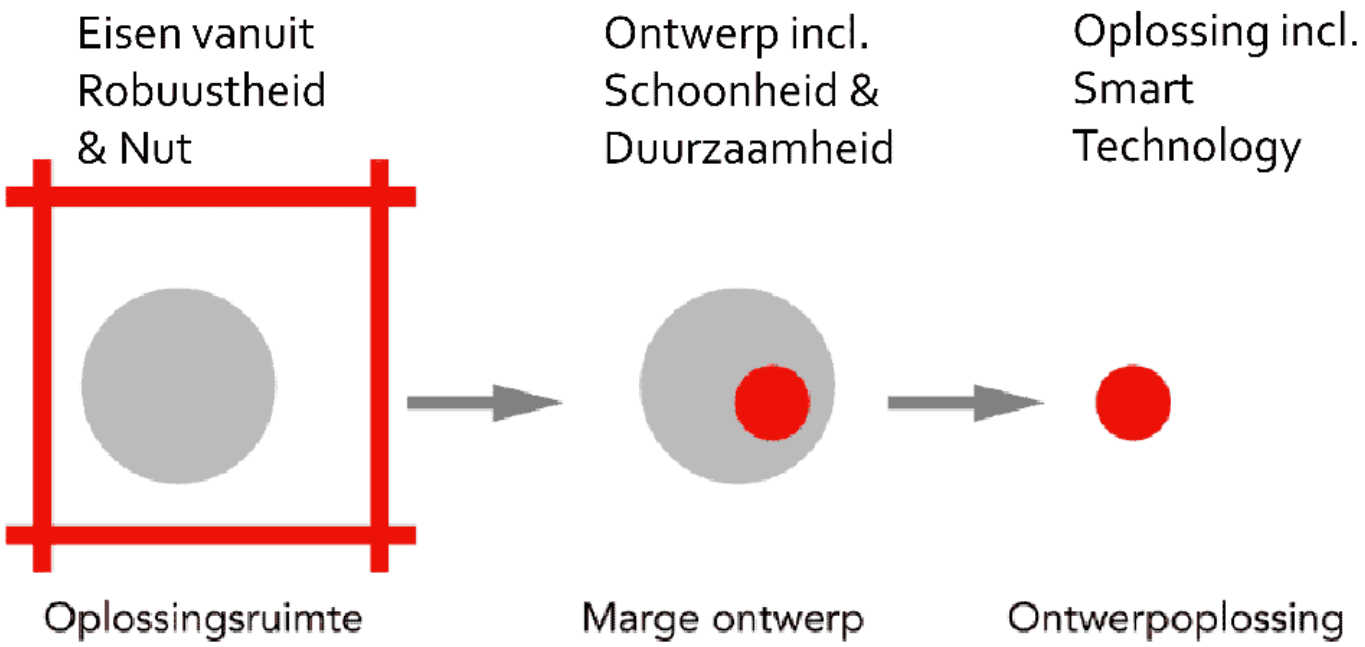

Technisch management

Vooruitblik komende maand

Het technisch team werkt de komende maand aan de volgende opgaves:

- Optimalisatie van het bedienconcept nadat het eerdere concept in de stuurgroep van januari bekrachtigd is. 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e neemt namens project Oostbrug deel in de vervolgoverleggen met de Werkgroep *Bedienconcept* die nu staan ingepland op 18 maart, 8 april en 29 april a.s.
- Verzamelen en uitwerken van output diverse interne en externe reviews.
- Uitwerken van de afspraken in NOK24 door Haskoning in samenwerking met TM. Hiermee worden een aantal varianten tbv het Integraal Referentie Ontwerp uitgewerkt en voorgelegd aan de bestuurders. Er wordt o.a. een verdiepingsslag gemaakt voor de aanvaarbescherming en de fundering van de brug . Deze optimalisatie duurt naar verwachting tot eind april / begin mei van dit jaar.
- Een inventarisatie/uitvoering van prioritaire onderzoeken uit de omgevingseffectrapportage (OER) ten behoeve van de tervisielegging van de concept definitienota in juni.
- Gesprek met 'Cie MER'
- Een inventarisatie van partijen die de onderzoeken tbv de omgevingseffectrapportage (OER) kunnen uitvoeren.
- Qua duurzaamheid zal 5.1, 2, e zal in de komende fase inzichtelijk maken welke aspecten momenteel in het referentieontwerp zijn opgenomen en waar nog kansen liggen. Zo wordt er een MKI-berekening gemaakt om de milieu-impact van het referentieontwerp te analyseren, worden de in 2025 opgestelde duurzame kansenkaarten geactualiseerd en vindt een tweede ambitiewebsessie plaats met het IPM-team om de duurzaamheidsambities te herijken. De resultaten hiervan, inclusief duurzaamheidseisen en kansenkaarten, worden verwerkt in de eisen en in de duurzaamheidsparagraaf voor de concept definitienota.



Contractmanagement

Gemeente Amsterdam

Contractmanagement

Terugblik afgelopen maand

Inkoopstrategie

- Op 9 februari 2026 is de Tenderboard Oostbrug geweest. De TBO heeft aangegeven zich te kunnen vinden in het advies voor inkoopscenario C+
- Concept plan van aanpak marktconsultatie is opgesteld
- Opzet en inhoudsopgave overkoepelende inkoopstrategie is opgesteld
- Er zijn twee werksessies met techniek, juridisch planologisch proces, planningsmanagement en contractmanagement geweest om te kijken naar de werkpakketverdeling en planning o.b.v. inkoopscenario C+

Contract Haskoning

- Vraag uitgezet t.b.v. evaluatie met Haskoning op 12 maart 2026 → graag reactie vanuit de teamleden
- NOK 20 iRO fase 3A is afgerond (t/m 15 november 2025), NOK 23 iRO fase 3B (t/m 13 februari 2026) ligt bij Haskoning liggen nog vragen t.a.v. kostenraming en ureninzet bij Haskoning, NOK 24 iRO fase 3C (t/m 17 april 2026) ligt concept aanbieding, moet geprioriteerd worden om werkzaamheden tijdig af te krijgen, Nok 16/26 afstemming tussen Haskoning en Amsterdam loopt. Proces van nadere overeenkomsten verloopt traag
- Brief t.b.v. indexatie 2025 Haskoning ontvangen

.

Contractmanagement

Vooruitblik komende maand

Inkoopstrategie

- In juni moet de overkoepelende inkoopstrategie worden voorgelegd aan de TBO zodat deze mee kan in de definitienota en planning
- Besluitvorming IPM-team omtrent trechtermemo
- Uitwerken overkoepelende inkoopstrategie
- Inplannen en verder uitwerken Marktinformatie/consultatie t.a.v. overkoepelende inkoopstrategie
- Verder uitwerken planning inkoopscenario C+ (werkpakketten en aanbesteding in relatie tot politieke besluitvorming en het juridisch planologische proces) in samenwerking met planningsmanagement
- Verder uitwerken invulling Ontwerpconsortium met techniek
- Verder uitwerken plan van aanpak aanbesteding Ontwerpconsortium
- Inkoopadviseur Amsterdam gaat bij de disciplines ophalen of nog losse inkopen moeten worden voorbereid

Contract Haskoning

- Opdracht NOK022 inzet nautisch projectleider → actie Amsterdam
- Opdracht NOK023 iRO fase 3B na beantwoording vragen door Haskoning → actie Haskoning
- Opdracht NOK024 iRO fase 3C na afstemming met PM Amsterdam → actie Amsterdam
- Opdracht NOK016 Stikstofberekeningen na afstemming Haskoning en Amsterdam → actie Amsterdam/Haskoning
- Uitvraag NOK025 SSK raming iRO fase 3C → actie Amsterdam
- Uitvraag NOK026 OER en onderzoeken → actie Amsterdam
- Indexatie Haskoning beoordelen → actie Amsterdam
- Nieuwe PFU wordt ingepland in mei 2026
- Evaluatie ingepland voor 12 maart 2026



- einde -

Volgend overleg projectteam op dinsdag 7 april 2026
