Gemeente Amsterdam

INDICATIEVE PLANNING AFSPRAKENBRIEF - TENNISPARK SLOTERPLAS - ACE VORM

VERSIE woe 15-5-24

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Tekst1
1	**TENNISPARK**				
2	**AFSPRAKEN, ERFPACHT, GROND**	**734 dage**	**maa 11-3-24**	**don 31-12-26**	
3	**AFSPRAKENBRIEF**	**132 dage**	**don 16-5-24**	**zat 16-11-24**	
4	Deadline afsprakenbrief mei	0 dagen	don 16-5-24	don 16-5-24	GEMEENTE
5	Deadline afsprakenbrief november	0 dagen	zat 16-11-24	zat 16-11-24	GEMEENTE
6	**ERFPACHT**	**138 dage**	**maa 11-3-24**	**woe 18-9-24**	
7	Tekeningen van VORM/programma definitief	0 dagen	maa 11-3-24	maa 11-3-24	VORM
8	Opstellen concept aanbieding	7,6 wkn	maa 11-3-24	woe 1-5-24	GEMEENTE
9	Concept aanbieding gereed	0 dagen	woe 1-5-24	woe 1-5-24	GEMEENTE
10	Acceptatietermijn	12 wkn	don 2-5-24	woe 24-7-24	VORM
11	Besluit volmacht en opdrachtbrief	2 wkn	don 25-7-24	woe 7-8-24	GEMEENTE
12	Financiele afwikkeling en passeren akte	6 wkn	don 8-8-24	woe 18-9-24	GEMEENTE
13	Akte gepasseerd	0 dagen	woe 18-9-24	woe 18-9-24	GEMEENTE
14	**VERKOOP/LEVERING GROND**	**697 dage**	**woe 1-5-24**	**don 31-12-26**	
15	Voorbereiding Didam (op basis van def. uitgiftetekeningen VORM	4 wkn	woe 1-5-24	din 28-5-24	GEMEENTE
16	Didam-publicatie	0 dagen	din 28-5-24	din 28-5-24	GEMEENTE
17	Stand still	4 wkn	woe 29-5-24	din 25-6-24	GEMEENTE
18	Levering grond aan VORM	0 dagen	woe 18-9-24	woe 18-9-24	GEMEENTE
19	Levering grond aan gemeente (`tbv openbare ruimte - nog te bep	0 dagen	don 31-12-26	don 31-12-26	VORM
20	**PLANNING VORM (belangrijke momenten)**	**1131 dage**	**maa 4-3-24**	**vri 30-6-28**	
21	**SBI momenten**	**780 dage**	**maa 30-12-24**	**vri 24-12-27**	
22	Start bouw uiterlijk	0 dagen	maa 30-12-24	maa 30-12-24	VORM
23	Deadline oplevering (max 36 mnd)	0 dagen	vri 24-12-27	vri 24-12-27	VORM
24	**VOORBEREIDING BOUW**	**175 dage**	**maa 4-3-24**	**vri 1-11-24**	
25	Asbestsanering (iov erfpachters)	2 wkn	maa 4-3-24	vri 15-3-24	VORM
26	Sloop (iov erfpachters)	5 wkn	maa 18-3-24	vri 19-4-24	VORM
27	Kappen bomen (iov gemeente)	1 wk	maa 22-7-24	vri 26-7-24	VORM
28	Verleggen MS-kabel (iov gemeente)	3 wkn	maa 26-8-24	vri 13-9-24	VORM
29	Levering erfpachtrechten (huidig naar VORM)	1 wk	maa 22-4-24	vri 26-4-24	VORM
30	Saneren	3 wkn	maa 29-4-24	vri 17-5-24	VORM
31	Ophogen	4 wkn	maa 6-5-24	vri 31-5-24	VORM
32	Voorbelasting	24 wkn	maa 20-5-24	vri 1-11-24	VORM
33	**BOUW (fasering nog af te stemmen)**	**935 dage**	**maa 2-12-24**	**vri 30-6-28**	
34	**FASE 1 (Toren, padel/tennis/parkeren, G-gebouwen, W3)**	**540 dage**	**maa 2-12-24**	**vri 25-12-26**	
35	Start bouw FASE I	0 dagen	maa 2-12-24	maa 2-12-24	VORM
36	Bouw FASE I (W3 - start juli 25)	108 wkn	maa 2-12-24	vri 25-12-26	VORM
37	Oplevering FASE I	0 dagen	vri 25-12-26	vri 25-12-26	VORM
38	**FASE 2 (W1, W2)**	**540 dage**	**maa 8-6-26**	**vri 30-6-28**	
39	Start bouw FASE II	0 dagen	maa 8-6-26	maa 8-6-26	VORM
40	Bouw FASE II (W3 - start juli 25)	108 wkn	maa 8-6-26	vri 30-6-28	VORM
41	Oplevering FASE II	0 dagen	vri 30-6-28	vri 30-6-28	VORM
42	**MAAIVELD, BRUGGEN & WATERCOMPENSATIE**	**1235 dage**	**din 2-1-24**	**vri 22-9-28**	
43	**MAAIVELD**	**1178 dage**	**don 21-3-24**	**vri 22-9-28**	
44	**DEFINITIEF MAAIVELDONTWERP**	**194 dage**	**don 21-3-24**	**din 17-12-24**	**GEMEENTE**
45	Opstellen definitief ontwerp openbare ruimte	27 wkn	don 21-3-24	woe 25-9-24	GEMEENTE
46	Aanleveren staf stadsdeel	0 dagen	woe 25-9-24	woe 25-9-24	GEMEENTE
47	staf stadsdeel	0 dagen	din 1-10-24	din 1-10-24	GEMEENTE
48	Dagelijks bestuur	0 dagen	din 8-10-24	din 8-10-24	GEMEENTE
49	Start ter inzage	0 dagen	maa 14-10-24	maa 14-10-24	GEMEENTE
50	Ter inzage termijn	6 wkn	maa 14-10-24	don 21-11-24	GEMEENTE
51	Input verwerken	1,8 wkn	vri 22-11-24	woe 4-12-24	GEMEENTE
52	Aanleveren staf stadsdeel	0 dagen	woe 4-12-24	woe 4-12-24	GEMEENTE
53	Staf Stadsdeel	0 dagen	din 10-12-24	din 10-12-24	GEMEENTE
54	Dagelijks bestuur (akkoord maaiveldontwerp)	0 dagen	din 17-12-24	din 17-12-24	GEMEENTE
55	**TIJDELIJK MAAIVELDONTWERP**	**260 dage**	**woe 1-1-25**	**din 30-12-25**	
56	Opstellen ontwerp openbare ruimte tijdelijke sitiuatie	52 wkn	woe 1-1-25	din 30-12-25	GEMEENTE
57	**VOORBEREIDING MAAIVELD**	**245 dage**	**din 14-10-25**	**maa 21-9-26**	
58	Technische uitwerking ontwerpen	10 wkn	din 14-10-25	maa 22-12-25	GEMEENTE
59	Bestek en tekeningen	17 wkn	din 23-12-25	maa 20-4-26	GEMEENTE
60	Aanbesteding en Gunning	17 wkn	din 21-4-26	maa 17-8-26	GEMEENTE
61	Voorbereiding uitvoering	5 wkn	din 18-8-26	maa 21-9-26	GEMEENTE

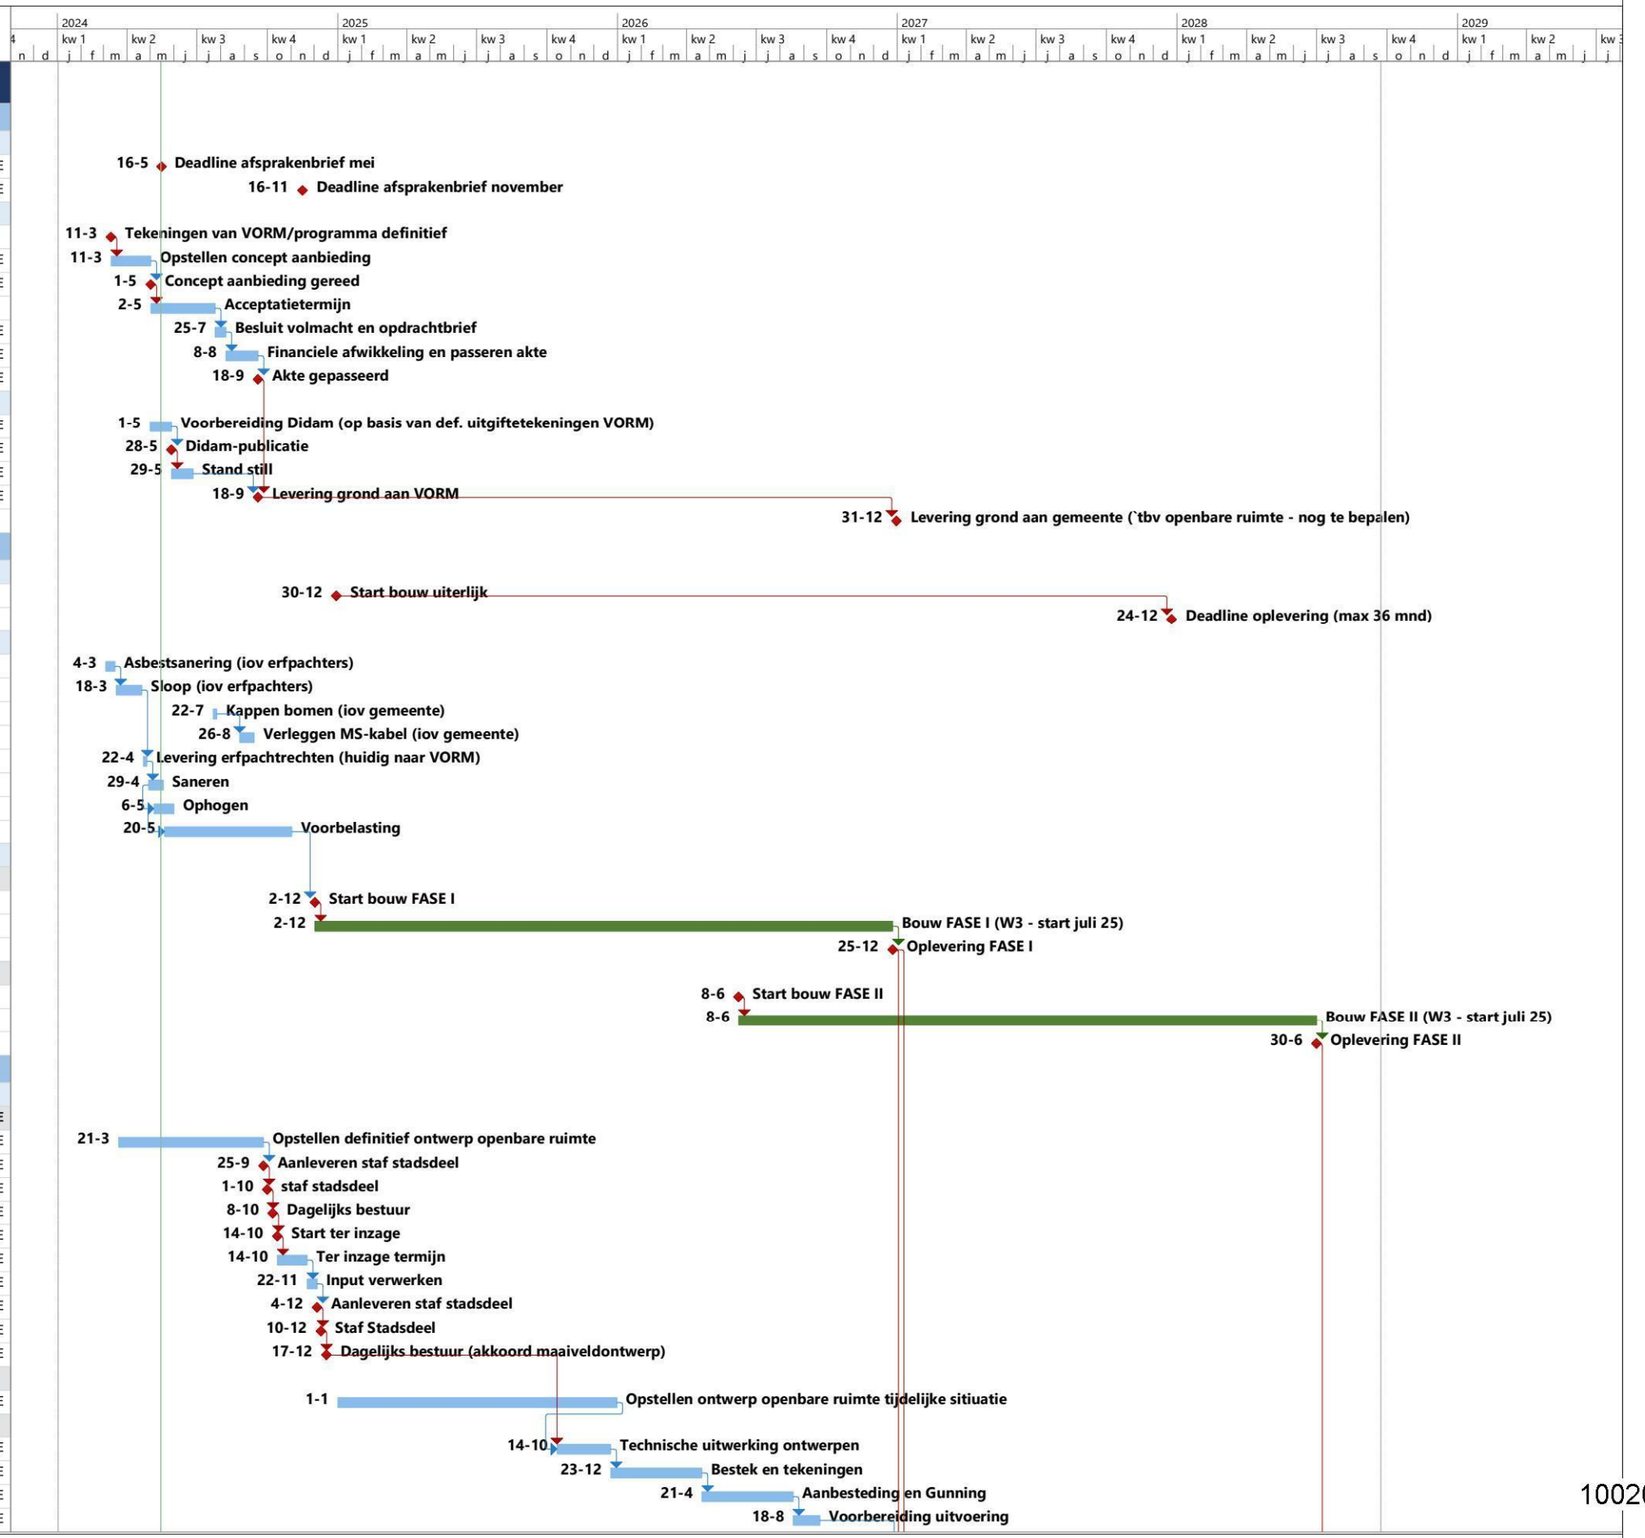

1002034

 DISCLAIMER indicatieve planning, aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend

Gemeente Amsterdam

INDICATIEVE PLANNING AFSPRAKENBRIEF - TENNISPARK SLOTERPLAS - ACE VORM

VERSIE woe 15-5-24

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum	Tekst1
62	**UITVOERING MAAIVELD (tijdelijk)**	**455 dager**	**maa 28-12-26**	**vri 22-9-28**	
63	Inrichten maaiveld FASE I (tijdelijk)	12 wkn	maa 28-12-26	vri 19-3-27	GEMEENTE
64	Inrichten maaiveld FASE II (tijdelijk)	12 wkn	maa 3-7-28	vri 22-9-28	GEMEENTE
65	**BRUGGEN**	**695 dager**	**din 2-1-24**	**vri 28-8-26**	
66	**AUTOBRUG N01 (naar voren gehaald ivm termijnen Vattenfall)**	**520 dager**	**din 26-3-24**	**vri 20-3-26**	
67	Opstellen PVE & ontwerp	28 wkn	din 26-3-24	maa 7-10-24	GEMEENTE
68	VO gereed	0 dagen	maa 7-10-24	maa 7-10-24	GEMEENTE
69	Opstellen DO	8 wkn	din 8-10-24	vri 29-11-24	GEMEENTE
70	Bestek en tekeningen	24 wkn	maa 2-12-24	vri 16-5-25	GEMEENTE
71	Omgevingsvergunning	8 wkn	maa 19-5-25	vri 11-7-25	GEMEENTE
72	Aanbesteding	12 wkn	maa 14-7-25	vri 3-10-25	GEMEENTE
73	Bouw brug	24 wkn	maa 6-10-25	vri 20-3-26	GEMEENTE
74	Koppeling Vattenfall	0 dagen	vri 20-3-26	vri 20-3-26	GEMEENTE
75	**BESTAANDE BRUG N02**	**695 dager**	**din 2-1-24**	**vri 28-8-26**	
76	NVU gereed	8 wkn	din 2-1-24	maa 26-2-24	GEMEENTE
77	Opstellen SO en VO	40 dagen	din 27-2-24	maa 22-4-24	GEMEENTE
78	Opstellen DO	40 dagen	din 23-4-24	maa 17-6-24	GEMEENTE
79	Bestek en tekeningen	24 wkn	maa 12-5-25	vri 24-10-25	GEMEENTE
80	Omgevingsvergunning	8 wkn	maa 27-10-25	vri 19-12-25	GEMEENTE
81	Aanbesteding	12 wkn	maa 22-12-25	vri 13-3-26	GEMEENTE
82	Aanpassen brug	24 wkn	maa 16-3-26	vri 28-8-26	GEMEENTE
83	**FIETSBRUG**	**0 dagen**	**maa 3-6-24**	**maa 3-6-24**	
84	Nog bepalen (bij definitieve datums bouw school)	0 dagen	maa 3-6-24	maa 3-6-24	GEMEENTE
85	**WATERCOMPENSATIE**	**165 dager**	**maa 12-8-24**	**don 27-3-25**	
86	Ontwerp, contract, vergunnning	20 wkn	maa 12-8-24	don 26-12-24	GEMEENTE
87	Aanbesteding	3 wkn	vri 27-12-24	don 16-1-25	GEMEENTE
88	Voorbereiding	6 wkn	vri 17-1-25	don 27-2-25	GEMEENTE
89	Uitvoering Watercompensatie	4 wkn	vri 28-2-25	don 27-3-25	GEMEENTE
90	**KABELS EN LEIDINGEN**	**713 dager**	**don 4-4-24**	**vri 25-12-26**	
91	**10 KV VERLEGGEN (zie ook boven bij VORM)**	**140 dager**	**maa 15-4-24**	**vri 25-10-24**	
92	Trace akkoord	0 dagen	maa 15-4-24	maa 15-4-24	VORM
93	Voorbereiding	6 mndn	maa 15-4-24	vri 27-9-24	VORM
94	Uitvoering (Liander)	4 wkn	maa 30-9-24	vri 25-10-24	VORM
95	**WENSTRACEPROCEDURE**	**713 dager**	**don 4-4-24**	**vri 25-12-26**	
96	Wenstraceprocedure tot Traceakkoord (vervroegd)	4 mndn	don 4-4-24	woe 24-7-24	GEMEENTE
97	Voorbereiding en aanbesteding nutswerken	15 mndn	don 6-2-25	woe 1-4-26	GEMEENTE
98	K&L aanleggen (steigervrij periode)	13 wkn	maa 28-9-26	vri 25-12-26	GEMEENTE
99	**VATTENFALL (VOORAANLEG)**	**351 dager**	**woe 6-8-25**	**woe 9-12-26**	
100	Verwijderen gietijzeren leidingen Vermeylenstraat (voor start sto	8 wkn	woe 6-8-25	din 30-9-25	GEMEENTE
101	Stookseizoen	153 dager	woe 1-10-25	vri 1-5-26	GEMEENTE
102	Stroom Vattenfall via brug & warmteleiding door Vermeylenstraa	3 mndn	don 2-4-26	woe 24-6-26	GEMEENTE
103	Inregelen Vattenfall	6 mndn	don 25-6-26	woe 9-12-26	GEMEENTE

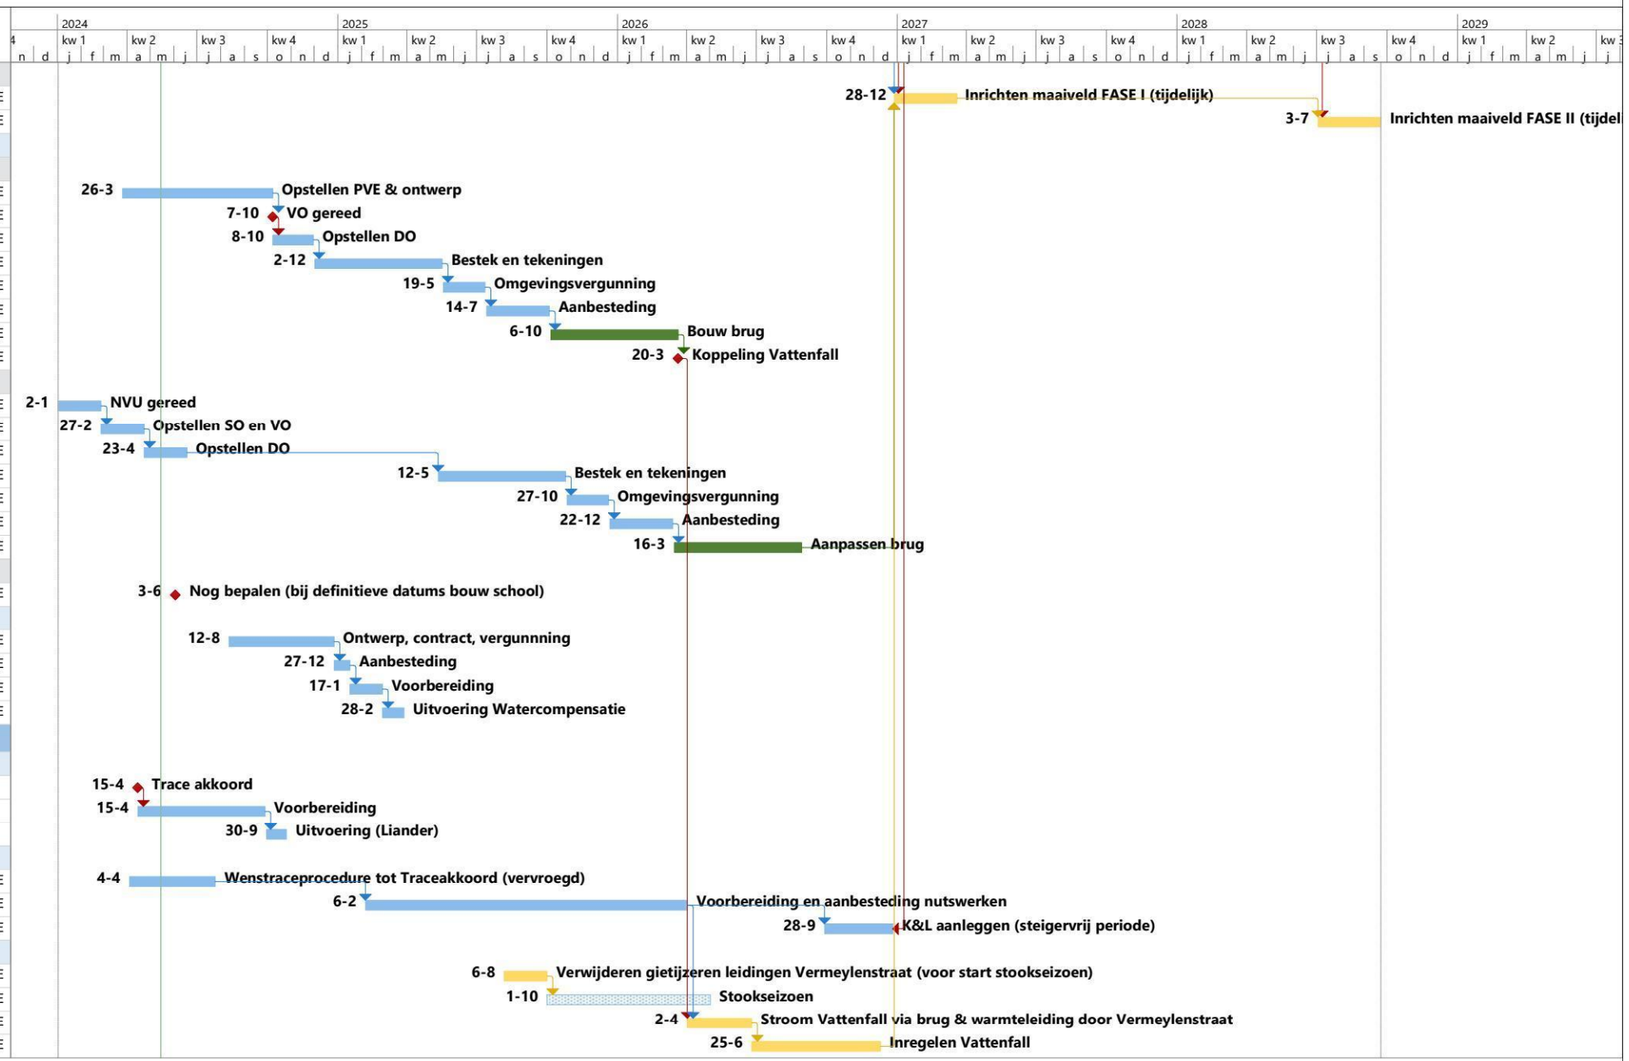

1002034

 DISCLAIMER indicatieve planning, aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend
