Gemeente Amsterdam

Sluisbuurt Kavelplanningen

Activiteitnaam	Start	Eind	Duur
ZBE/SB/RF2/4B1 Zeeburgereiland/Sluisbuurt/RF2/Kavel 4B1 (onbekend)	23-09-22 A	20-08-27	1281
ZBE/SB/RF2/4B1.Voorbereiding Tender (New WBS)			0
ZBE/SB/RF2/4B1.Tender (New WBS)-1	23-09-22 A	21-06-24	456
Optieperiode (21 mnd)	23-09-22 A	21-06-24	456
ZBE/SB/RF2/4B1.Contractafspraken (New WBS)-3	21-02-25	20-08-27	650
Uiterlijk moment start bouw		21-02-25*	0
Uiterlijk moment oplevering		20-08-27*	0
ZBE/SB/RF2/4B1.Planvorming (New WBS)-2	23-09-22 A	28-06-24	461
Opstellen VO	23-09-22 A	23-03-23	130
Toets VO	24-03-23	04-05-23	30
Aanpassen VO na toets	05-05-23	15-06-23	30
Opstellen DO	16-06-23	15-12-23	131
Toets DO	18-12-23	12-01-24	20
Aanpassen DO na toets	15-01-24	09-02-24	20
Aanvraag Omgevingsvergunning	12-02-24		0
Procedure omgevingsvergunning	12-02-24	17-05-24	70
bezwaartermijn	20-05-24	28-06-24	30
Omgevingsvergunning onherroepelijk		28-06-24	0
ZBE/SB/RF2/4B1.Erfpachtaanbieding (New WBS)-4	15-01-24	22-08-24	158
Opstellen en versturen EPA	15-01-24	22-03-24	50
acceptatietermijn EPA	25-03-24	19-04-24	20
Acceptatie EPA		22-06-24*	0
Ingangsdatum erfpacht	22-08-24*		0
ZBE/SB/RF2/4B1.Grondoverdracht (New WBS)-6	24-06-24	30-08-24	50
Start grondoverdracht	24-06-24		0
Opstellen concept overdrachtsakte	24-06-24	19-07-24	20
Toetsen concept overdrachtsakte door PrT 4b1	22-07-24	16-08-24	20
Verwerken opmerkingen en vaststellen Overdrachtsakte door Planteam SB	19-08-24	23-08-24	5
(Bouwrijpe) grond overdragen (smp3)		30-08-24	0
Afhandelen financien	26-08-24	30-08-24	5
ZBE/SB/RF2/4B1.Realisatie (New WBS)-5	02-09-24	27-03-26	410
Start bouw Vastgoed	02-09-24		0
Start steigervrije periode (smp4) (geen harde afspraak)	29-12-25		0
Bouwen vastgoed kavel 4B1	02-09-24	27-03-26	410
Oplevering Vastgoed (smp5)		27-03-26	0

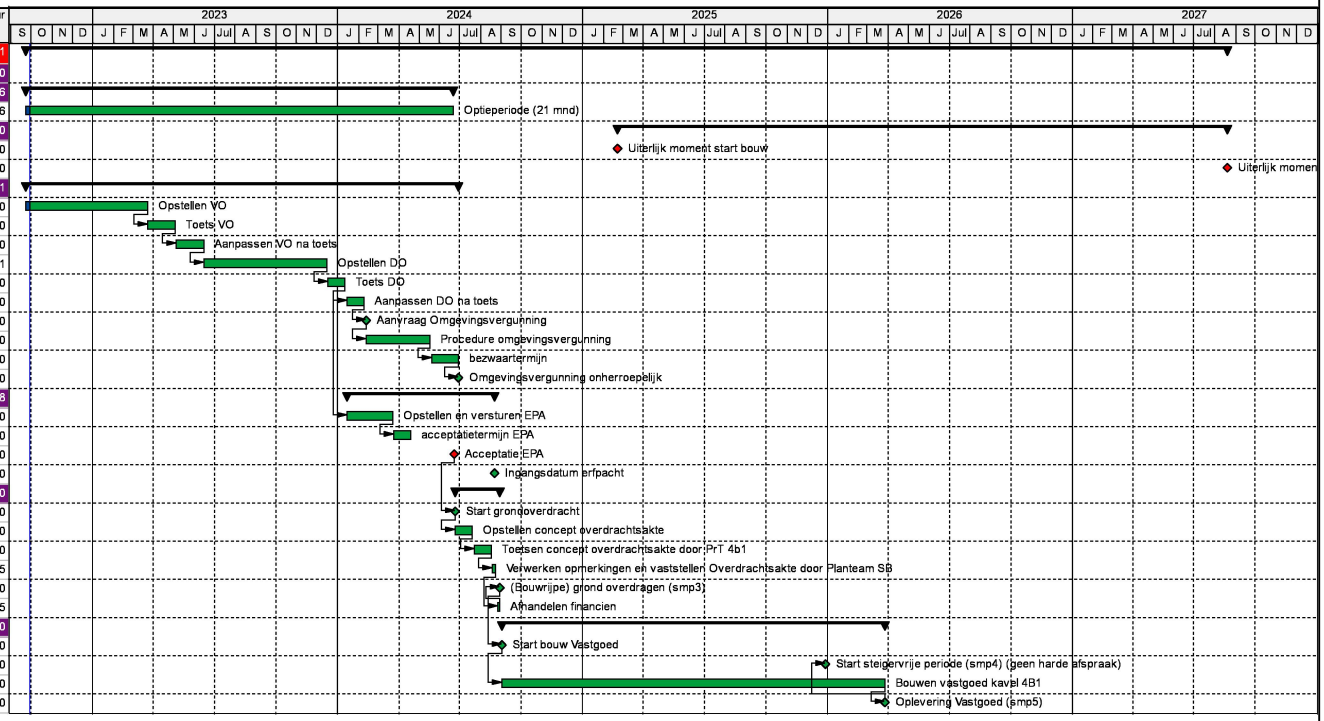

Samenvatting
Werk gereed
Mijlpaal gereed
Werk gepland
Mijlpaal gepland
Level of Effort
Werk kritiek
Mijlpaal kritiek

Planningsadviseur 5.1, 2, e
Printdatum: 27-09-22
Standlijndatum: 30-09-22
