OVERALL PLANNING

19.0530 Prinses Irenestraat 59 Amsterdam -CONCEPT-

Versie 4.0 / 12-04-2022

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	**Voorbereiding**	**95 dagen**	**maa 6-12-21**	**vri 29-4-22**
2	Sloopmelding verleend	1 dag	maa 6-12-21	maa 6-12-21
3	Informeren omgeving door opdrachtnemer	2 dagen	maa 25-4-22	din 26-4-22
4	Bouwkundige vooropname	5 dagen	maa 14-3-22	vri 18-3-22
5	Installaties afkoppelen en omzetten naar bouwaansluitingen door WZ	5 dagen	maa 25-4-22	vri 29-4-22
6	Plaatsen trilling- en geluidsmeters (Alcedo)	1 dag	woe 20-4-22	woe 20-4-22
7	**Bouwplaatsinrichting (Wessels Zeist)**	**5 dagen**	**maa 25-4-22**	**vri 29-4-22**
8	Inrichten werkterrein	5 dagen	maa 25-4-22	vri 29-4-22
9	**Bouwplaatsinrichting**	**46 dagen**	**vri 25-2-22**	**vri 29-4-22**
10	Inrichten werkterrein / plaatsen hekken WZ	1 dag	don 14-4-22	don 14-4-22
11	Inrichten werkterrein Beelen / plaatsen keten	5 dagen	maa 25-4-22	vri 29-4-22
12	Inrit werkterrein gereed (Gemeente Amsterdam)	1 dag	vri 25-2-22	vri 25-2-22
13	**Asbestsanering en stripsloop**	**75 dagen**	**maa 25-4-22**	**vri 5-8-22**
14	Validatie - bronnen gevel	5 dagen	maa 25-4-22	vri 29-4-22
15	Transportopening linker- en achtergevel	5 dagen	maa 25-4-22	vri 29-4-22
16	**Kelder L + R**	15 dagen	maa 2-5-22	vri 20-5-22
17	**Kelder R**	15 dagen	maa 13-6-22	vri 1-7-22
18	Uitsloop verdieping+hakken vloergoten	10 dagen	maa 2-5-22	vri 17-6-22
19	RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105	20 dagen	maa 9-5-22	vri 1-7-22
20	**Begane Grond L**	23 dagen	maa 2-5-22	woe 1-6-22
21	**Begane Grond R**	20 dagen	maa 13-6-22	vri 8-7-22
22	Uitsloop verdieping+hakken vloergoten	20 dagen	maa 9-5-22	vri 24-6-22
23	Plafond asbestvrij maken	3 dagen	maa 2-5-22	woe 4-5-22
24	RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 700 m1 kit / 165 m1 gevel	15 dagen	maa 9-5-22	din 21-6-22
25	RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105	20 dagen	don 19-5-22	vri 8-7-22
26	**1e verdieping L**	17 dagen	don 19-5-22	vri 10-6-22
27	**1e verdieping R**	20 dagen	maa 2-5-22	vri 27-5-22
28	Uitsloop verdieping+hakken vloergoten	20 dagen	maa 16-5-22	vri 1-7-22
29	Plafond asbestvrij maken	3 dagen	don 5-5-22	maa 9-5-22
30	RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 725 m1 kit / 170 m1 gevel	15 dagen	maa 16-5-22	woe 29-6-22
31	RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105	20 dagen	woe 25-5-22	vri 15-7-22
32	**2e verdieping L**	15 dagen	maa 23-5-22	vri 10-6-22
33	**2e verdieping R**	20 dagen	maa 27-6-22	vri 22-7-22
34	Uitsloop verdieping+hakken vloergoten	20 dagen	maa 23-5-22	vri 8-7-22
35	Plafond asbestvrij maken	3 dagen	din 10-5-22	don 12-5-22
36	RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 490 m1 kit / 115 m1 gevel	10 dagen	maa 23-5-22	vri 1-7-22
37	RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105	20 dagen	maa 30-5-22	vri 22-7-22
38	**3e verdieping L**	17 dagen	maa 30-5-22	din 21-6-22
39	**3e verdieping R**	20 dagen	maa 4-7-22	vri 29-7-22
40	Uitsloop verdieping+hakken vloergoten	20 dagen	maa 30-5-22	vri 15-7-22
41	Plafond asbestvrij maken	3 dagen	vri 13-5-22	din 17-5-22
42	RK1 Kit binnengevels Abm/008 - 870 m1 kit / 205 m1 gevel	18 dagen	maa 30-5-22	woe 13-7-22
43	RK1val - stortstroken - Abm/101 + 103 + 104 + 105	20 dagen	woe 8-6-22	vri 29-7-22
44	**4e verdieping**	51 dagen	maa 2-5-22	maa 11-7-22
45	RK2 buiten gevelbeplating dakopbouw - bron Abm/001	6 dagen	maa 4-7-22	maa 11-7-22
46	Technische ruimte	25 dagen	maa 2-5-22	vri 3-6-22
47	**Trappenhuizen**	45 dagen	maa 2-5-22	vri 1-7-22
48	Trappenhuis rechts	15 dagen	maa 2-5-22	vri 20-5-22
49	Trappenhuis midden	15 dagen	maa 23-5-22	vri 10-6-22
50	Trappenhuis links	15 dagen	maa 13-6-22	vri 1-7-22
51	**Gevels**	30 dagen	maa 27-6-22	vri 5-8-22
52	Gevel - bron Abm/002 + 003 + 004 + 007 + 011 (335m1 per verd)			
53	Achtergevel	10 dagen	maa 27-6-22	vri 8-7-22
54	Rechterzijgevel	5 dagen	maa 11-7-22	vri 15-7-22
55	Linkerzijgevel	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22
56	Voorgevel	10 dagen	maa 25-7-22	vri 5-8-22
57	**Verw. trappen hoofdtrappenhuis**	**10 dagen**	**maa 11-7-22**	**vri 22-7-22**
58	Verwijderen betontrappen	10 dagen	maa 11-7-22	vri 22-7-22
59	**Totaalsloop**	**30 dagen**	**maa 4-7-22**	**vri 12-8-22**
60	Verwijderen hoofdentree voorgevel	5 dagen	maa 4-7-22	vri 8-7-22
61	Souterrain WZ: aanbrengen damwand t.b.v. hellingbaan (10 m1/dag) 80 m1	10 dagen	maa 11-7-22	vri 22-7-22
62	Souterrain WZ: bemaling en grondwerk t.b.v. hellingbaan	5 dagen	maa 25-7-22	vri 29-7-22
63	Souterrain BSW: Verwijderen hellingbaan achterzijde	10 dagen	maa 1-8-22	vri 12-8-22
64	**Gevelsloop (m.b.v. sloopkraan)**	**30 dagen**	**maa 4-7-22**	**vri 12-8-22**
65	Verwijderen achtergevel	10 dagen	maa 4-7-22	vri 15-7-22
66	Verwijderen rechterzijgevel	5 dagen	maa 18-7-22	vri 22-7-22
67	Verwijderen linkergevel	5 dagen	maa 25-7-22	vri 29-7-22
68	Verwijderen voorgevel	10 dagen	maa 1-8-22	vri 12-8-22
69	Aanbrengen randbeveiliging WZ	15 dagen	maa 4-7-22	vri 22-7-22
70	**Constructief sloopwerk**	**45 dagen**	**maa 4-7-22**	**vri 2-9-22**
71	BG: WZ maatv. + aanbrengen staalconstructie	15 dagen	maa 1-8-22	vri 19-8-22
72	BG: verwijderen vloer beton 225 m2 (gevel is verwijderd)	10 dagen	maa 22-8-22	vri 2-9-22
73	Souterrain WZ: achtergevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1	**5 dagen**	**maa 25-7-22**	**vri 29-7-22**
74	Souterrain WZ: achtergevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor	5 dagen	maa 1-8-22	vri 5-8-22
75	Souterrain BSW: achtergevel verw. kelderwand beton gardenfloor	5 dagen	maa 8-8-22	vri 12-8-22
76	Souterrain WZ: rechterzijgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 50m1	5 dagen	maa 1-8-22	vri 5-8-22
77	Souterrain WZ: rechterzijgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor	5 dagen	maa 8-8-22	vri 12-8-22
78	Souterrain BSW: rechterzijgevel verw. kelderwand beton gardenfloor	5 dagen	maa 15-8-22	vri 19-8-22
79	Souterrain WZ: voorgevel - damwand t.b.v. gardenfloor (10 m1/dag) 30m1	2 dagen	maa 8-8-22	din 9-8-22
80	Souterrain WZ: voorgevel - bemaling en grondwerk t.b.v. gardenfloor	2 dagen	woe 10-8-22	don 11-8-22
81	Souterrain BSW: voorgevel verw. kelderwand beton gardenfloor	5 dagen	vri 12-8-22	don 18-8-22
82	Zaagwerk dakrand achtergevel	3 dagen	maa 18-7-22	woe 20-7-22
83	Zaagwerk dakrand linker- en rechterzijgevel, voorgevel	5 dagen	maa 22-8-22	vri 26-8-22
84	WZ: maatvoering vloersparingen + aanbr. staalconstructie	10 dagen	maa 4-7-22	vri 15-7-22
85	Vloersparingen overig	20 dagen	maa 18-7-22	vri 12-8-22
86	**Oplevering t.b.v. start bouw**	**4 dagen**	**maa 29-8-22**	**don 1-9-22**
87	Narooien verdiepingen en opruimen werkterrein	3 dagen	maa 29-8-22	woe 31-8-22
88	Overdracht Wessels Zeist	1 dag	don 1-9-22	don 1-9-22
89	**Werkzaamheden na 01-09-2022**	**10 dagen**	**maa 5-9-22**	**vri 16-9-22**
90	Verwijderen terreinverhardingen	10 dagen	maa 5-9-22	vri 16-9-22
91	Dak: Hakken dakvloer en tegelvloer dakopbouw	10 dagen	maa 5-9-22	vri 16-9-22

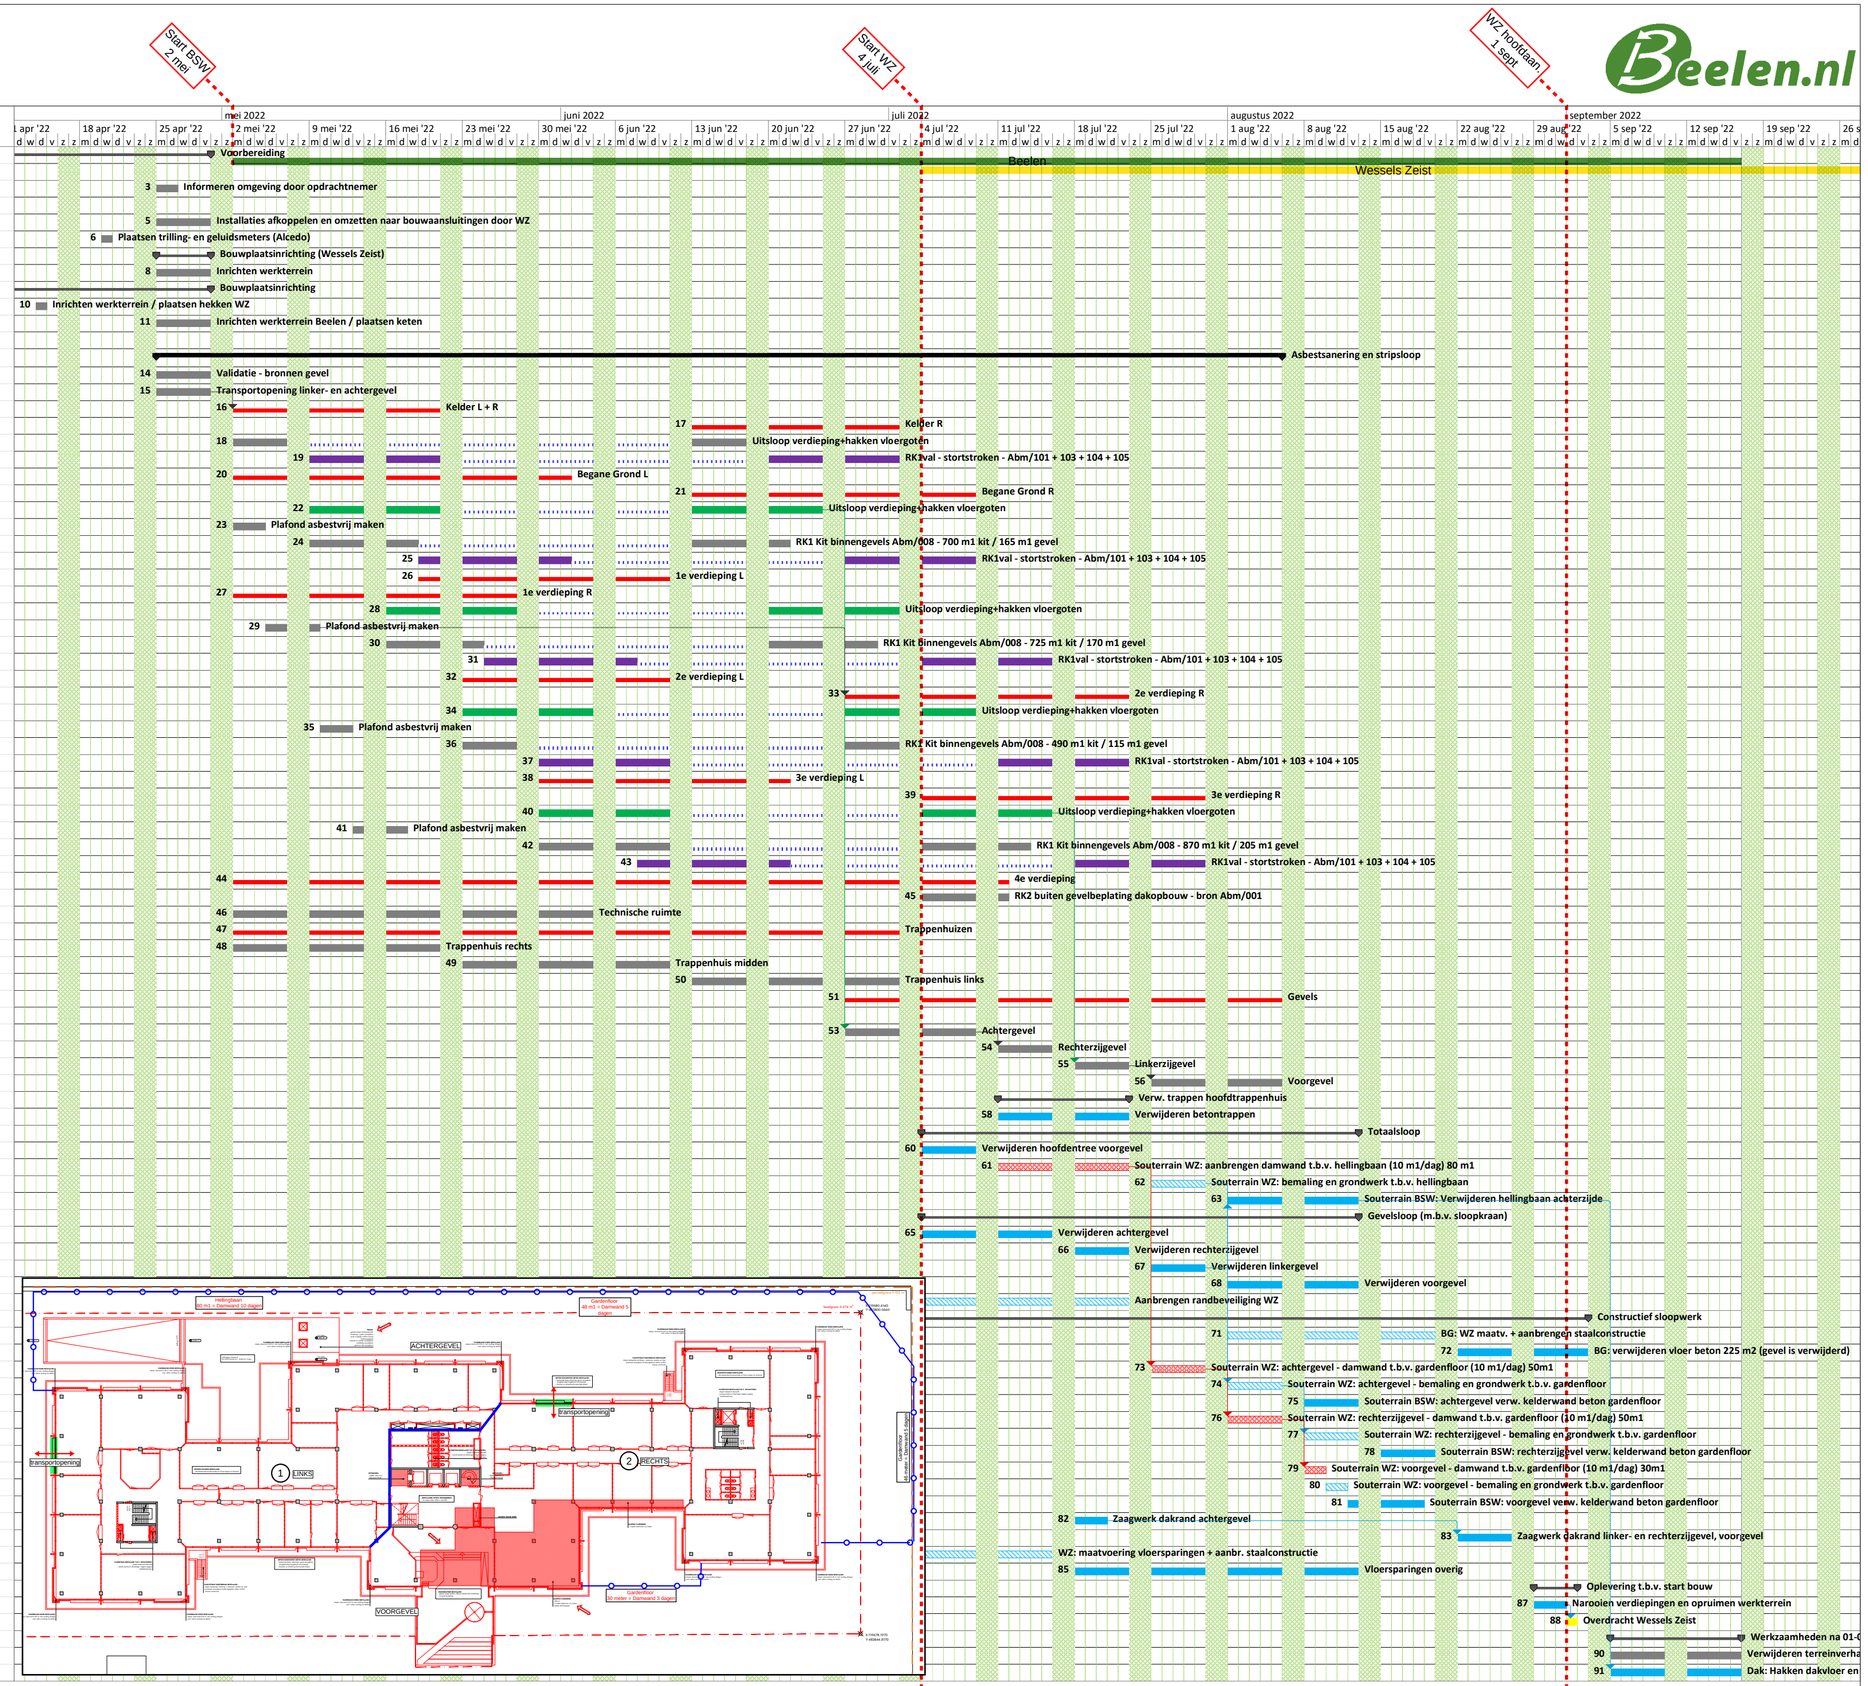

BSW - Overall planning
12-04-2022
