Ontwikkel- en realisatieplanning PUA (Kavel E)
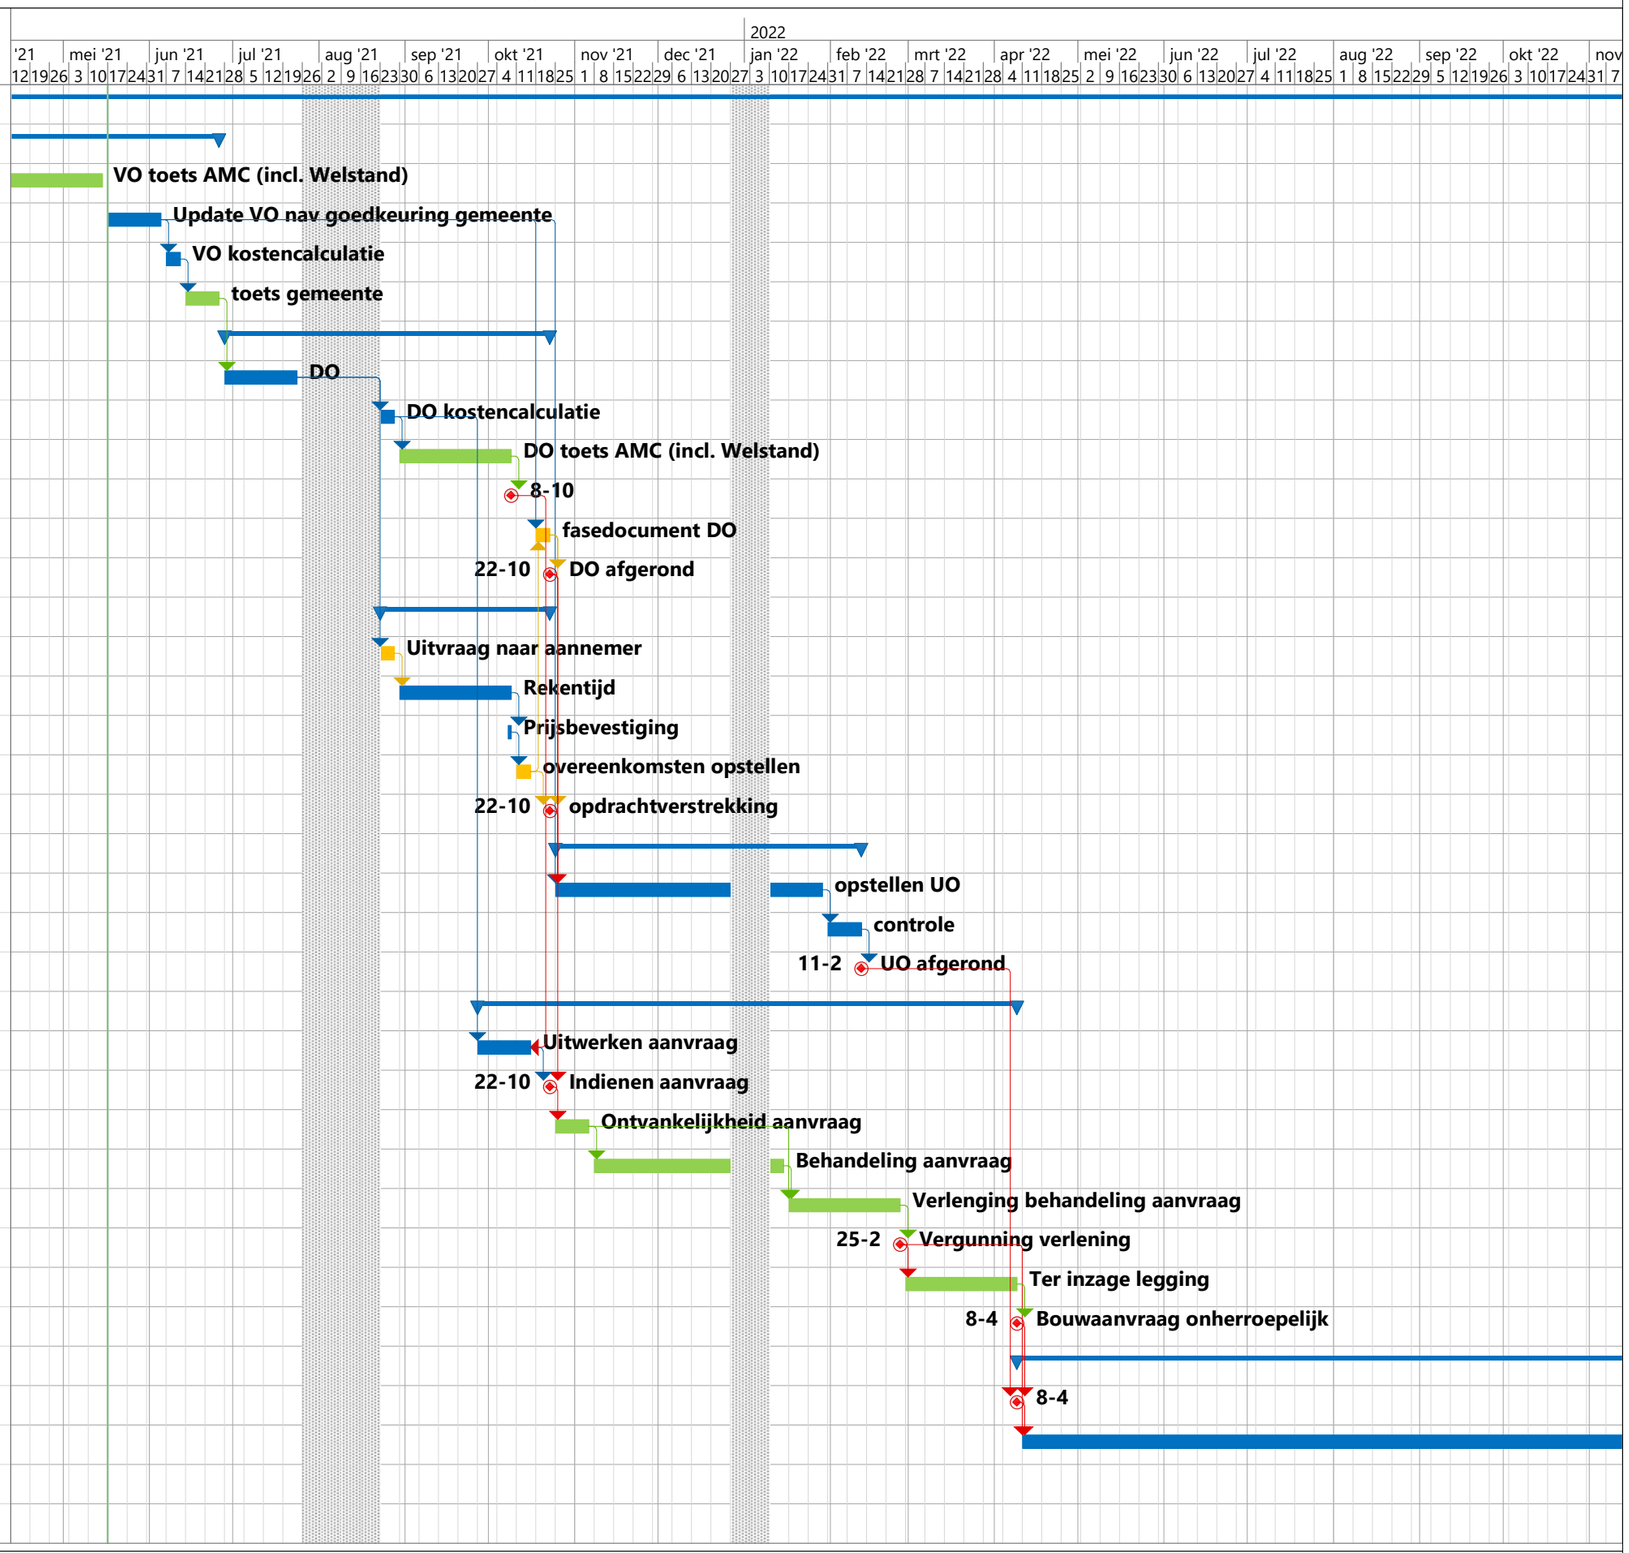
Id	Taaknaam	Begindatum	Duur	Einddatum
1	**Nieuwbouw Plus Ultra Amsterdam**	**maa 11-1-21**	**615 d**	**vri 30-6-23**
2	**VO fase**	**maa 11-1-21**	**120 d**	**vri 25-6-21**
3	VO toets AMC (incl. Welstand)	maa 11-1-21	90 d	vri 14-5-21
4	Update VO nav goedkeuring gemeente	maa 17-5-21	3 w	vri 4-6-21
5	VO kostencalculatie	maa 7-6-21	5 d	vri 11-6-21
6	toets gemeente	maa 14-6-21	10 d	vri 25-6-21
7	**DO fase**	**maa 28-6-21**	**65 d?**	**vri 22-10-21**
8	DO	maa 28-6-21	20 d	vri 23-7-21
9	DO kostencalculatie	maa 23-8-21	5 d	vri 27-8-21
10	DO toets AMC (incl. Welstand)	maa 30-8-21	6 w	vri 8-10-21
11	DO goedkeuring AMC/Gemeente	vri 8-10-21	0 w	vri 8-10-21
12	fasedocument DO	maa 18-10-21	5 d?	vri 22-10-21
13	DO afgerond	vri 22-10-21	0 d	vri 22-10-21
14	**Inkoop Bouwteam**	**maa 23-8-21**	**45 d**	**vri 22-10-21**
15	Uitvraag naar aannemer	maa 23-8-21	1 w	vri 27-8-21
16	Rekentijd	maa 30-8-21	6 w	vri 8-10-21
17	Prijsbevestiging	vri 8-10-21	0,2 w	vri 8-10-21
18	overeenkomsten opstellen	maa 11-10-21	1 w	vri 15-10-21
19	opdrachtverstrekking	vri 22-10-21	0 d	vri 22-10-21
20	**UO fase**	**maa 25-10-21**	**70 d**	**vri 11-2-22**
21	opstellen UO	maa 25-10-21	12 w	vri 28-1-22
22	controle	maa 31-1-22	2 w	vri 11-2-22
23	UO afgerond	vri 11-2-22	0 d	vri 11-2-22
24	**Omgevingsvergunning**	**maa 27-9-21**	**130 d**	**vri 8-4-22**
25	Uitwerken aanvraag	maa 27-9-21	3 w	vri 15-10-21
26	Indienen aanvraag	vri 22-10-21	0 d	vri 22-10-21
27	Ontvankelijkheid aanvraag	maa 25-10-21	2 w	vri 5-11-21
28	Behandeling aanvraag	maa 8-11-21	8 w	vri 14-1-22
29	Verlenging behandeling aanvraag	maa 17-1-22	6 w	vri 25-2-22
30	Vergunning verlening	vri 25-2-22	0 d	vri 25-2-22
31	Ter inzage legging	maa 28-2-22	6 w	vri 8-4-22
32	Bouwaanvraag onherroepelijk	vri 8-4-22	0 d	vri 8-4-22
33	**Realisatie**	**vri 8-4-22**	**320 d**	**vri 30-6-23**
34	Start bouw	vri 8-4-22	0 d	vri 8-4-22
35	Realisatie	maa 11-4-22	15 ma	vri 2-6-23
36	Oplevering	maa 5-6-23	1 ma	vri 30-6-23
37	**Huurder specifiek**	**vri 30-6-23**	**0 d**	**vri 30-6-23**
