Week

FREMON BEHOUD B.V.

Duur van planning % voltooid
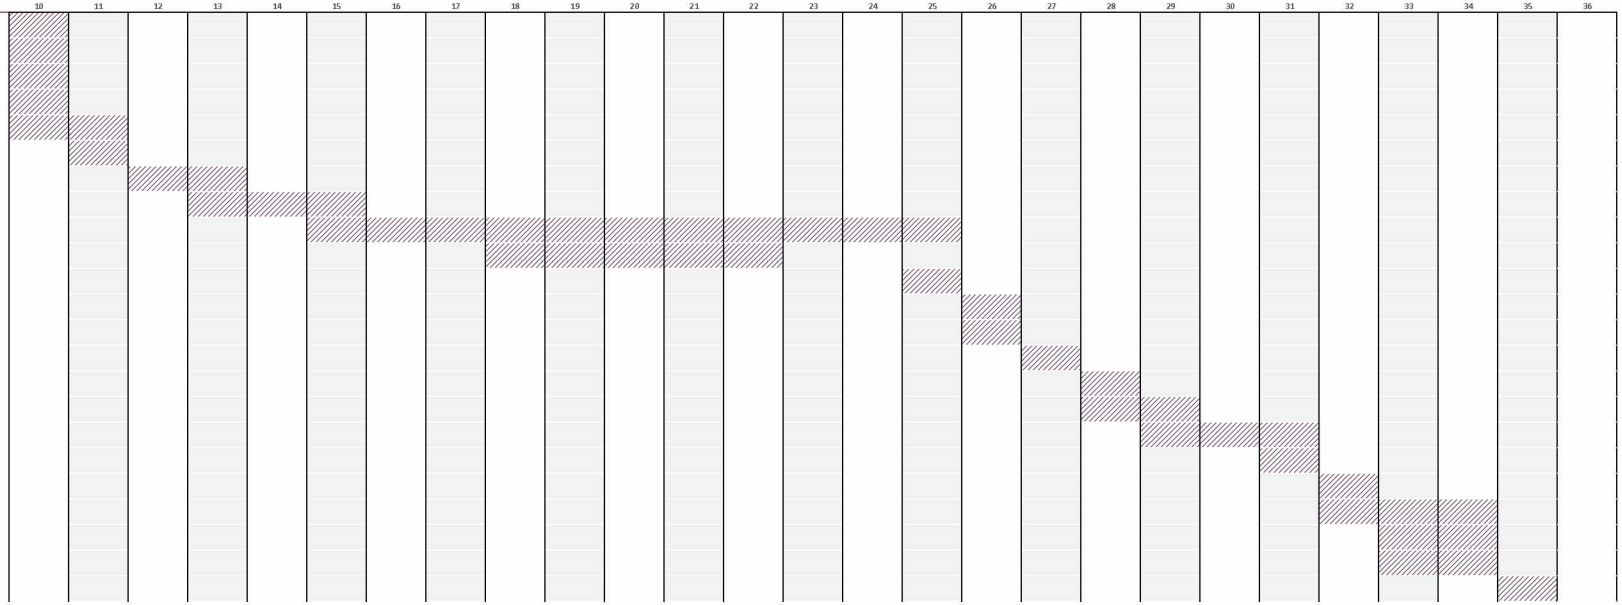
ACTIVITEIT	BEGIN VAN PLANNING	DUUR VAN PLANNING	PERCENTAGE VOLTOOID
Inrichten/voorbereiden werkterrein	10	1	0%
Verwijderen borstwering voorgevel 105	10	1	0%
Aanbrengen noodbescherming	10	1	0%
Casco sloop begane grond	10	1	0%
Verwijderen bestaande begane grond vloer	10	2	0%
Verwijderen bodemafsluiter t.b.v. de palen	11	1	0%
Aanbrengen schroefinjectiepalen	12	2	0%
Inbrengen tijdelijke stutconstructie	13	3	0%
Ontgraven tot eindniveau	15	11	0%
Inbrengen damwanden	18	5	0%
Storten werkvloer	25	1	0%
Vlechtwerkzaamheden constructievloer	26	1	0%
Storten constructievloer	26	1	0%
Hakken inkassingen	27	1	0%
Vlechtwerkzaamheden wanden	28	1	0%
Verwijderen cementsluier	28	2	0%
Bekisting aanbrengen	29	3	0%
Storten wanden	31	1	0%
Ontkisten en opruimen	32	1	0%
Inbrengen staalwerk	32	3	0%
Verwijderen tijdelijke stutconstructie	33	2	0%
Inbrengen begane grond vloeren	33	2	0%
Oplevering	35	1	0%
