Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors	% Complete	Resource Names
1	**Project WRM rijweg AUMC**	**275 days**	**Thu 21-4-22**	**Wed 10-5-23**		**17%**	
2	**Onderzoeken en adviezen**	**90 days**	**Mon 9-5-22**	**Fri 9-9-22**		**20%**	
3	Vergunningenscan	2 wks	Mon 15-8-22	Fri 26-8-22		0%	
4	Aanvraag vergunningen	2 wks	Mon 29-8-22	Fri 9-9-22	3	0%	
5	evt onderzoeken zijn niet ingepland**	0 days				0%	
6	Opstellen Inkoopstrategie	2 wks	Mon 9-5-22	Fri 20-5-22		100%	
7	**Verlichtingsplan***	**35 days**	**Mon 11-7-22**	**Fri 26-8-22**		**13%**	
8	Lichtberekening en ontwerp concept	2 wks	Mon 11-7-22	Fri 22-7-22		50%	
9	Toetsronde	1 wk	Mon 8-8-22	Fri 12-8-22	8	0%	
10	Lichtberekening en ontwerp definitief	2 wks	Mon 15-8-22	Fri 26-8-22	9	0%	
11	bekabelingsplan concept	6 wks	Mon 11-7-22	Fri 19-8-22		10%	
12	Bespreken bekabelingsplan (k&l overleg)	1 wk	Mon 22-8-22	Fri 26-8-22	11	0%	
13	Verhardingsadvies (concept-toets-definitief)	7 wks	Mon 4-7-22	Fri 19-8-22		20%	
14	**Besteksfase**	**73 days**	**Mon 27-6-22**	**Wed 5-10-22**		**21%**	
15	Bestekschrijver op vakantie	3 wks	Mon 1-8-22	Fri 19-8-22		0%	
16	Ontwerper op vakantie: onbekend: juli/augustus ergens 2weken	0 days				0%	
17	Reces Inkoop Fysiek	5 wks	Mon 18-7-22	Fri 19-8-22		0%	
18	Concept bestekstekeningen	3 wks	Mon 27-6-22	Fri 15-7-22		90%	
19	Concept bestek	2 wks	Mon 11-7-22	Fri 22-7-22	18FS-5 days	90%	
20	Toets intern RHDHV	3 wks	Mon 8-8-22	Fri 26-8-22	18;19	0%	
21	Verwerken opmerkingen+kostenraming	3 days	Mon 29-8-22	Wed 31-8-22	20;15	0%	
22	Toets AUMC, Amsterdam	1 wk	Thu 1-9-22	Wed 7-9-22	21	0%	
23	Verwerken toets+kostenraming	1 wk	Thu 8-9-22	Wed 14-9-22	22	0%	
24	Toets Inkoop Fysiek	2 wks	Thu 15-9-22	Wed 28-9-22	23;17	0%	
25	Vewerken toets IF+kostenraming+beheerkostenraming	1 wk	Thu 29-9-22	Wed 5-10-22	24	0%	
26	**Aanbesteding**	**118 days**	**Mon 23-5-22**	**Wed 2-11-22**	**14**	**5%**	
27	Selecteren SOK partner (elementenverharding)	1 wk	Mon 23-5-22	Fri 27-5-22	6	100%	
28	Meenemen in advisering en toetsing b&t	68 days	Mon 27-6-22	Wed 28-9-22	14SS	0%	
29	Start overleg IB-SOK partner en toets concept b&t	3 wks	Mon 8-8-22	Fri 26-8-22		0%	
30	Prijsvorming	4 wks	Thu 6-10-22	Wed 2-11-22	28;25	0%	
31	**Wenstracé**	**195 days**	**Thu 21-4-22**	**Wed 18-1-23**		**28%**	
32	Akkoord wenstracé	5 wks	Thu 21-4-22	Wed 25-5-22		100%	
33	Tracé akkoord	2 wks	Thu 26-5-22	Wed 8-6-22	32	50%	
34	DTA	0 days	Thu 9-6-22	Thu 9-6-22	33	100%	
35	Voorbereidingstijd	8 mons	Thu 9-6-22	Wed 18-1-23	34	15%	
36	**Uitvoering**	**135 days**	**Thu 3-11-22**	**Wed 10-5-23**		**0%**	
37	Voorbereiding SOK aannemer	4 wks	Thu 3-11-22	Wed 30-11-2	30	0%	29
38	k&l werkzaamheden	8 wks	Thu 19-1-23	Wed 15-3-23	37;35	0%	
39	aanleggen rijweg en voetpaden (SOK aannemer)	8 wks	Thu 16-3-23	Wed 10-5-23	38	0%	
40							
41							
42	* alleen rijweg					0%	
43	**uitgangspunt is dat er geen aanvullende onderzoeken dienen te worden uitgevoerd die invloed hebben op b&t					0%	

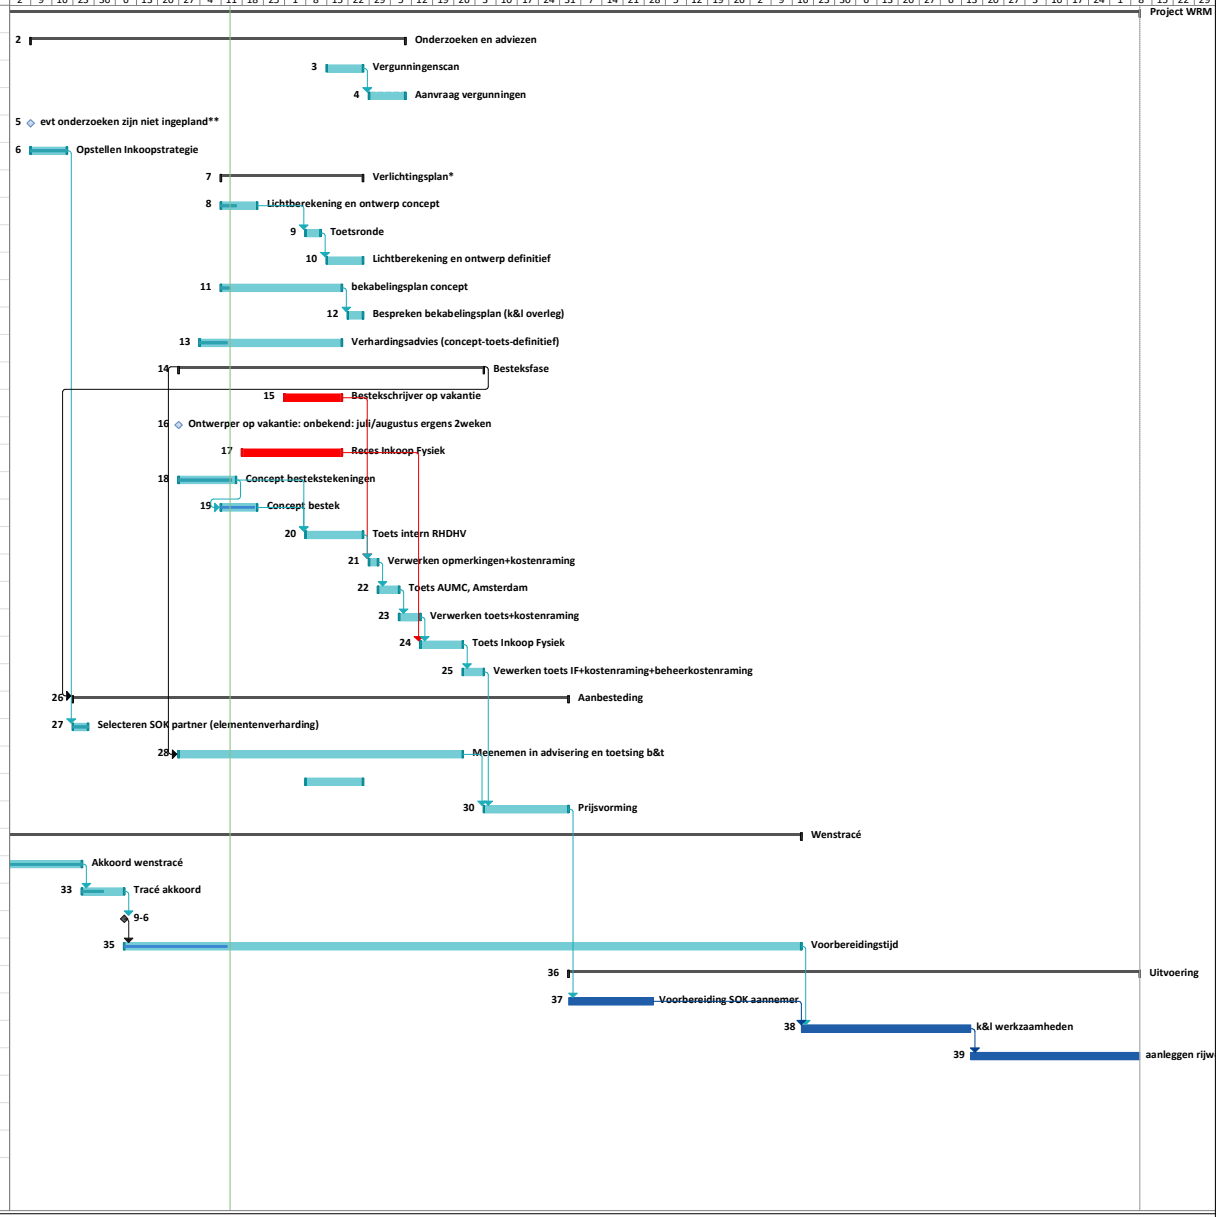

Project: BH8145-C0.1 Planning W
Date: Thu 14-7-22

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | External Tasks | External Milestone | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | Deadline | Progress | Manual Progress
