Gemeente Amsterdam

Zeeburgereiland/Sluisbuurt/RF2/Kavel 4B1

Subtitel

ID	Activiteitnaam	Duur	Begin	Eind	Speling
ZBE/SB/RF2/4B1	Zeeburgereiland/Sluisbuurt/RF2/Kavel 4	1340	18-08-20 A	06-10-25	0
ZBE - Sluisbuurt overall_new: kavel	Kavelontwikkeling	1340	18-08-20 A	06-10-25	0
ZBE - Sluisbuurt overall_new: kavel.BE	Opstellen bouwenvelop	320	18-08-20 A	08-11-21	0
A1270	Opstellen BE (95% versie)	270	18-08-20 A	31-08-21	0
A1280	Afstemmen BE en selectieprocedure	5	31-08-21	06-09-21	0
A1290	Indienen 95% versie BE in toetsteam	0	07-09-21		0
A1300	Toets BE	20	07-09-21	04-10-21	0
A1310	Verwerken opmerkingen toetsteam	25	05-10-21	08-11-21	0
A1170	Vaststellen BE in planteam	0		08-11-21	0
ZBE - Sluisbuurt overall_new: kavel.tender	Tender en contractvor	852	23-11-20 A	27-02-24	9
A1140	Opstellen strategienotitie tender	201	23-11-20 A	31-08-21	1
A1020	Opstellen selectiebrochure (mogelijke korter	55	28-06-21 A	10-09-21	1
A1240	Startgesprek tenderstrategie	0		31-08-21	1
A3320	Integraal advies selectiebrochure	0		10-09-21	1
A1150	Aanvraag GPA	0	13-09-21		41
A1320	GPA gereed (3 mnd geldig!)	0		13-09-21	41
A1160	Afronden selectiebrochure en bijlagen (moge	40	14-09-21	08-11-21	0
A1250	Definitieve beoordeling en screening	15	09-11-21	29-11-21	0
A1180	Start tenderprocedure	0	30-11-21		0
A1010	Selectieprocedure (op kwaliteit - in 2 rondes)	180	30-11-21	08-08-22	0
A6850	Voorlopdige gunning	0		08-08-22	0
A1330	bezwaartermijn (20 dgn) (datum onjuist. che	15	09-08-22	29-08-22	0
A1200	Definitieve gunning	0		29-08-22	0
A1340	Optieperiode (18 mnd)	391	30-08-22	27-02-24	9
A1350	Opstellen en versturen EPA	50	29-08-23	06-11-23	70
A1080	acceptatietermijn EPA	20	07-11-23	04-12-23	70
A1210	Uiterlijk acceptatie EPA	0		27-02-24	9
ZBE - Sluisbuurt overall_new: kavel.ontw	Ontwerp toetsing en pr	400	30-08-22	11-03-24	0
A1030	Opstellen VO	100	30-08-22	16-01-23	0
A1040	Toets VO	30	17-01-23	27-02-23	0
A1050	Opstellen DO	100	28-02-23	17-07-23	0
A1060	Toets DO	30	18-07-23	28-08-23	0
A1360	Aanpassen DO na toets	40	29-08-23	23-10-23	0
A1070	Procedure omgevingsvergunning	70	24-10-23	29-01-24	0
A1370	bezwaartermijn	30	30-01-24	11-03-24	0
A1380	Omgevingsvergunning onherroepelijk	0		11-03-24	0
ZBE - Sluisbuurt overall_new: kavel.real	Realisatie	465	26-12-23	06-10-25	0
A6840	Strategische mijlpaal start bouw (datum obv	0	26-12-23*		0
A1090	Eerst mogelijke levering grond / start bouw	0	12-03-24		0
A1100	Bouwen vastgoed kavel 4B1	410	12-03-24	06-10-25	0
A3250	Melding steigervrij (datum onjuist)	0	08-04-25		0
A3240	Aanleg K&L en maaiveld	130	08-04-25	06-10-25	0
A1110	Oplevering	0		06-10-25	0

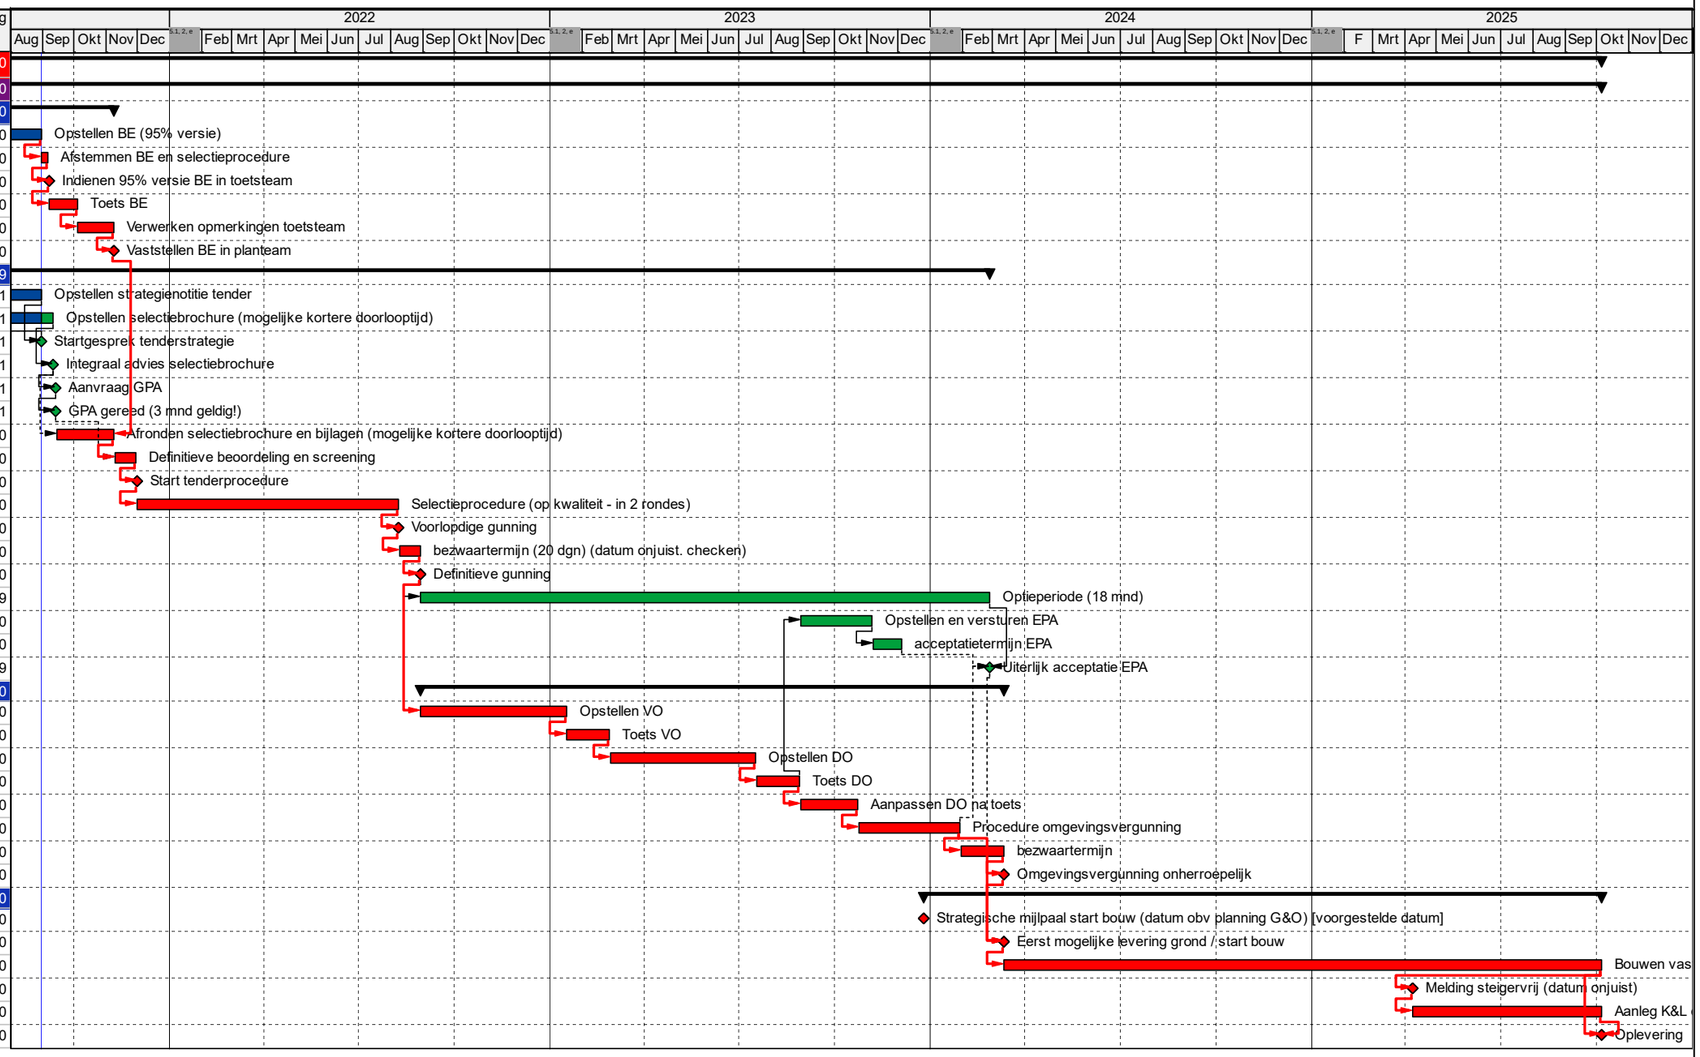

Wat wordt er weergegeven / uitgebreide titel
versie...
Uitgangspunt / toelichting / disclaimer

Samenvatting
Werk gereed
Mijlpaal gereed
Werk gepland
Mijlpaal gepland
Level of Effort
Werk kritiek
Mijlpaal kritiek

Planningsadviseur: .....
Printdatum: 31-08-21
Standlijndatum: 31-08-21
Pagina 1 van 1
