[redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 11:32
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Scheepsbouwweg / aangepast ontwerp dd 06-07-20 nac CVC op 23-06-2020

Ha allen,
2 richtingen fietspad op de inrit is al eerder aan de orde geweest. Ik ga geen ontwerpen meer laten aanpassen, in september moet de schop de grond in. Na besluitvorming lossen we dit in het werk op.
Ik stel dan wel voor om het fietspad op de inrit ook gewoon 3,50 m te maken tbv linksafslaand fietsverkeer
Met vriendelijke groeten,

[redacted]
projectleider
Ingenieursbureau [redacted]
Gemeente Amsterdam
T [redacted]
M [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Bezoekadres Noord: [redacted]
Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 10:43
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Scheepsbouwweg / aangepast ontwerp dd 06-07-20 nac CVC op 23-06-2020
Dag allen,
Ik heb het ontwerp al doorgestuurd naar Saskia omdat zij vandaag met vakantie gaat, zij had de stadsdeelcommissie toegezegd het ontwerp van de bocht op te sturen zodra de CVC er naar had gekeken.
Bestaat er dus een mogelijkheid dat het ontwerp nog wordt aangepast? En op welke termijn kan het bestuur het DO dan verwachten? Dan licht ik graag z.s.m. bestuursondersteuning in.
Groet,

[redacted]
Gebiedsmakelaar [redacted]
Stadsdeel Noord

Gemeente Amsterdam

[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Werkdagen: [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: woensdag 8 juli 2020 10:39
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: RE: Scheepsbouwweg / aangepast ontwerp dd 06-07-20 nac CVC op 23-06-2020
Besten,
Ondanks dat de CVC er naar heeft gekeken heb ik nog wel een opmerking: zou je het 2 richtingsfietspad nog enkele meters op de inritconstructie kunnen doorzetten, met een linksaf-pijl op het rode asfalt plus C14-bord zuidelijk van inritconstructie. Dat lijkt me veiliger en duidelijker voor de west->oost fietser.
Er is een redelijke doorgaande oost<>west fietsstroom via Meteorenweg-Werktuigstraat-Kwekerijlaan-Bongerdbrug, zie ook dit plaatje met fietsbewegingen van Strava: https://www.strava.com/heatmap#14.86/4.90330/52.40666/hot/ride



M.i. zou de oost<>west 2richtingsfietsroute en de positie van de west->oost fietser wat meer helder kunnen worden aangegeven. Anders bestaat de kans dat de fiets (kinderen naar school etc) op de inritconstructie gaat spookrijden met klachten over onduidelijkheid. Op deze wijze geef je de voorrang van de west->oost fiets ook helder weer. Daarnaast fietst de niets vermoedende fietser van Werktuigstraat niet met de bocht mee om pardoes op het 1richtings (oostelijke) fietspad Scheepsbouwweg terecht te komen.
Zou je het 2 richtingsfietspad nog enkele meters op de inritconstructie kunnen doorzetten, met een linksaf-pijl op het rode asfalt plus C14-bord zuidelijk van inritconstructie. De pijl op het fietspad attendeert de overstekende auto ook op het tweerichtingsfietsverkeer, eventueel zou je ook een oost->west pijl kunnen toevoegen, zie onderstaande.

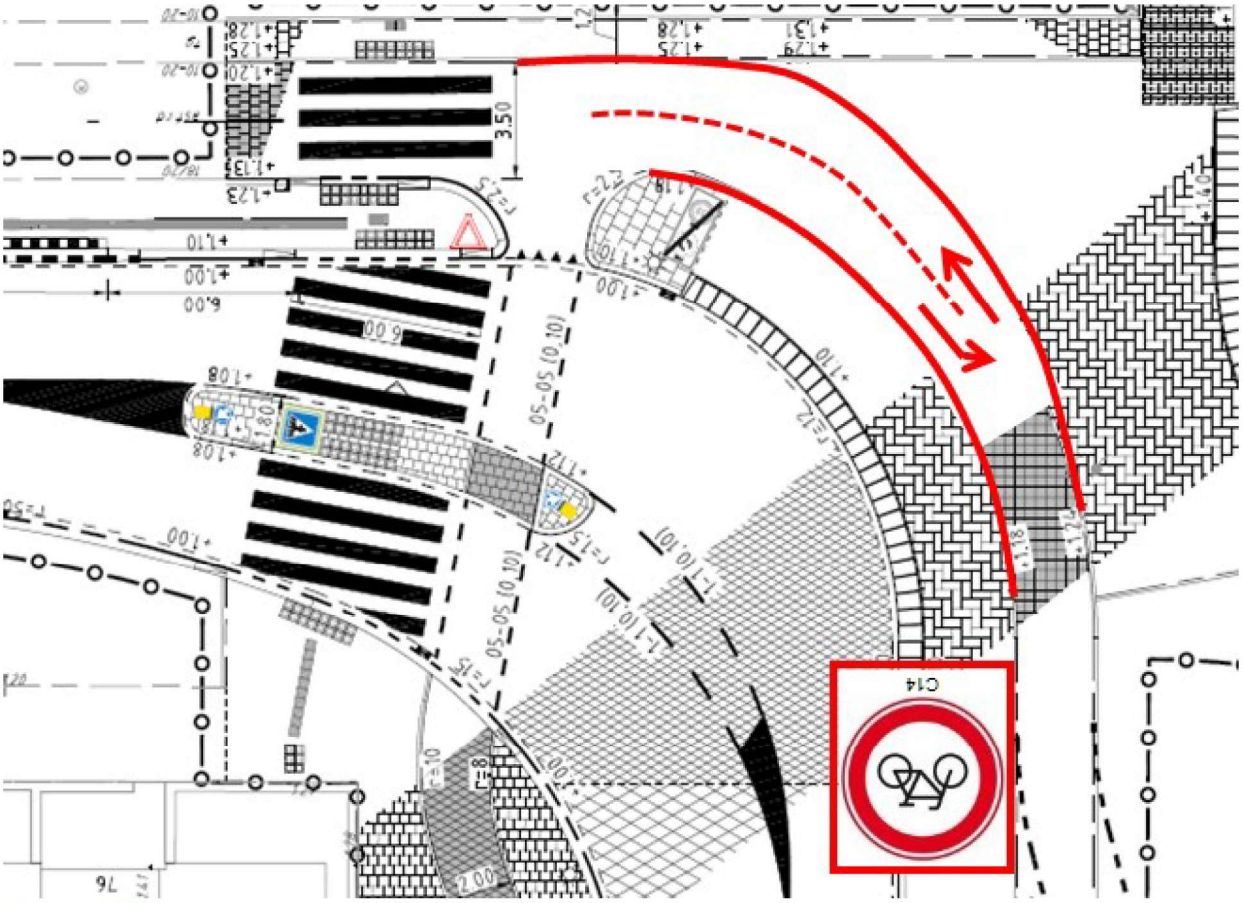

Met vriendelijke groet,
R&D
[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl

Van: [redacted]
Verzonden: Wednesday, July 08, 2020 08:52
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: FW: Scheepsbouwweg / aangepast ontwerp dd 06-07-20 nac CVC op 23-06-2020

Hoi [redacted]
IN het verlengde van onderstaande. Ik heb vorge week een mail rondgestuurd over de kruising Meteorenweg/Kometensingel met het voorstel de ontwerpideeën van [redacted]aan Saskia voor te leggen.
Heb jij hier nog naar gekeken?

[redacted]
V&OR [redacted]
Regievoerder [redacted]
Mobiel [redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Bezoekadres: [redacted]

Van: [redacted]
Verzonden: dinsdag 7 juli 2020 09:53
Aan: [redacted]
CC: [redacted]
Onderwerp: Scheepsbouwweg / aangepast ontwerp dd 06-07-20 nac CVC op 23-06-2020

Ha allen,
Hierbij aangepaste ontwerp nav CVC. Als jullie nog opmerkingen hebben dan graag uiterlijk 14-07-20 ivm vervolg @[redacted]
Wil jij dit ontwerp onder de aandacht brengen van het bestuur?
Met vriendelijke groeten,
[redacted]

projectleider
Ingenieursbureau[redacted]
Gemeente Amsterdam
T[redacted]
M[redacted]
[redacted]@amsterdam.nl
Bezoekadres Noord:[redacted]
Werkdagen:[redacted]
