
Opdrachtgever : Nederlands Auschwitz Comité
Projectnummer : 3025600
Datum : 7-2-2020
Gewijzigd : 7-2-2020

Namenmonument.

KONINKLIJKE WOUDENBERG

Regel	Naam	Start	Duur	Eind
1	Namenmonument te Amsterdam	6-2-2020	57d	24-4-2020
2	**KWA**	6-2-2020	57d	24-4-2020
3	Afleveren sleutels tbv het bouwhek	7-2-2020	1d	7-2-2020
4	Stalen Viaz Diaz Monument demonteren.(05.00)	10-2-2020	1d	10-2-2020
5	Aanvoer van de keten.	12-2-2020	1d	12-2-2020
6	Afvoer stalen rijplaten	17-2-2020	1d	17-2-2020
7	Peilmaten uitzetten tbv de nutsbedrijven	18-2-2020	1d	18-2-2020
8	Aansluiten keten e/w	19-2-2020	2d	20-2-2020
9	Sparingen insnijden tgv de nutsbedrijven Iom John van de Stek	2-3-2020	1d	2-3-2020
10	Aanbrengen mantelpijpen 125 mm Lengte ongeveer 30 strekkende meter Op aanwijzing Linander E	20-4-2020	2d	21-4-2020
11	**Waternet**	24-2-2020	30d	3-4-2020
12	Start met de werkzaamheden binnen het bouwterrein	24-2-2020	30d	3-4-2020
13	Nieuwe Keizersgracht	23-3-2020	5d	27-3-2020
14	**Liander Gas**	6-4-2020	13d	22-4-2020
15	Start met de gaswerkzaamheden	6-4-2020	13d	22-4-2020
16	**Liander E**	20-4-2020	25d	22-5-2020
17	Start met de electra werkzaamheden	20-4-2020	25d	22-5-2020
18	Mantelpijpen 125 mm doorsnede gladde pijp.(uitvoering KWA)	20-4-2020	2d	21-4-2020
19	**Dusseldorp grondwerken**	18-5-2020	10d	29-5-2020
20	Afgraven van de grondslag	18-5-2020	10d	29-5-2020

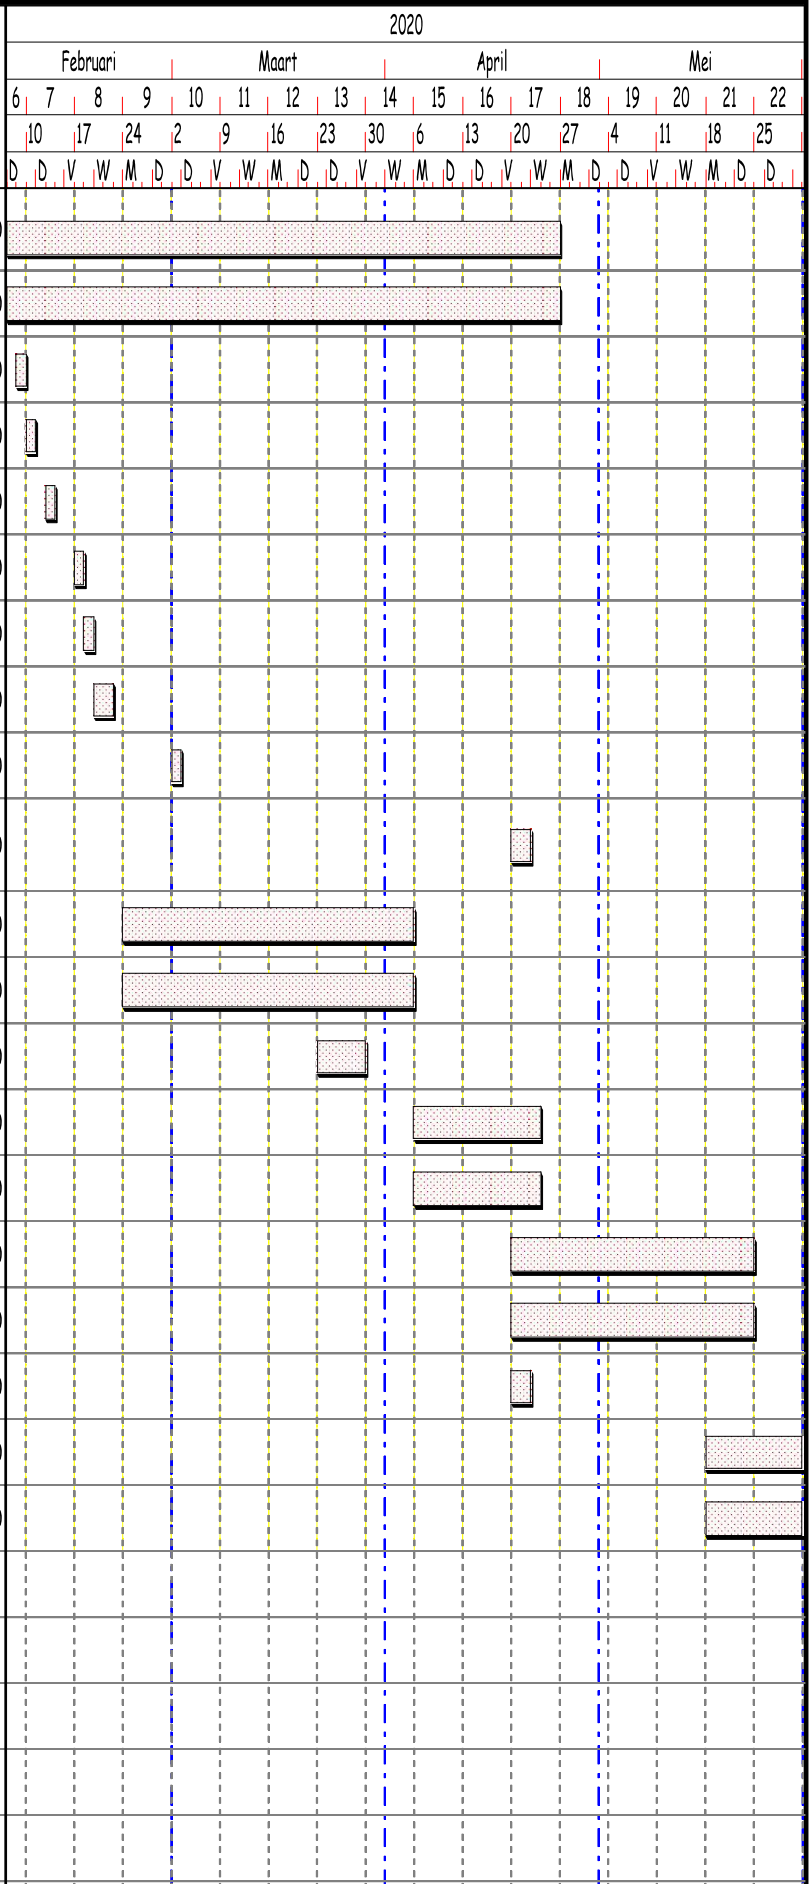

Gemaakt door :

Projectnummer : 3025600

Revisie : 7-2-2020

Revisie commentaar : 6-wekenschema
