
Andreas Bonnstraat bouwdeel B (CONCECPT)

2-5-2025 | Eigenhaard / ELK | JB | elk®

Regel	Omschrijving	Duur	Start	Eind
	(Geen)			
	Planning bouwdeel B			
1	**Huurders**	**129,0d**	**13-1-2025**	**18-7-2025**
2	1e bewonersavond Bouwdeel B	5,0d	13-1-2025	17-1-2025
3	Opname + scan bestaande constructie	5,0d	10-2-2025	14-2-2025
4	2e bewonersavond Bouwdeel B (sociaal plan)	40,0d	31-3-2025	28-5-2025
5	3e bewonersavond Bouwdeel B (nieuwe woning)	34,0d	2-6-2025	18-7-2025
6	Buurt participatie	54,0d	30-4-2025	18-7-2025
7	PEILDATUM aanvragen stadsvernieuwing	5,0d	7-7-2025	11-7-2025
8	Afgifte peildatum	2,0d	25-8-2025	25-8-2026
9	Draagvlakmeeting???	10,0d	17-11-2025	28-11-2025
10	Getekende akkoordverklaring????	1,0d	15-12-2025	15-12-2025
11	Begeleiden en herhuisvesten van bewoners	256,0d	12-1-2026	19-2-2027
12	Aanbieden wisselwoning	80,0d	19-10-2026	19-2-2027
13	Verhuizen en leeg opleveren woning	20,0d	25-1-2027	19-2-2027
14	Sleutels BOG	5,0d	25-1-2027	29-1-2027
15	Sleutels woningen	5,0d	22-2-2027	26-2-2027
16	5.1, 2, e	226,0d	5-1-2026	18-12-2026
17	Voortrekken trafo ruimte inpandig	226,0d	5-1-2026	18-12-2026
18	Start bouw	5,0d	1-3-2027	5-3-2027
19	**Ontwerpteam**	**515,0d**	**11-11-2024**	**19-2-2027**
20	Contact stedenbouwkundige / welstand	50,0d	11-11-2024	31-1-2025
21	Offerte + opdrachtverstrekking architect + constructeur	30,0d	11-11-2024	20-12-2024
22	Uitwerken bestaande constructie	15,0d	24-2-2025	14-3-2025
23	VO fase bouwkundig	49,0d	17-3-2025	27-6-2025
24	VO fase constructief	34,0d	30-4-2025	27-6-2025
25	Advies installaties	34,0d	30-4-2025	27-6-2025
26	Advies bouwfysica (bouwfysische maatregelen)	50,0d	17-3-2025	28-5-2025
27	NUTS bespreking	50,0d	17-3-2025	28-5-2025
28	Procedure bestemmingswijziging afstemmen met gemeente	69,0d	17-3-2025	27-6-2025
29	Opstellen anterieure overeenkomst	54,0d	2-6-2025	12-9-2025
30	Indiening welstandsaanvraag	45,0d	30-6-2025	26-9-2025
31	Spiegelen concept plan aan kosten raming	19,0d	2-6-2025	27-6-2025
32	Indiening ontwerp besluit	1,0d	30-6-2025	30-6-2025
33	Tussen besluit Eigenhaard, vervolg project	25,0d	30-6-2025	29-8-2025
34	Contracteren ketenpartners	20,0d	1-9-2025	26-9-2025
35	DO fase bouwkundig (technische engineering)	80,0d	1-9-2025	19-12-2025
36	DO fase constructief	80,0d	1-9-2025	19-12-2025
37	Set omgevingsvergunning	20,0d	5-1-2026	30-1-2026
38	Procedure omgevingsvergunning	120,0d	2-2-2026	23-7-2026
39	Bezwaren termijn	126,0d	24-7-2026	26-2-2027
40	calculatie definitieve begroting	40,0d	5-1-2026	27-2-2026
41	check kosten deskundige	25,0d	2-3-2026	3-4-2026
42	samenstellen uitvoeringsbesluit	30,0d	7-4-2026	20-5-2026
43	Uitvoeringsbesluit	40,0d	21-5-2026	16-7-2026
44	Ondertekenen realisatieovereenkomst	5,0d	20-7-2026	24-7-2026
45	Werkvoorbereiding	125,0d	24-8-2026	26-2-2027
46	**NUTS**	**465,0d**	**10-2-2025**	**26-2-2027**
47	Capaciteits check vanuit ontwerp	14,0d	2-6-2025	20-6-2025
48	Besluitvorming noodzakelijke capaciteit	2,0d	10-2-2025	11-2-2025
49	Offerten NUTS	60,0d	12-2-2025	9-5-2025
50	Opdrachtverstrekking NUTS	5,0d	12-5-2025	16-5-2025
51	Engeneering installatie	245,0d	16-5-2025	15-6-2026
52	Werkmappen gereed voor start werk (3 tot 6 maanden)	90,0d	15-6-2026	13-11-2026
53	Aanpassen hoofdtrace in de straat	65,0d	16-11-2026	26-2-2027

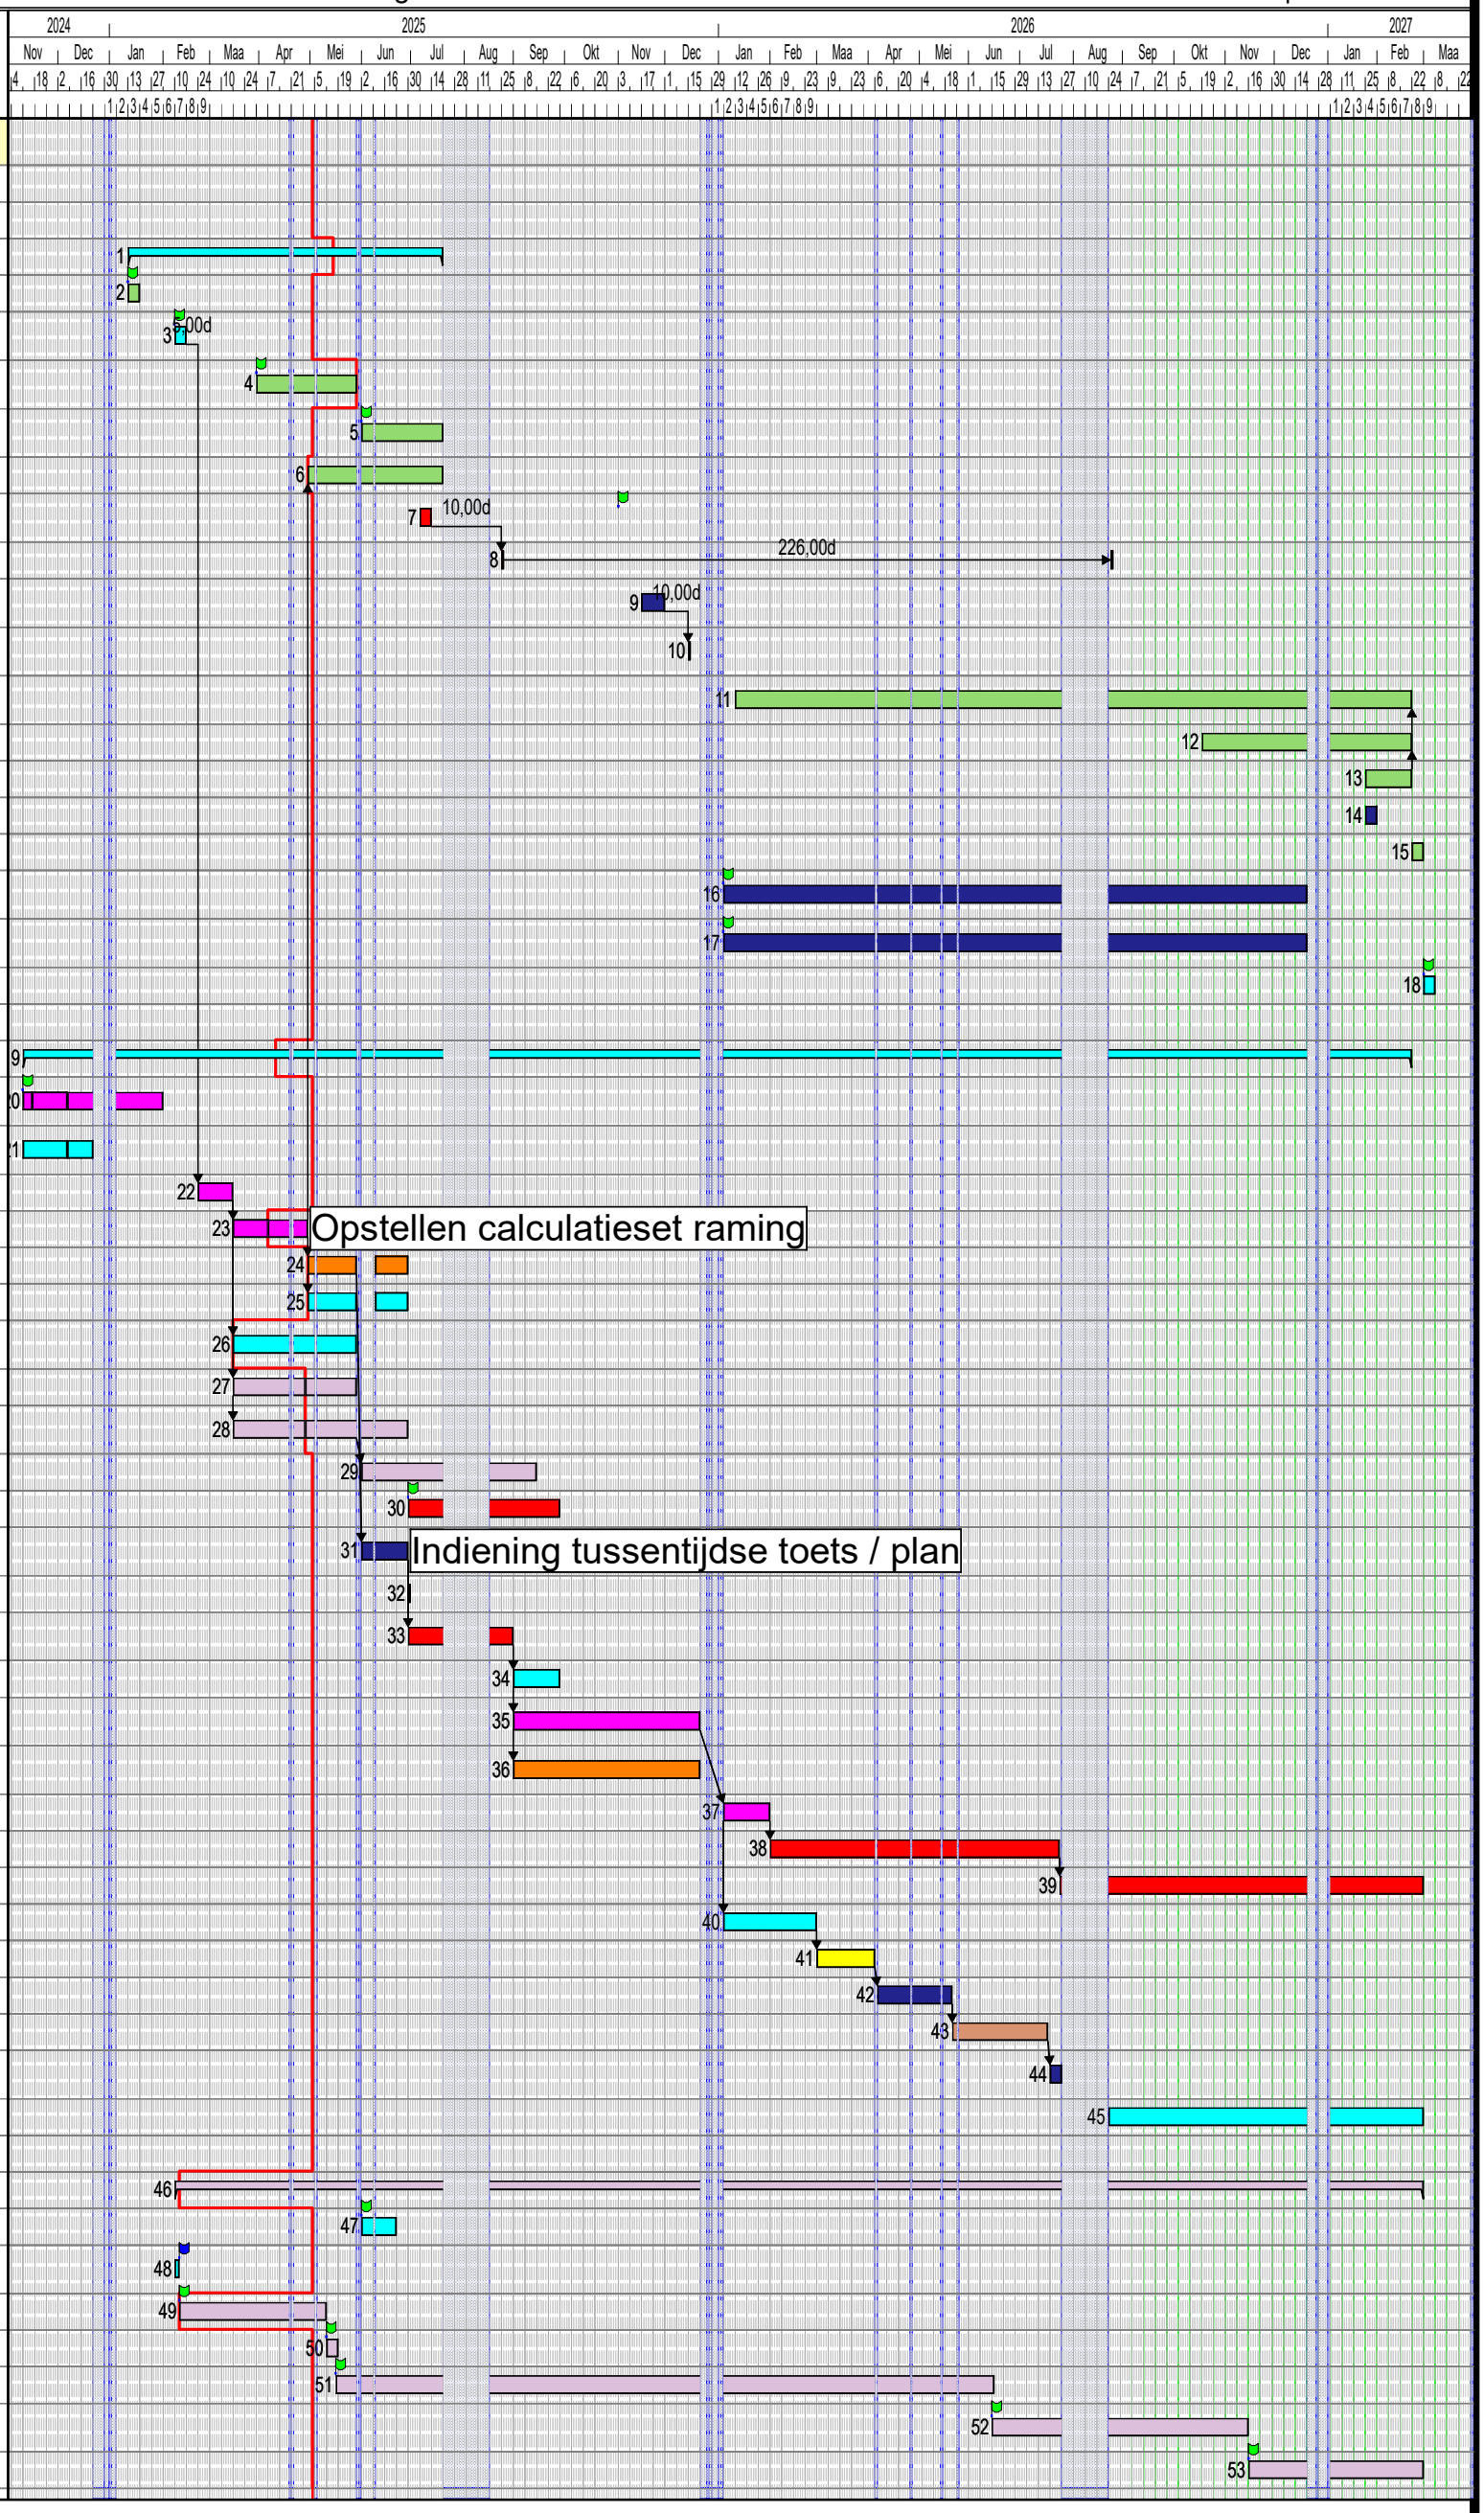

Bouwdelen

Ketenpartner | Bewonersparticipatie | Eigenhaard | Gemeente / BoWoTo | Team + Ketenpartner | Architect / tekenbureau | Constructeur | NUTS | Ontwerpteam | Kosten deskundige | besluiten

Getekend door: JB	Werk Nr. 2401296	Rev. Nr.	Opm:

Project Ref. G:\Amsterdam\CALCULATIEMAP\CALCULATIEMAP 2024\0000000 - Calculatie Bouwteam EigenHaard\2401296 EH Andreas Bon, Van Musbroekenstraat\00 Planvorming\Planningen\Planning planvoorbereidi
