SALVERDA
BOUW

Verslag 23 overleg M&A + Omgevingsdienst

Datum
24 oktober 2023

Referentie
2203-17228- v 0.23

Behandeld door
5.1.2.e

Project
S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM

Aanwezig: 24-10-2023	Namens:	Afwezig:
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
5.1.2e	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	
5.1.2e	Salverda	
5.1.2e	Salverda	
	Salverda	5.1.2e
5.1.2e	BBN directievoerder	
	Venema	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
23.01	**Opening en mededelingen**	
23.01	5.1.2e opent het overleg, en licht toe wat er in het afgelopen verslag besproken is.	
23.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 03-10-2023 – één toevoeging n.a.v. vraag van 5.1.2e over het rode natuursteen, het onderzoeken naar een passende rode natuursteen valt niet in de rode draad van de **planning**, voor de rest geen inhoudelijke opmerking op het verslag, Akkoord.	
23.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
23.04	**Natuursteen gevel**	
	Type Natuursteen Onderzoek zandsteen, de resultaten van het TNO onderzoek zijn binnen. TNO rapport delen met deelnemers vergadering.	5.1.2e
	5.1.2e *heeft 2 stenen bemonsterd conform opgaaf TNO, zie onderstaande foto van het resultaat.* *Conclusie: deze steen past goed bij gevel, en kan worden toegevoegd in het ARTIS-dossier t.b.v. materialisatie van de natuursteen gevel.* ** voor de werkzaamheden die nu worden uitgevoerd is dit type niet van toepassing*	

Salverda Bouw BV
Industrieweg 13
8084 GS 't Harde
Postbus 4
8084 ZG 't Harde

T 0525 - 65 16 66
info@salverda.nl
www.salverda.nl

NL26ABNA0476472725
BIC ABNANL2A
KvK 08011909
BTW NL001212527B01

Samen maken we morgen.
ONDERDEEL VAN DE SCHAGEN GROEP

23.04.1	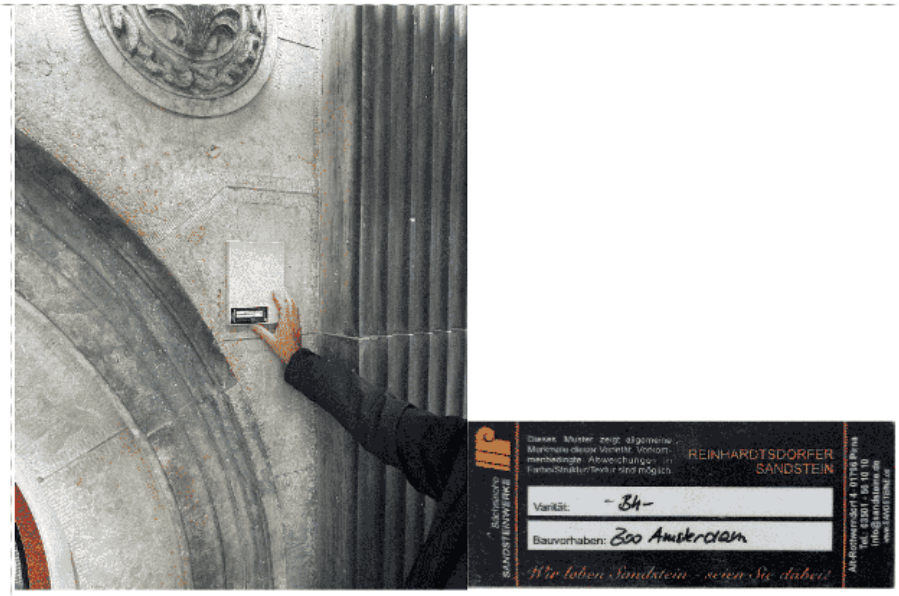 	
	- Rood zandsteen: hiervoor is nog geen goede steen gevonden. Vanuit de opdracht wordt in dit stuk gevel ook geen inboetwerk verricht. Afspraak is dat wij de werkzaamheden conform opdracht uitvoeren en bij noodzaak t.b.v. inboetwerk deze actie verder weer actief maken.	vaststelling
23.04.3	Planning: start werkzaamheden inboetwerk vanaf week 47, bij start werkzaamheden zullen wij controlemoment inplannen.	5.1.2e
	Reinigen Natuursteen:	
	Voortgang met de daarbij behorende kwaliteit van het eindresultaat is goed, dit wordt naar tevredenheid van alle partijen correct uitgevoerd.	
23.05	**Stucwerkgevel**	

21.05.01	Als de steiger bij het eerste deel is gedemonteerd wordt het totale gevelbeeld beoordeeld en eventueel waar nodig nog bijgekleurd. Steiger wordt gedemonteerd vanaf week 45.	Venema/Salverda
23.06	**Daken**	
	Attiek: op locatie is het werk aan de attieken bekeken, geen opmerkingen.	
22.06.1	De gemaakte noodoverlopen aan de voorgevel zijn bekeken, afgesproken is om hier een 'vissenbekje' van te maken. zie onderstaande foto. 	vaststelling
23.07	**Binnenafbouw**	
16.07.1	De vier schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. zie onderstaande foto hetgeen besproken is. 	vaststelling
23.07.1	Tijdens de rondgang is de v-groef t.b.v. de lambrisering in het stukwerk bekeken. 2 opmerkingen: het is de wens om de groef dieper te maken, de hoogte van de lijn wordt 1200mm.	

	Salverda gaat hiervan een nieuwe proef maken	Salverda
23.08	**Glas/Kozijnen**	
	-	
23.09	**Overige bespreekpunten**	
	Rotonde: Verwijderen planken in de rondgang, in de rondgang liggen op plekken 3 lagen planken, de wens is om terug te gaan naar de eerste laag planken die op de balklaag liggen (1e originele laag). Dit ivm hoogte van de afwerkvloer en voorkomen hellingbanen. Afspraak dat Salverda proef gaat maken van een paar m2 met het verwijderen van de bovenste laag. *Aanvulling:* *Proef is inmiddels uitgevoerd, zie foto. (Graag vernemen wij de vervolgstappen)* 	
23.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw.	
23.11	**Volgende vergadering**	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 14 November, tijdstip 13:00uur.	
	Iedere 6 weken wordt er een officiële vergadering gehouden. Elke 3 weken zijn jullie welkom voor een bouwronde. 5.1.2e wijzigt de uitnodiging.	5.1.2e

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 4
