5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 16:48
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: RE: boorlijn 10kV-ring BSH-zuid

Hi 5.1,2,e

Paar aandachtspunten van mijn kant.

- [redacted]
- Onder de papaverweg zit ook een koelkanaal nabij het uittrede punt, als je eerder omhoog komt (dichter naar de Papaverweg toe), zou je daar wel eens wat palen kunnen tegenkomen. Weten we ook of er wat er op de groenstrook van kavel 9 heeft gestaan?
- Leveren de boringen nog beperkingen op in de toekomst (mag je heien boven de boring)?
- Willen we het koelkanaal op kavel 9 behouden? Zo niet, levert de boring dan een uitdaging voor de sloop op? Misschien beter naar onderstation schuiven?
- [redacted]

Meer even niet.

Vr gr 5.1,2,e

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 16:22
Aan: 5.1,2,e
Onderwerp: FW: boorlijn 10kV-ring BSH-zuid

Van: 5.1,2,e
Verzonden: donderdag 14 oktober 2021 15:58
Aan: 5.1,2,e [redacted] l>; Jong, Jacques de <J.de.Jong@amsterdam.nl>; Urbach, Ewout <e.urbach@amsterdam.nl>
Onderwerp: boorlijn 10kV-ring BSH-zuid

Beste collega's,

Ter informatie, omdat jullie projecten raakvlakken hebben met de uitbereiding van het 10 kV net. Vanmorgen wederom overleg met Liander gehad over de uitbreiding van het 10 kV net om het stroomtekort op te lossen. De onderstaande magenta lijn geeft de boorlijn aan die Liander in gedachte heeft voor fase 2 (de retourverbinding om de ring te sluiten). De andere boring volgt bestaande infrastructuur, de Ridderspoorweg en Asterweg. Ook daar worden de kabels geboord. Deze fase 2 verbinding word op 40 meter min NAP aangebracht om zo onder de grondwaterverontreiniging door te gaan. Op groenstrook kavel 39 komt dan een in/uittredenpunt. Dat geldt ook voor een in/uittredenpunt achterop kavel 9

naast het koelkanaal. Een in/uittredenpunt aan de voorkant van kavel 9 gaat hoogstwaarschijnlijk niet. Dan gaat men door de VOCl-pluim heen en dat willen we niet.

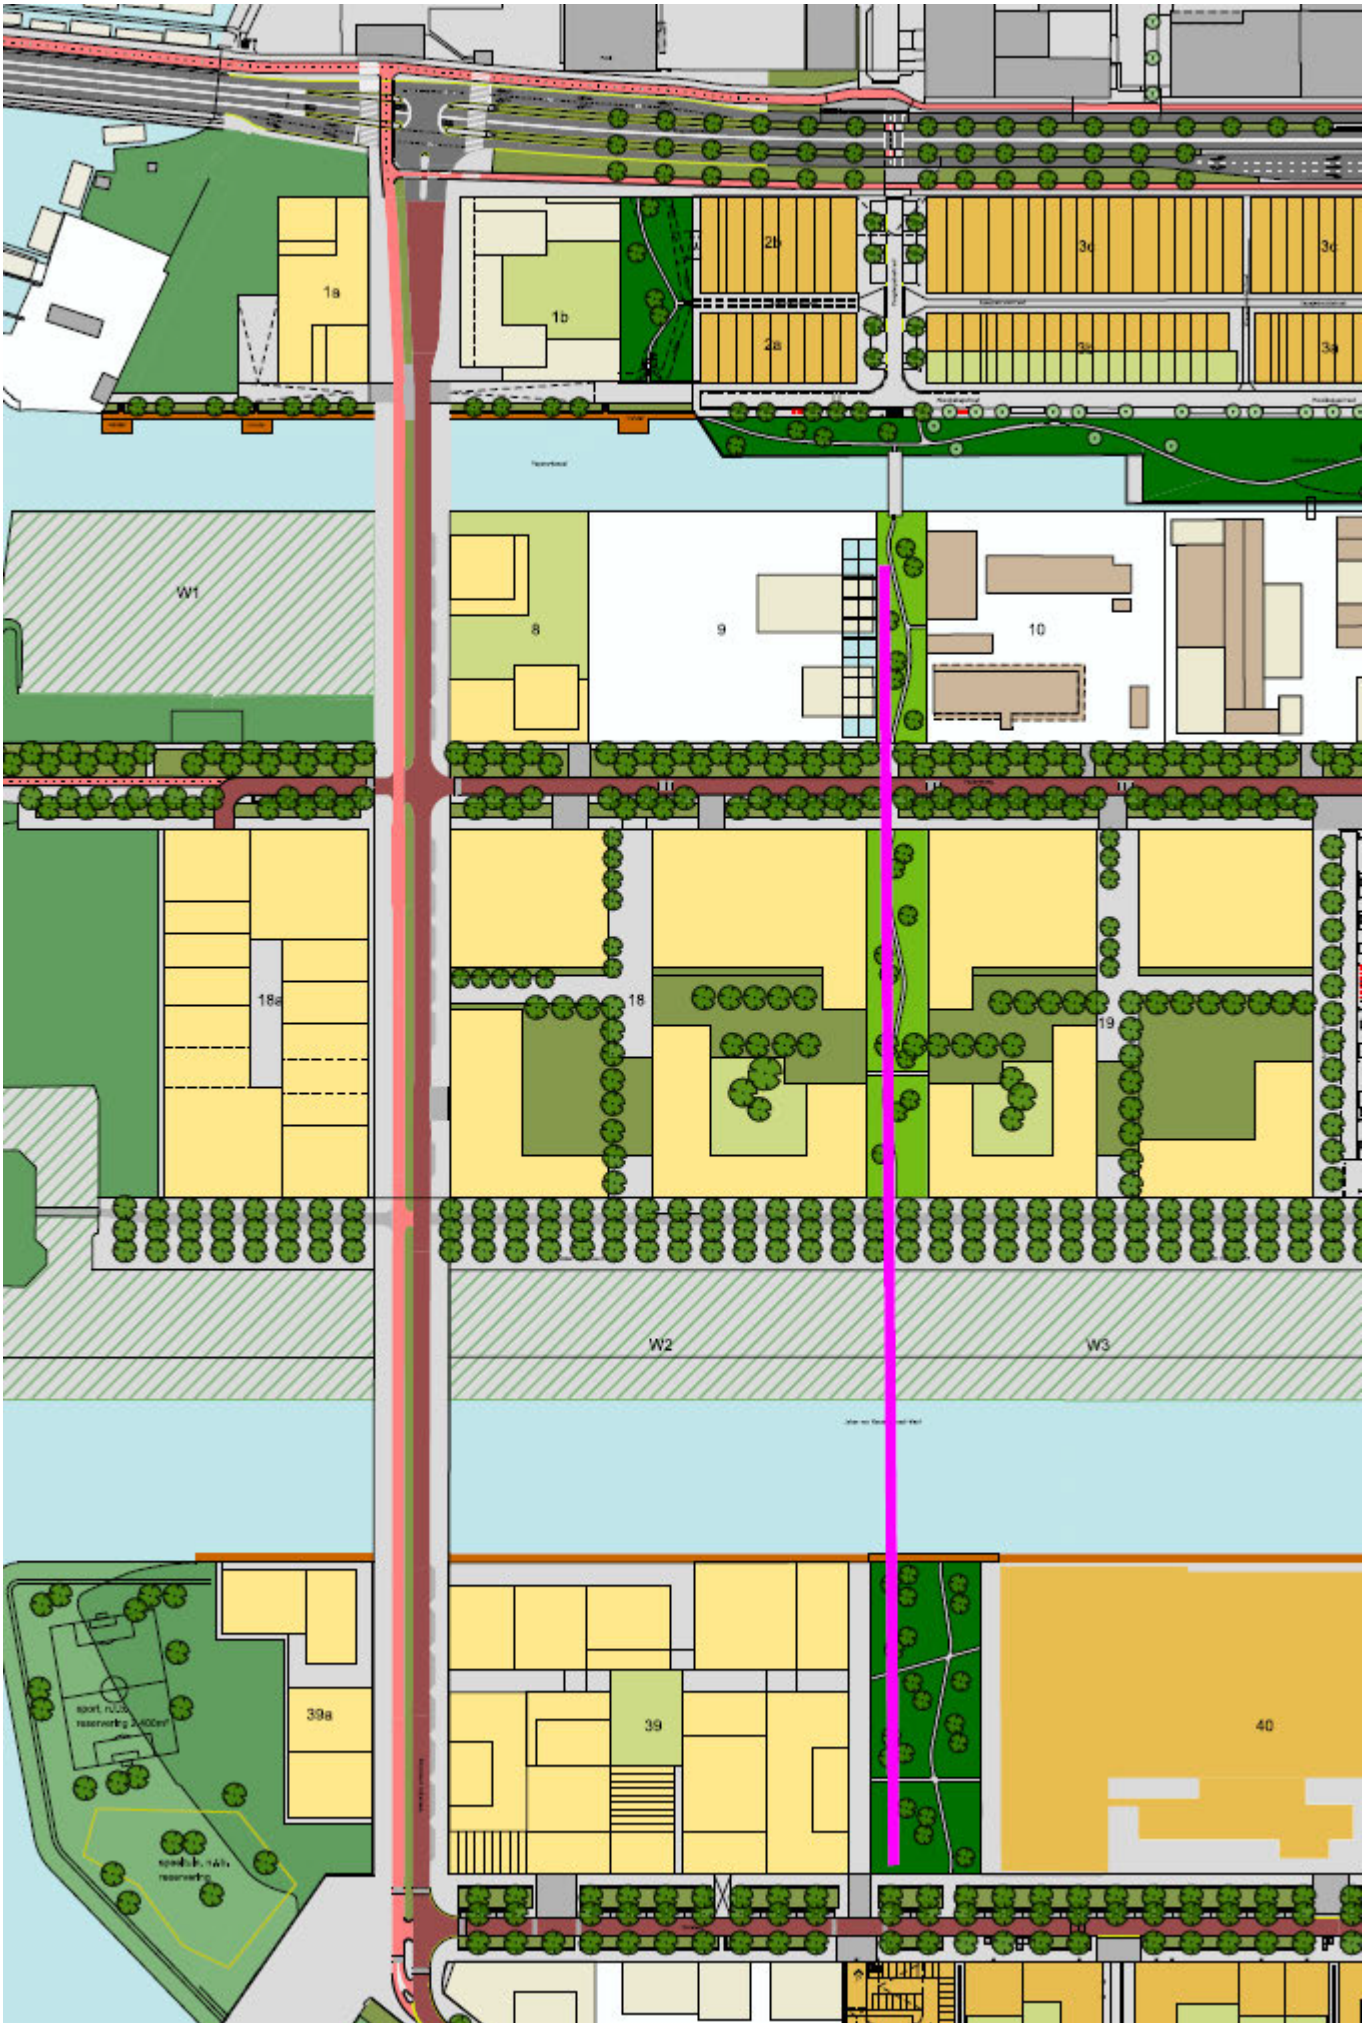
1a
1b
2b
3c
3d
2a
3a
W1
8
9
10
18a
18
19
W2
W3
39a
39
40

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
[redacted]

Gemeente Amsterdam

5.1,2,e
[redacted]

Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam
Buikslotermeerplein 2000, 1025 XL Amsterdam
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam
ingenieursbureau.amsterdam.nl

Werkdagen: ma, di, wo en do

Op inkopen zijn de inkoopvoorwaarde van de gemeente Amsterdam van toepassing. Deze zijn in te zien op https://www.amsterdam.nl/ondernemen/inkoop-aanbesteden/
