Id	Naam	UMS2	Asset	Opvolgende taken	een_brownfi	Eind
94	**Realisatie 380/150kV GIS OS Oostzaan**	**28642**	**Oostzaan**		**Greenfield**	**Q2-2025**
95	B	28642	Oostzaan	96	Greenfield	Q3-2022
96	D	28642	Oostzaan	97	Greenfield	Q2-2023
97	R	28642	Oostzaan	99	Greenfield	Q1-2025
98	Start bouw	28642	Oostzaan		Greenfield	Q1-2023
99	IBN	28642	Oostzaan	105;638;118;665;613	Greenfield	Q2-2025
100	**150kV Netverbinding OS Oostzaan-OS Hemweg**	**28642**	**Oostzaan**		**Brownfield**	**Q1-2026**
101	S	28642	Oostzaan	102	Brownfield	Q3-2022
102	B	28642	Oostzaan	103	Brownfield	Q3-2023
103	D	28642	Oostzaan	104	Brownfield	Q2-2024
104	R	28642	Oostzaan	105	Brownfield	Q2-2025
105	IBN	28642	Oostzaan	106	Brownfield	Q3-2025
106	Proefperiode	28642	Oostzaan	112	Brownfield	Q1-2026
107	**Realisatie 150kV GIS OS Hemweg**	**33769**	**Hemweg**		**Brownfield**	**Q3-2027**
108	B	33769	Hemweg	109	Brownfield	Q4-2023
109	D	33769	Hemweg	110	Brownfield	Q4-2024
110	R	33769	Hemweg	112	Brownfield	Q2-2026
111	Start Bouw	33769	Hemweg		Brownfield	Q4-2024
112	IBN	33769	Hemweg	231;113	Brownfield	Q1-2027
113	Proefperiode	33769	Hemweg	187;115GE;300;134;226	Brownfield	Q3-2027
114	**TSA-NT OS Hemweg (HW) 1*420MVA 4*150kV GIS veld**	**33769**	**Hemweg**		**Brownfield**	**Q3-2027**
115	IBN	33769	Hemweg	131	Brownfield	Q3-2027
116	**OS Oostzaan (OSZ) 2*150kV GIS veld fase 1 en verkabelen lijn OS Hemweg**	**28642**	**Oostzaan**		**Greenfield**	**Q3-2025**
117	T	28642	Oostzaan	118	Greenfield	Q4-2024
118	IBN	28642	Oostzaan	124	Greenfield	Q3-2025
119	**OS Oostzaan (OSZ) 140MVA 150/50/10kV+50kVGIS+alle BK+50kV VB fase 1**	**28642**	**Oostzaan**		**Greenfield**	**Q3-2025**
120	IV	28642	Oostzaan	121	Greenfield	Q2-2021
121	B	28642	Oostzaan	122	Greenfield	Q3-2021
122	D	28642	Oostzaan	123	Greenfield	Q2-2023
123	R	28642	Oostzaan	124	Greenfield	Q1-2025
124	IBN	28642	Oostzaan		Greenfield	Q3-2025
125	**TSA-NT OS Hemweg (HW) 1*420MVA 150/50/10kV+1*type C+No regret**	**33769**	**Hemweg**		**Brownfield**	**Q1-2028**
126	S	33769	Hemweg	127	Brownfield	Q4-2021
127	IV	33769	Hemweg	128	Brownfield	Q1-2022
128	B	33769	Hemweg	129	Brownfield	Q3-2022
129	D	33769	Hemweg	130	Brownfield	Q4-2023
130	R	33769	Hemweg	131	Brownfield	Q3-2025
131	IBN	33769	Hemweg	132	Brownfield	Q4-2027
132	O (AC7 klanten)	33769	Hemweg		Brownfield	Q1-2028
133	**OS Petroleumhaven (PTH?) 2*150kV GIS veld op OS HW+1,5km 150kV VB**	**35253**	**Petroleumhav**		**Greenfield**	**Q4-2027**
134	IBN	35253	Petroleumhav	143	Greenfield	Q4-2027
135	**OS Petroleumhaven (PTH?) grondaankoop/erfpacht**	**35253**	**Petroleumhav**		**Greenfield**	**Q2-2023**
136	G	35253	Petroleumhav	142	Greenfield	Q2-2023
137	**OS Petroleumhaven (PTH?) 53MVA 150/10kV+type C fase 1**	**35253**	**Petroleumhav**		**Greenfield**	**Q1-2028**
138	S	35253	Petroleumhav	139;145GE	Greenfield	Q4-2024
139	IV	35253	Petroleumhav	140	Greenfield	Q1-2025
140	B	35253	Petroleumhav	141	Greenfield	Q2-2025
141	D	35253	Petroleumhav	142	Greenfield	Q1-2026
142	R	35253	Petroleumhav	143	Greenfield	Q2-2027
143	IBN	35253	Petroleumhav	163	Greenfield	Q1-2028
144	**OS Petroleumhaven (PTH?) MS kabelplan**	**35253**	**Petroleumhav**		**Greenfield**	**Q4-2024**
145	K	35253	Petroleumhav		Greenfield	Q4-2024
146	**OS Sextantweg (STW?) grondaankoop/erfpacht**	**35252**	**Sextantweg**		**Greenfield**	**Q1-2022**
147	G	35252	Sextantweg	155	Greenfield	Q1-2022
148	**OS Sextantweg (STW?) 40 of 80MVA kabelplan**	**35252**	**Sextantweg**		**Greenfield**	**Q1-2022**
149	K	35252	Sextantweg		Greenfield	Q1-2022
150	**OS Sextantweg (STW?) 40MVA 50/10kV+type C bk 106MVA+1km 50kV VB**	**35252**	**Sextantweg**		**Greenfield**	**Q1-2025**
151	S	35252	Sextantweg	152	Greenfield	Q1-2022
152	IV	35252	Sextantweg	153	Greenfield	Q2-2022
153	B	35252	Sextantweg	154	Greenfield	Q3-2022
154	D	35252	Sextantweg	155	Greenfield	Q3-2023

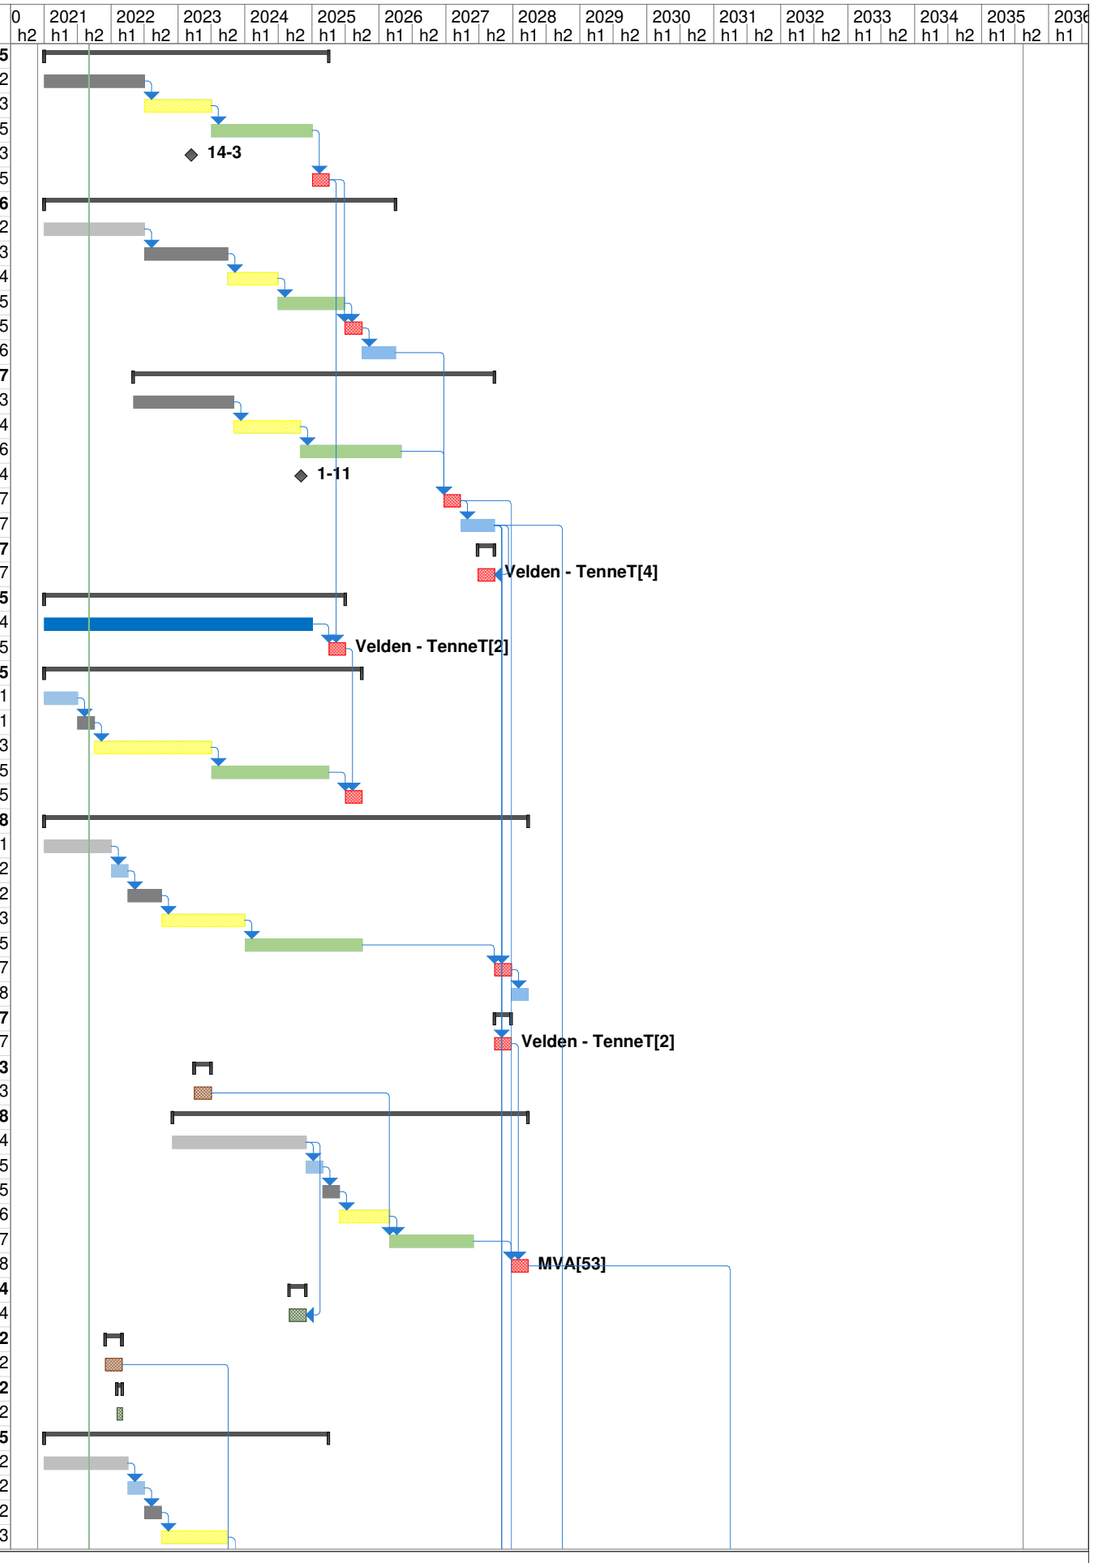

Project: NSV - Amsterdam
Datum: 2-9-2021

Mijlpaal
Handmatige samenvatting
T - TenneT
S - Studie
IV - Investeringsvoorstel
B - Basisontwerp
D - Definitief ontwerp
R - Realisatie
O - ombouw
IBN
G - Grond
K - Kabel

Id	Naam	UMS2	Asset	Opvolgende taken	een_brownfi	Eind
155	R	35252	Sextantweg	156	Greenfield	Q4-2024
156	IBN	35252	Sextantweg		Greenfield	Q1-2025
157	**OS Westhaven (WH) ntb**	**27456**	**Westhaven**		**Brownfield**	**Q2-2031**
158	S	27456	Westhaven	159	Brownfield	Q4-2029
159	IV	27456	Westhaven	160	Brownfield	Q1-2030
160	B	27456	Westhaven	161	Brownfield	Q2-2030
161	D	27456	Westhaven	162	Brownfield	Q3-2030
162	R	27456	Westhaven	163	Brownfield	Q1-2031
163	IBN	27456	Westhaven		Brownfield	Q2-2031
164	**OS Westhaven (WH) omzwaaien MS kabels**	**27456**	**Westhaven**		**Brownfield**	**Q3-2025**
165	K	27456	Westhaven		Brownfield	Q3-2025
166	**TSA-N OS Nieuw Poortstraat (NPS) 80MVA 50/10kV+2*type C+3km 50kV VB**	**33770**	**Nieuw Poorts**		**Brownfield**	**Q4-2024**
167	S	33770	Nieuw Poortst	168;703GE	Greenfield	Q1-2022
168	IV	33770	Nieuw Poortst	169	Greenfield	Q2-2022
169	B	33770	Nieuw Poortst	170	Greenfield	Q3-2022
170	D	33770	Nieuw Poortst	171	Greenfield	Q2-2023
171	R	33770	Nieuw Poortst	172	Greenfield	Q3-2024
172	IBN	33770	Nieuw Poortst		Greenfield	Q4-2024
173	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 2 (HVZ2) 3*150kV GIS velden op HSZ1+1km 150kV VB**	**32843**	**Havenstad2**		**Greenfield**	**Q1-2031**
174	IBN	32843	Havenstad2	181	Greenfield	Q1-2031
175	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 2 (HVZ2) 106MVA 15010kV+2*type C**	**32843**	**Havenstad2**		**Greenfield**	**Q2-2031**
176	S	32843	Havenstad2	177	Greenfield	Q3-2028
177	IV	32843	Havenstad2	178	Greenfield	Q4-2028
178	B	32843	Havenstad2	179	Greenfield	Q1-2029
179	D	32843	Havenstad2	180	Greenfield	Q4-2029
180	R	32843	Havenstad2	181	Greenfield	Q1-2031
181	IBN	32843	Havenstad2		Greenfield	Q2-2031
182	**150kV Netverbinding OS Hemweg-OS Havenstad Zuid 1 (HVZ1)**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q4-2027**
183	S	33609	Havenstad1	184	Greenfield	Q3-2023
184	B	33609	Havenstad1	185	Greenfield	Q3-2024
185	D	33609	Havenstad1	186	Greenfield	Q2-2025
186	R	33609	Havenstad1	187	Greenfield	Q2-2026
187	IBN	33609	Havenstad1	192	Greenfield	Q4-2027
188	**Realisatie 150kV GIS OS Havenstad Zuid 1 (HVZ1)**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q2-2028**
189	B	33609	Havenstad1	190	Greenfield	Q3-2022
190	D	33609	Havenstad1	191	Greenfield	Q3-2023
191	R	33609	Havenstad1	192	Greenfield	Q2-2025
192	IBN	33609	Havenstad1	193	Greenfield	Q1-2028
193	Proefperiode	33609	Havenstad1	174;195;268	Greenfield	Q2-2028
194	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 1 (HSZ1) 3*150kV GIS velden**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q3-2028**
195	IBN	33609	Havenstad1	206	Greenfield	Q3-2028
196	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 1 (HSZ1) kabelplan**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q4-2022**
197	K	33609	Havenstad1		Greenfield	Q4-2022
198	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 1 (HSZ1) aankoop grond/erfpacht**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q3-2021**
199	G	33609	Havenstad1	205	Greenfield	Q3-2021
200	**TSA-NT OS Havenstad Zuid 1 (HSZ1) 106MVA 15010kV+2*type C**	**33609**	**Havenstad1**		**Greenfield**	**Q4-2028**
201	S	33609	Havenstad1	202;197GE	Greenfield	Q4-2022
202	IV	33609	Havenstad1	203	Greenfield	Q1-2023
203	B	33609	Havenstad1	204	Greenfield	Q2-2023
204	D	33609	Havenstad1	205	Greenfield	Q1-2024
205	R	33609	Havenstad1	206	Greenfield	Q2-2025
206	IBN	33609	Havenstad1	208	Greenfield	Q4-2028
207	**OS Westzaanstraat (WZ) 3*150kV GIS velden op OS HSZ1 + 4km 150kV VB**	**33991**	**Westzaanstra**		**Brownfield**	**Q2-2033**
208	IBN	33991	Westzaanstra	219	Brownfield	Q2-2033
209	**OS Westzaanstraat (WZ) 106MVA kabelplan en omzwaaien MS kabels**	**33991**	**Westzaanstra**		**Brownfield**	**Q1-2034**
210	K	33991	Westzaanstra		Brownfield	Q1-2034
211	**OS Westzaanstraat (WZ) 106MVA 150/10kV+2*type C**	**33991**	**Westzaanstra**		**Brownfield**	**Q4-2033**
212	S	33991	Westzaanstra	213	Brownfield	Q4-2021
213	W	33991	Westzaanstra	214	Brownfield	Q3-2028
214	S	33991	Westzaanstra	215	Brownfield	Q4-2030
215	IV	33991	Westzaanstra	216	Brownfield	Q1-2031

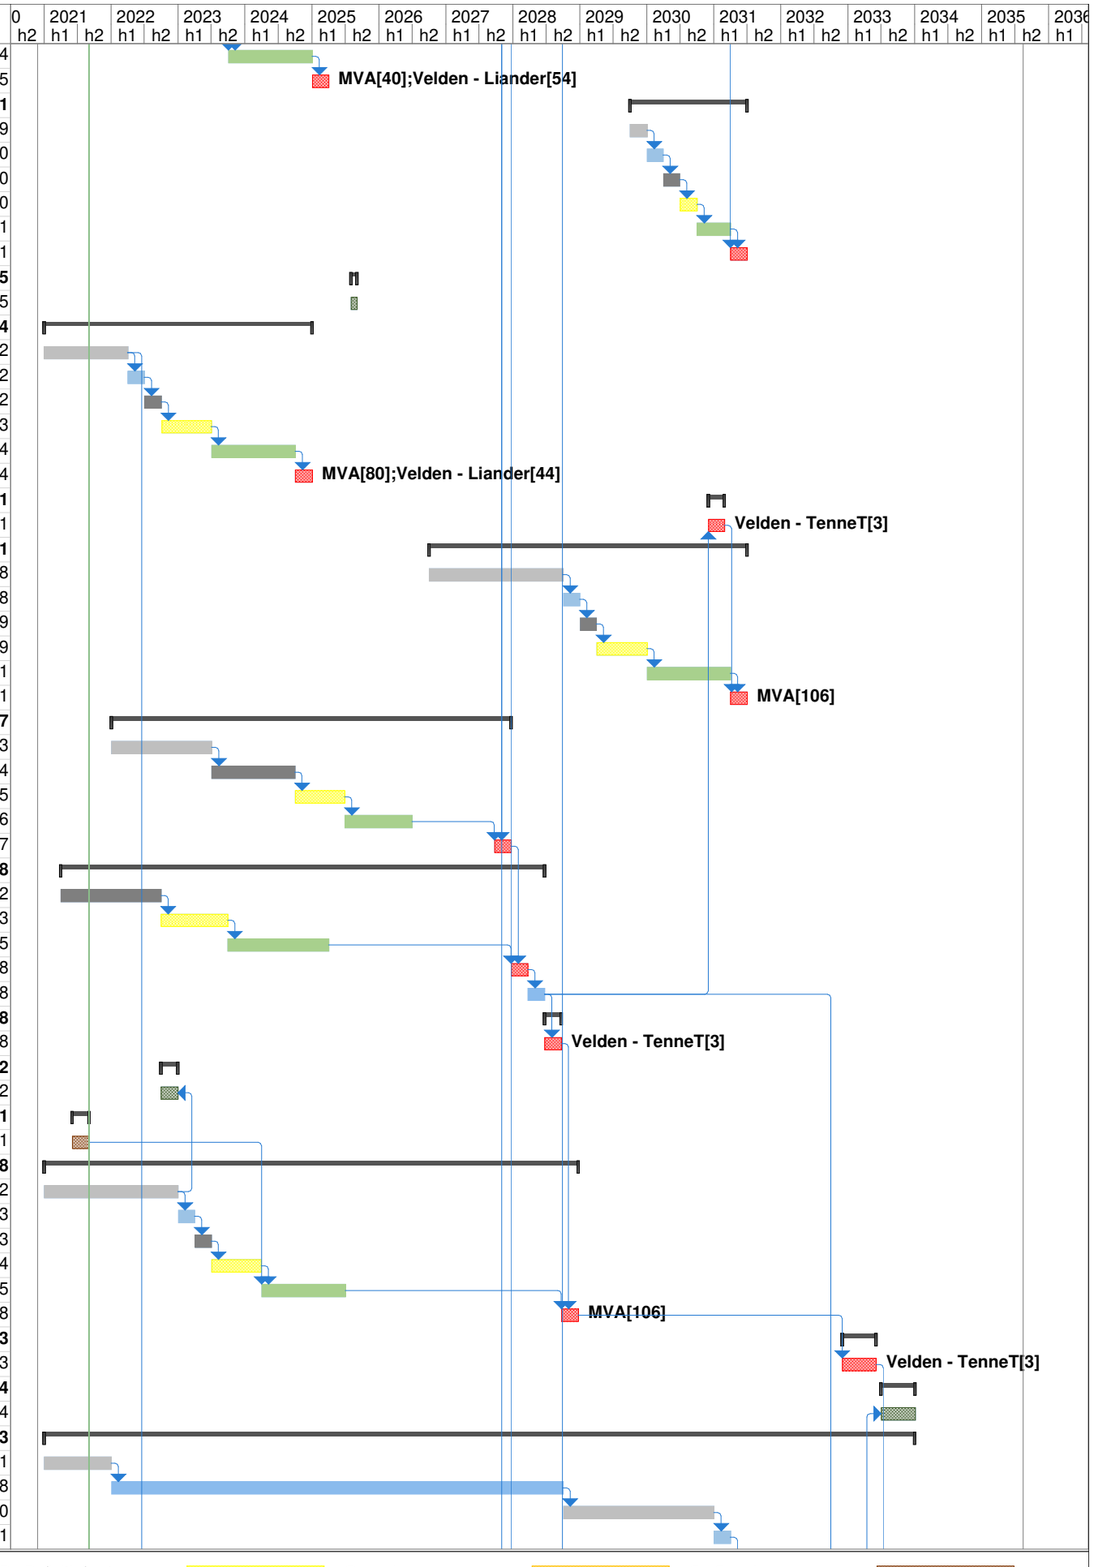

Project: NSV - Amsterdam
Datum: 2-9-2021

Mijlpaal
Handmatige samenvatting
T - TenneT
S - Studie
IV - Investeringsvoorstel
B - Basisontwerp
D - Definitief ontwerp
R - Realisatie
O - ombouw
IBN
G - Grond
K - Kabel

Id	Naam	UMS2	Asset	Opvolgende taken	een_brownfi	Eind
216	B	33991	Westzaanstra	217	Brownfield	Q2-2031
217	D	33991	Westzaanstra	218	Brownfield	Q1-2032
218	R	33991	Westzaanstra	219	Brownfield	Q2-2033
219	O	33991	Westzaanstra	220;210GB	Brownfield	Q3-2033
220	IBN	33991	Westzaanstra		Brownfield	Q4-2033
221	**150kV Netverbinding OS Hemweg-OS Basisweg**	**33992**	**Basisweg**		**Greenfield**	**Q4-2027**
222	S	33992	Basisweg	223	Greenfield	Q3-2023
223	B	33992	Basisweg	224	Greenfield	Q3-2024
224	D	33992	Basisweg	225	Greenfield	Q2-2025
225	R	33992	Basisweg	226	Greenfield	Q2-2026
226	IBN	33992	Basisweg	231	Greenfield	Q4-2027
227	**Realisatie 150kV GIS OS Basisweg**	**33992**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q2-2028**
228	B	33992	Basisweg	229	Brownfield	Q4-2022
229	D	33992	Basisweg	230	Brownfield	Q4-2023
230	R	33992	Basisweg	231	Brownfield	Q3-2025
231	IBN	33992	Basisweg	232	Brownfield	Q1-2028
232	Proefperiode	33992	Basisweg	234GE;256GE;286GE;291	Brownfield	Q2-2028
233	**OS Basisweg (BW) 3*150kV GIS velden**	**33992**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q2-2028**
234	IBN	33992	Basisweg	252	Brownfield	Q2-2028
235	**OS Basisweg (BW) 2*type C fase 1**	**33992**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q4-2024**
236	S	33992	Basisweg	237	Brownfield	Q4-2021
237	IV	33992	Basisweg	238	Brownfield	Q1-2022
238	B	33992	Basisweg	239	Brownfield	Q2-2022
239	D	33992	Basisweg	240	Brownfield	Q1-2023
240	R	33992	Basisweg	241	Brownfield	Q2-2024
241	O	33992	Basisweg	242;244GB	Brownfield	Q3-2024
242	IBN	33992	Basisweg		Brownfield	Q4-2024
243	**OS Basisweg (BW) 106MVA kabelplan en omzwaaien MS kabels**	**33992**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q4-2024**
244	K	33992	Basisweg		Brownfield	Q4-2024
245	**OS Basisweg (BW) 106MVA 150/10 kV uitbr fase 2**	**34754**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q3-2028**
246	S	34754	Basisweg	247	Brownfield	Q4-2024
247	IV	34754	Basisweg	248	Brownfield	Q1-2025
248	B	34754	Basisweg	249	Brownfield	Q2-2025
249	D	34754	Basisweg	250	Brownfield	Q1-2026
250	R	34754	Basisweg	251	Brownfield	Q2-2027
251	O	34754	Basisweg	252;254GB	Brownfield	Q3-2027
252	IBN	34754	Basisweg		Brownfield	Q3-2028
253	**OS Basisweg (BW) 106MVA kabelplan en omzwaaien MS kabels**	**34754**	**Basisweg**		**Brownfield**	**Q4-2027**
254	K	34754	Basisweg		Brownfield	Q4-2027
255	**TSA-UT OS Slotermeer (SM) 3*150kV GIS velden op OS BW + 2km 150kV VB**	**32625**	**Slotermeer**		**Brownfield**	**Q2-2028**
256	IBN	32625	Slotermeer	265	Brownfield	Q2-2028
257	**TSA-UT OS Slotermeer (SM) 106MVA kabelplan en omzwaaien MS kabels**	**32625**	**Slotermeer**		**Brownfield**	**Q4-2028**
258	K	32625	Slotermeer		Brownfield	Q4-2028
259	**TSA-UT OS Slotermeer (SM) 106MVA 150/10kV+2*type C**	**32625**	**Slotermeer**		**Brownfield**	**Q4-2028**
260	S	32625	Slotermeer	261	Brownfield	Q2-2022
261	IV	32625	Slotermeer	262	Brownfield	Q3-2022
262	B	32625	Slotermeer	263	Brownfield	Q4-2022
263	D	32625	Slotermeer	264	Brownfield	Q1-2024
264	R	32625	Slotermeer	265	Brownfield	Q2-2025
265	O	32625	Slotermeer	266;258GB	Brownfield	Q3-2028
266	IBN	32625	Slotermeer		Brownfield	Q4-2028
267	**OS Marnixstraat (MS) 3*150kV GIS velden op OS HSZ1 + 3km 150kV VB**	**34267**	**Marnixstraat**		**Brownfield**	**Q4-2032**
268	IBN	34267	Marnixstraat	277	Brownfield	Q4-2032
269	**OS Marnixstraat (MS) 80/106MVA (1)50/10kV+2*type C**	**34267**	**Marnixstraat**		**Brownfield**	**Q3-2033**
270	S	34267	Marnixstraat	271	Brownfield	Q4-2021
271	W	34267	Marnixstraat	272	Brownfield	Q2-2030
272	S	34267	Marnixstraat	273	Brownfield	Q1-2031
273	IV	34267	Marnixstraat	274	Brownfield	Q2-2031
274	B	34267	Marnixstraat	275	Brownfield	Q3-2031
275	D	34267	Marnixstraat	276	Brownfield	Q2-2032
276	R	34267	Marnixstraat	277	Brownfield	Q1-2033

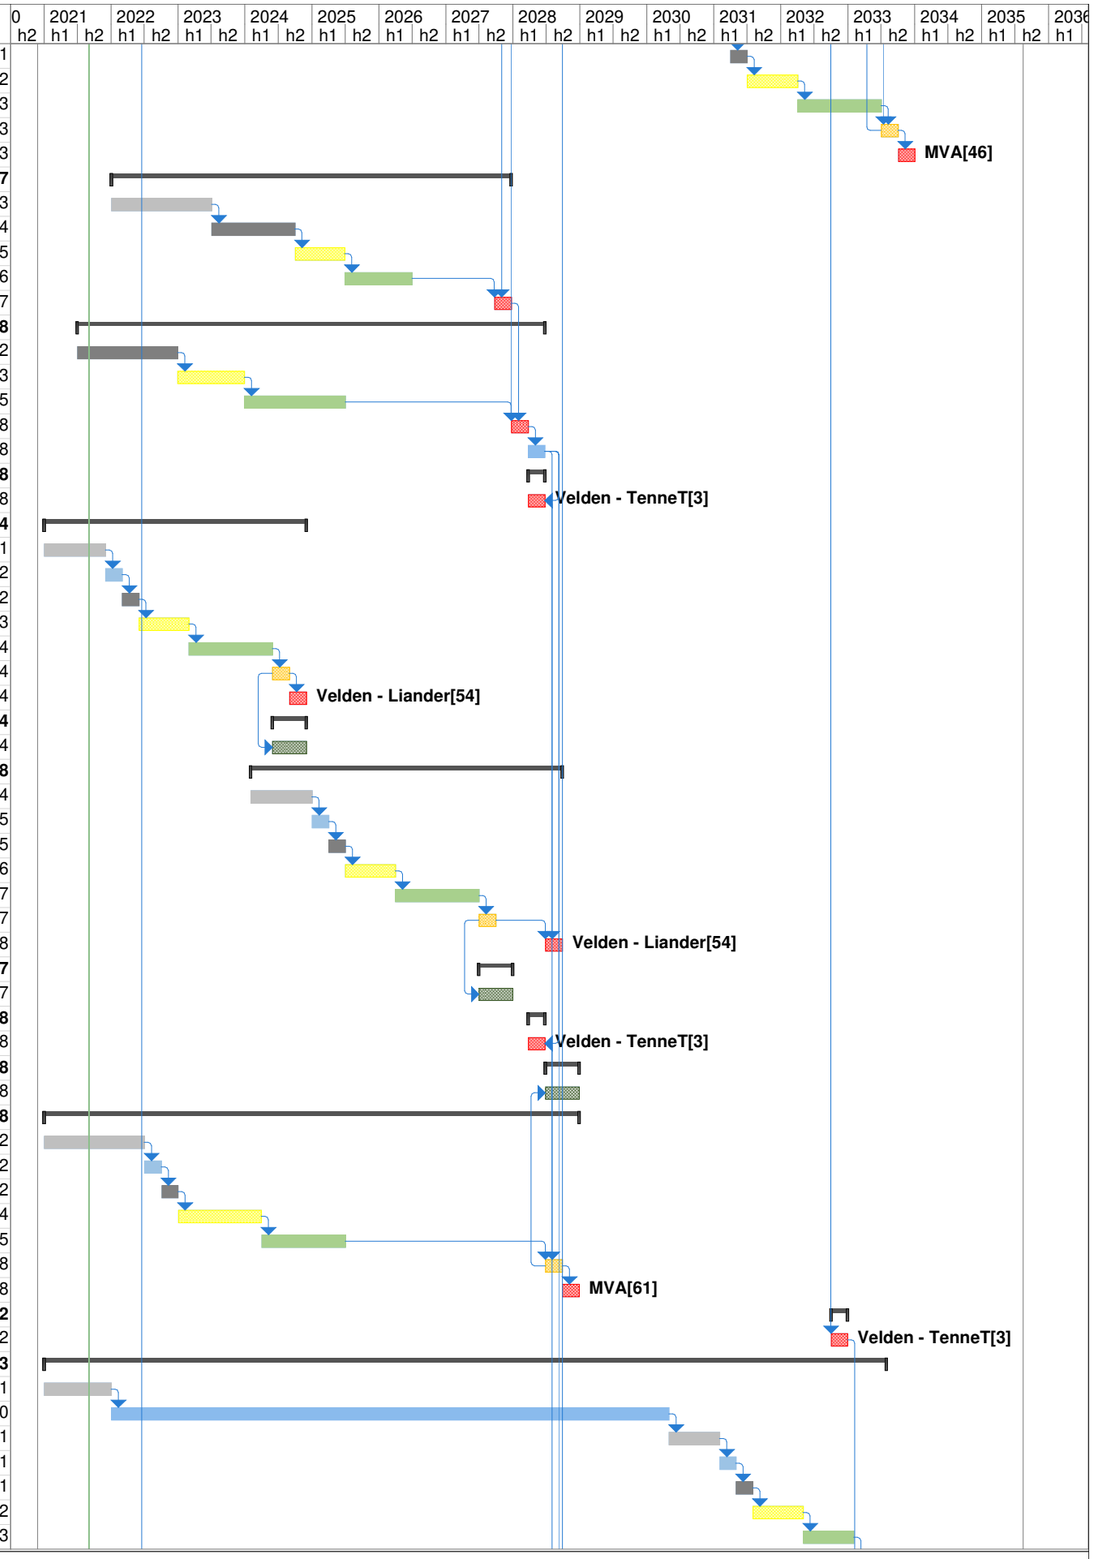

Project: NSV - Amsterdam
Datum: 2-9-2021

Mijlpaal
Handmatige samenvatting
T - TenneT
S - Studie
IV - Investeringsvoorstel
B - Basisontwerp
D - Definitief ontwerp
R - Realisatie
O - ombouw
IBN
G - Grond
K - Kabel

Id	Naam	UMS2	Asset	Opvolgende taken	een_brownfi	Eind
277	O	34267	Marnixstraat	278	Brownfield	Q2-2033
278	IBN	34267	Marnixstraat		Brownfield	Q3-2033
279	**OS Marnixstraat (MS) omzwaaien MS kabels**	**34267**	**Marnixstraat**		**Brownfield**	**Q2-2025**
280	K	34267	Marnixstraat		Brownfield	Q2-2025
281	**150kV Netverbinding OS Westpoort-OS Basisweg**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q2-2028**
282	S	27454	Westpoortweg	283	Greenfield	Q3-2022
283	B	27454	Westpoortweg	284	Greenfield	Q3-2023
284	D	27454	Westpoortweg	285	Greenfield	Q2-2024
285	R	27454	Westpoortweg	286	Greenfield	Q2-2025
286	IBN	27454	Westpoortweg	317	Greenfield	Q2-2028
287	**OS IJpolder (IJP) 40MVA 50/10kV+1 type C KOP+3 cellen**	**27458**	**IJpolder**		**Brownfield**	**Q2-2022**
288	R	27458	IJpolder	289	Brownfield	Q1-2022
289	IBN	27458	IJpolder		Brownfield	Q2-2022
290	**OS Ijpolder (IJP) 3*150kV GIS velden op OS BW (optie)+3km 150kV VB**	**aanm**	**IJpolder**		**Brownfield**	**Q3-2028**
291	IBN	aanm	IJpolder	300	Brownfield	Q3-2028
292	**OS IJpolder (IJP) omzwaaien MS kabels**	**27458**	**IJpolder**		**Brownfield**	**Q4-2022**
293	K	27458	IJpolder		Brownfield	Q4-2022
294	**OS IJpolder (IJP) 80/106MVA (1)50/10kV+1 type C KOP**	**34108**	**IJpolder**		**Brownfield**	**Q4-2028**
295	S	34108	IJpolder	296	Brownfield	Q1-2026
296	IV	34108	IJpolder	297	Brownfield	Q2-2026
297	B	34108	IJpolder	298	Brownfield	Q3-2026
298	D	34108	IJpolder	299	Brownfield	Q2-2027
299	R	34108	IJpolder	300	Brownfield	Q3-2028
300	IBN	34108	IJpolder		Brownfield	Q4-2028
301	**Realisatie 380/150kV GIS OS Spaarndam**	**27454**	**Spaarndam**		**Greenfield**	**Q2-2035**
302	S	27454	Spaarndam	303	Greenfield	Q1-2031
303	B	27454	Spaarndam	304	Greenfield	Q3-2032
304	D	27454	Spaarndam	305	Greenfield	Q3-2033
305	R	27454	Spaarndam	306	Greenfield	Q1-2035
306	IBN	27454	Spaarndam	312	Greenfield	Q2-2035
307	**150kV Netverbinding OS Spaarndam-OS Westpoort**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q3-2035**
308	S	27454	Westpoortweg	309	Greenfield	Q3-2022
309	B	27454	Westpoortweg	310	Greenfield	Q3-2023
310	D	27454	Westpoortweg	311	Greenfield	Q2-2024
311	R	27454	Westpoortweg	312	Greenfield	Q2-2025
312	IBN	27454	Westpoortweg		Greenfield	Q3-2035
313	**Realisatie 150kV GIS OS Westpoort Havengebied (WPO?)**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q4-2028**
314	B	27454	Westpoortweg	315	Greenfield	Q4-2024
315	D	27454	Westpoortweg	316	Greenfield	Q4-2025
316	R	27454	Westpoortweg	317	Greenfield	Q3-2027
317	IBN	27454	Westpoortweg	318	Greenfield	Q3-2028
318	Proefperiode	27454	Westpoortweg	320GE	Greenfield	Q4-2028
319	**TSA-NT OS Westpoort Havengebied (WPO?) 280MVA 3*150kV AIS velden**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q4-2028**
320	IBN	27454	Westpoortweg	333	Greenfield	Q4-2028
321	**TSA-NT OS Westpoort Havengebied (WPO?) 280MVA kabels omleggen**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q2-2027**
322	K	27454	Westpoortweg		Greenfield	Q2-2027
323	**TSA-NT OS Westpoort Havengebied (WPO?) aankoop grond/erfpacht**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q1-2025**
324	G	27454	Westpoortweg	332	Greenfield	Q1-2025
325	**TSA-NT OS Westpoort Havengebied (WPO?) 240MVA 150/50/10kV of 150/20/10 kV**	**27454**	**Westpoortwe**		**Greenfield**	**Q1-2029**
326	S	27454	Westpoortweg	327	Greenfield	Q4-2021
327	W	27454	Westpoortweg	328	Greenfield	Q2-2024
328	S	27454	Westpoortweg	329	Greenfield	Q4-2024
329	IV	27454	Westpoortweg	330	Greenfield	Q1-2025
330	B	27454	Westpoortweg	331	Greenfield	Q2-2025
331	D	27454	Westpoortweg	332	Greenfield	Q1-2026
332	R	27454	Westpoortweg	333	Greenfield	Q3-2027
333	IBN	27454	Westpoortweg	340	Greenfield	Q1-2029
334	**OS Ruigoord (RGD) 80?MVA 50?/10kV*2*type C+3*50?kV VB**	**34311**	**Ruigoord**		**Brownfield**	**Q4-2031**
335	S	34311	Ruigoord	336	Brownfield	Q3-2029
336	IV	34311	Ruigoord	337	Brownfield	Q4-2029
337	B	34311	Ruigoord	338	Brownfield	Q1-2030

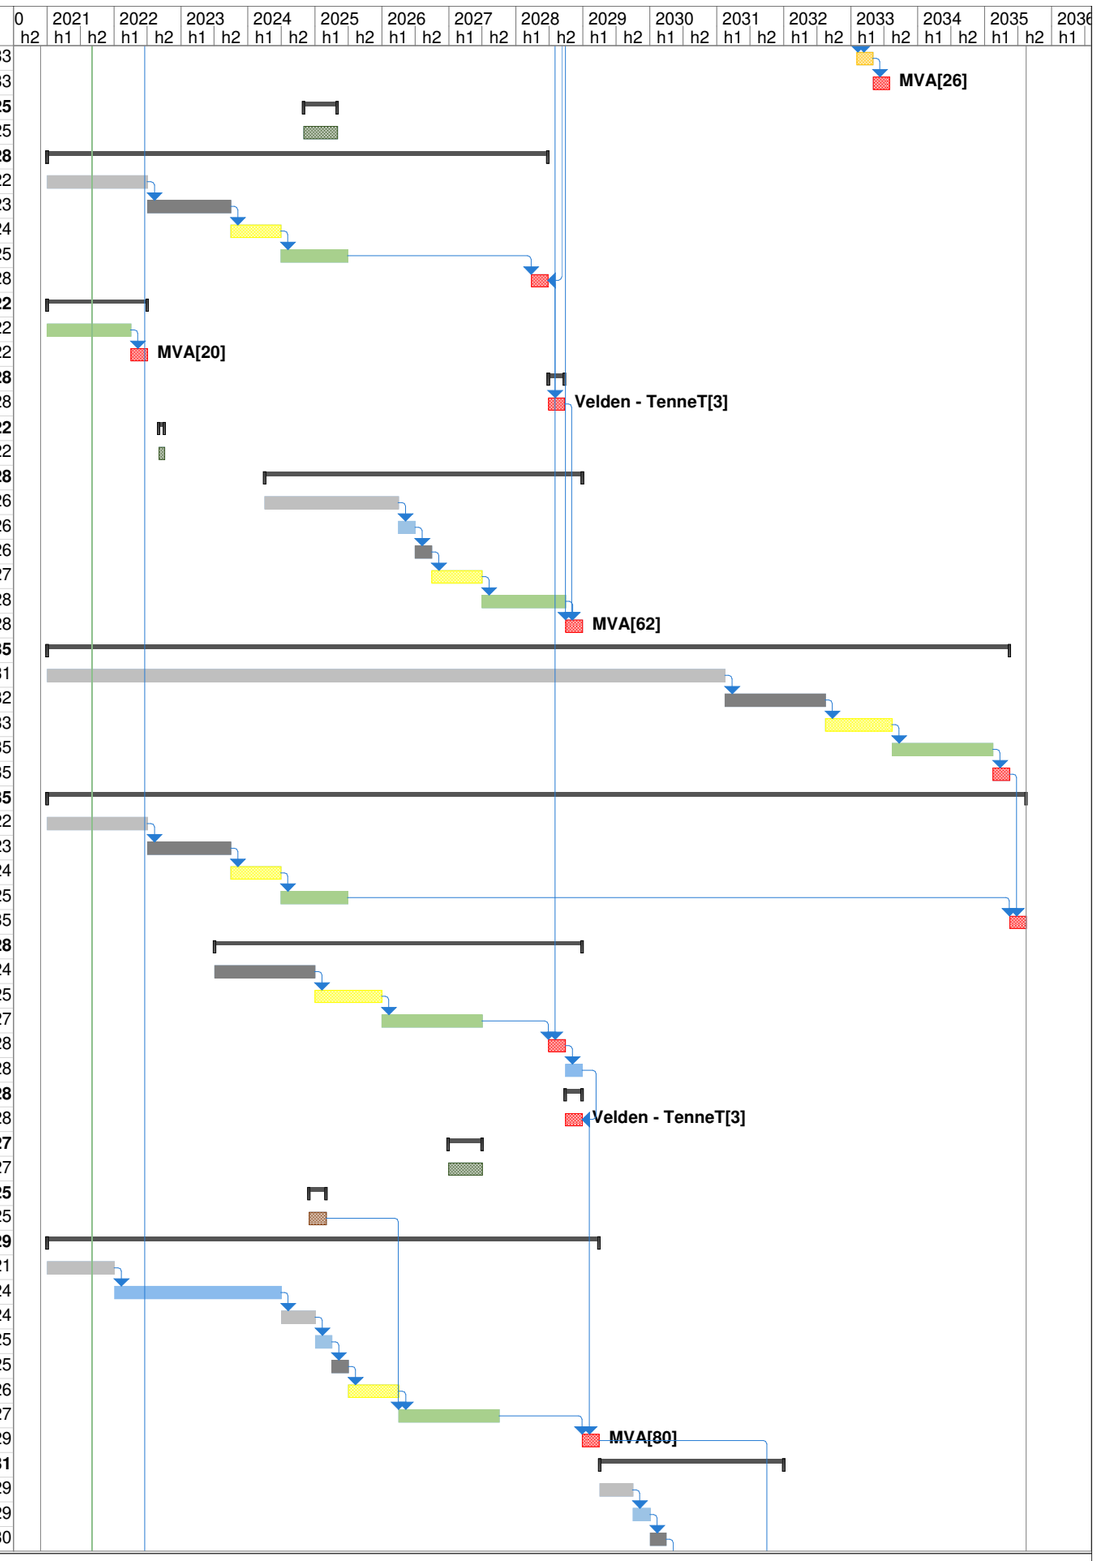

Project: NSV - Amsterdam
Datum: 2-9-2021

Mijlpaal
Handmatige samenvatting
T - TenneT
S - Studie
IV - Investeringsvoorstel
B - Basisontwerp
D - Definitief ontwerp
R - Realisatie
O - ombouw
IBN
G - Grond
K - Kabel

Id	Naam	UMS2	Asset	Opvolgende taken	een_brownfi	Eind
338	D	34311	Ruigoord	339	Brownfield	Q4-2030
339	R	34311	Ruigoord	340	Brownfield	Q3-2031
340	IBN	34311	Ruigoord		Brownfield	Q4-2031
529	**Realisatie 150kV GIS OS Nieuwe Meer2**	**31369**	**Nieuwe Meer**		**Greenfield**	**Q1-2025**
530	B	31369	Nieuwe Meer2	531	Greenfield	Q1-2022
531	D	31369	Nieuwe Meer2	532	Greenfield	Q1-2023
532	R	31369	Nieuwe Meer2	533	Greenfield	Q4-2024
533	IBN	31369	Nieuwe Meer2	568GB;536GB	Greenfield	Q1-2025
534	**TSA-UT OS Nieuwe Meer 2 (NMR2) 2*150kV GIS velden fase 1**	**31369**	**Nieuwe Meer**		**Brownfield**	**Q1-2025**
535	T	31369	Nieuwe Meer2	536	Brownfield	Q3-2024
536	IBN	31369	Nieuwe Meer2	545	Brownfield	Q1-2025
537	**TSA-UT OS Nieuwe Meer 2 (NMR2) verkoop terrein aan TenneT**	**31369**	**Nieuwe Meer**		**Brownfield**	**Q4-2022**
538	G	31369	Nieuwe Meer2	544	Brownfield	Q4-2022
539	**TSA-UT OS Nieuwe Meer 2 (NMR2) 80MVA 150/20kV+1*type E+alle BK fase 1**	**31369**	**Nieuwe Meer**		**Greenfield**	**Q2-2025**
540	S	31369	Nieuwe Meer2	541	Greenfield	Q3-2021
541	IV	31369	Nieuwe Meer2	542	Greenfield	Q4-2021
542	B	31369	Nieuwe Meer2	543	Greenfield	Q1-2022
543	D	31369	Nieuwe Meer2	544	Greenfield	Q2-2023
544	R	31369	Nieuwe Meer2	545	Greenfield	Q4-2024
545	IBN	31369	Nieuwe Meer2	558;555;548	Greenfield	Q2-2025
556	**OS Nieuwe Meer2 (NMR2) 1*150kV GIS veld fase 2**	**35345**	**Nieuwe Meer**		**Brownfield**	**Q2-2031**
557	T	35345	Nieuwe Meer2	558	Brownfield	Q1-2031
558	IBN	35345	Nieuwe Meer2	565	Brownfield	Q2-2031
559	**OS Nieuwe Meer2 (NMR2) 3e 80MVA trafo+1*type E fase 2**	**35345**	**Nieuwe Meer**		**Brownfield**	**Q3-2031**
560	S	35345	Nieuwe Meer2	561	Brownfield	Q2-2029
561	IV	35345	Nieuwe Meer2	562	Brownfield	Q3-2029
562	B	35345	Nieuwe Meer2	563	Brownfield	Q4-2029
563	D	35345	Nieuwe Meer2	564	Brownfield	Q3-2030
564	R	35345	Nieuwe Meer2	565	Brownfield	Q2-2031
565	IBN	35345	Nieuwe Meer2		Brownfield	Q3-2031
566	**OS Schipluidenlaan (SL) 3*150kV GIS velden op OS NMR2+??km 150kV VB**	**34714**	**Schipluidenla**		**Brownfield**	**Q4-2027**
567	T	34714	Schipluidenlaa	568	Brownfield	Q1-2027
568	IBN	34714	Schipluidenlaa	579GB	Brownfield	Q4-2027
569	**OS Schipluidenlaan (SL) 106MVA omzwaaien MS verbindingen**	**34714**	**Schipluidenla**		**Brownfield**	**Q4-2027**
570	K	34714	Schipluidenlaa		Brownfield	Q4-2027
571	**OS Schipluidenlaan (SL) 106MVA 150/10kV+2*type C**	**34714**	**Schipluidenla**		**Brownfield**	**Q3-2027**
572	S	34714	Schipluidenlaa	573	Brownfield	Q4-2021
573	W	34714	Schipluidenlaa	574	Brownfield	Q3-2023
574	S	34714	Schipluidenlaa	575	Brownfield	Q1-2024
575	IV	34714	Schipluidenlaa	576	Brownfield	Q2-2024
576	B	34714	Schipluidenlaa	577	Brownfield	Q3-2024
577	D	34714	Schipluidenlaa	578	Brownfield	Q3-2025
578	R	34714	Schipluidenlaa	579	Brownfield	Q1-2027
579	O	34714	Schipluidenlaa	580;570GB	Brownfield	Q2-2027
580	IBN	34714	Schipluidenlaa		Brownfield	Q3-2027
698	**AC7 Caransa Westpoort Datacenter 100MVA op 50kV OS Hemweg (HW) matrix Aanleg**	**32433**	**Hemweg**		**Greenfield**	**Q1-2022**
699	K	32433	Hemweg		Greenfield	Q1-2022
702	**TSA-N OS Nieuw Poortstraat (NPS) 80MVA 150/10kV kabelplan**	**33770**	**Nieuw Poorts**		**Greenfield**	**Q1-2022**
703	K	33770	Nieuw Poortst		Greenfield	Q1-2022
708	**AC7 Serverfarm 35MVA 50kV OS Hemweg (HW) administratie Aanleg**	**34187**	**Hemweg**		**Greenfield**	**Q4-2024**
709	K	34187	Hemweg		Greenfield	Q4-2024
712	**AC7 PTA Walstroom 30MVA op 50kV OS Noord Papaverweg administratie Aanleg**	**34395**	**Noord Papav**		**Greenfield**	**Q1-2024**
713	K	34395	Noord Papave		Greenfield	Q1-2024

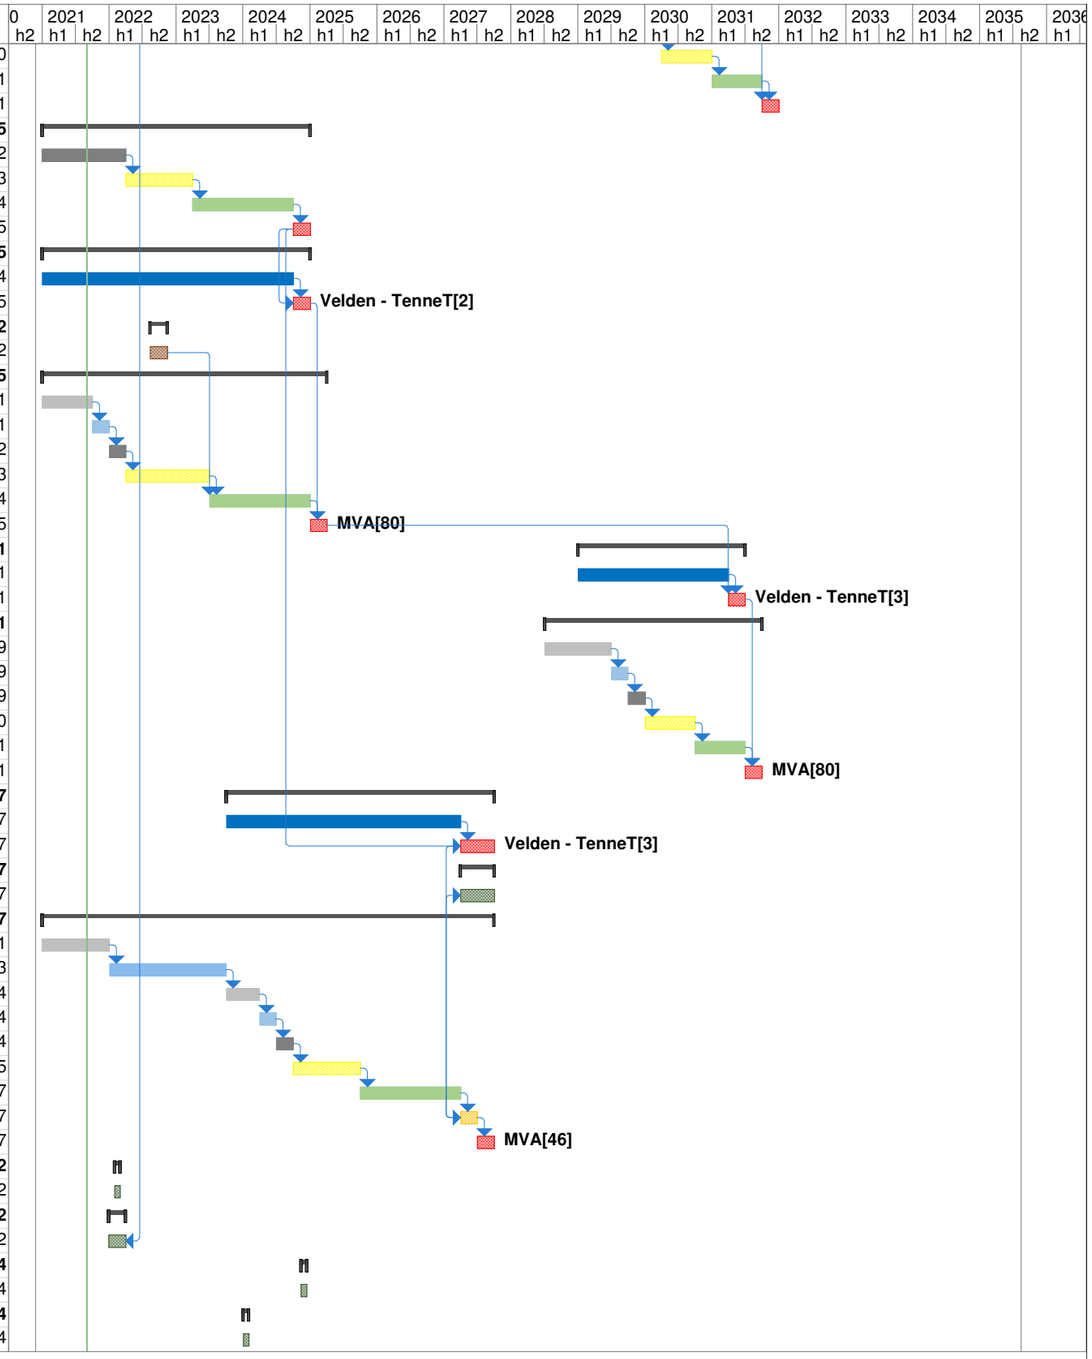

Project: NSV - Amsterdam
Datum: 2-9-2021

Mijlpaal
Handmatige samenvatting
T - TenneT
S - Studie
IV - Investeringsvoorstel
B - Basisontwerp
D - Definitief ontwerp
R - Realisatie
O - ombouw
IBN
G - Grond
K - Kabel
