NOTITIE

STRUCTURE
engineering
Pieter Calandlaan 315
1068 NH Amsterdam
email:info@str-eng.nl
telefoon:020-2235941
internet:www.str-eng.nl

Betreft: Wapeningskeuring wand Sarphatipark 87, Amsterdam
Datum: 30-09-2021
Opgesteld:
Structure Engineering B.V.

Op 30 september 2021 heb ik de wapening van de kelderwanden gekeurd op de Sarphatikade 87 aan de hand van de wapeningstekeningen van Structure Engineering CO-19186-REV2. Een paar kleine opmerkingen zijn hieronder met fotos verduidelijkt. Ze zijn ook ter plaatste met de vlechter besproken welke ze direct ging aanpassen. Na dat aanpassen kan de bekisting geplaatst worden.

.

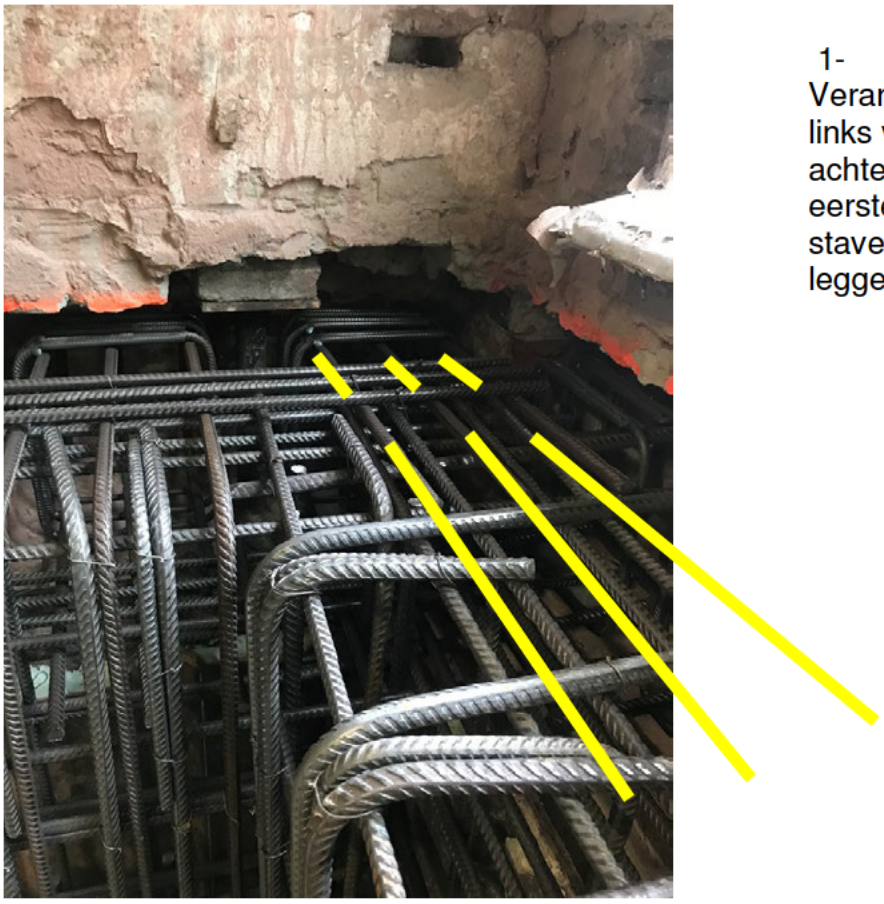

1-
Verankerings lengte van hoekkas links voor en hoek kas links achter verlengen van alleen de eerste korf. Door 3 stuks rond 16 staven l=1m tot in de kas bij te leggen



2-
Wapening tegen metselwerk aan..baksteen verwijderen



3-
In linker en rechterhoek bij voorgevel, vertikale staven plaatsen op de hoeken.
