From 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Subject **RE: Oostbrug: Planning SSK-raming, --> kritische noot vanuit TM!!**
To 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Cc 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>, 5.1, 2, e < 5.1, 2, e @amsterdam.nl>
Date June 15, 2026, 3:25:05 PM CEST

5.1, 2, e

Vanochtend heeft 5.1, 2, e dit schema ook toegelicht in het P-team overleg Hasko. Ik kan het schema redelijk volgen. Het is alleen een deel van het werk/proces en er ontbreken zaken.
5.1, en ik hebben hier vanochtend ook over gesproken. En 5.1, heeft een voorzet gedaan voor een meer completere planning/processchema.

Hieronder onze reactie aan alleen jou op deze mail.
De term Go/No-Go is niet geheel dekkend. Het is meer bedoeld als moment waarop we overeenstemming moeten krijgen welke inhoud we wel/niet meenemen in het IRO ontwerp en raming. En waarom sommige onderwerpen op 18/6 en andere op 25/6 gekozen zijn is redelijk arbitrair.
De inhoud van de Go/No-Go momenten sluit aan bij de geagendeerde bespreekpunten voor IPM, doo 5.1, 2, e. Dat is een fijne constatering. We hebben dus een eenduidig beeld wat er nog alleemaal moet gebeuren om tot afronding te komen.

Wat belangrijk is: 8/7/26 moet de raming (concept) gereed zijn. Deze 8/7/26 is ingegeven door de vakantie van 5.1, 5.1, 2, e

Voordat deze raming gereed is moet ook het IRO 100% gereed zijn inclusief review. Deze review tijd staat niet in het schema.
Wij (ik heb zelf dit initiatief genomen) hebben voor 5.1, 2, e nu een review moment ingepland (week 26), wetende dat het wel eens krap kon worden. Dat gaat lukken. Maar voor geleidewerken moet nog veel gebeuren, eerst overeenstemming over de inhoud opdracht, uitvoeren opdracht, review en dan afronden. Daarna kan formeel pas de output in de raming opnemen. Dit zie je nu niet terug in het schema. Ook review op uitvoeringsplan ontbreekt
Ook de overige werkzaamheden NOK24, zoals de onderzoeksvragen, aansluiting landhoofden, nautisch ontwerp zie je niet terug in het schema. En ook die reviewtijd niet.
Dus wat helpt is een reëler en completer processchema inclusief review tijd.

5.1, 2, e is nu druk aan het sturen op het halen van deze planning. De integrale sessie op 2/7 komt bij ons nu over als voldongen feit en een moment waarop we samen over de “open eindjes” moet beslissen. En omdat het nu op het einde allemaal snel moet, kunnen er nog best wel eens veel open eindjes zijn. Dat voelt niet fijn en was niet nodig. Wij/ik vragen al geruime tijd (zeker vanaf begin mei), kom met een aanbieding voor het restant Nok24. Juist om waar we nu tegen aan lopen te voorkomen.

Die vorm van integrale sessies is op zich niet verkeerd, maar dat ontslaat ons niet van het hebben van normale review tijd op producten/onderwerpen. Plus dat de nu uitgenodigde collega’s niet alle onderwerpen afdekken is mijn mening.

Kortom: vanuit TM nog niet even positief gestemd met dit voorstel.

5.1, 2, e

P.s.: ik kan dit ook me 5.1, 2, e elen, maar ik deel het eerst even via jou als verantwoordelijke Amsterdam

---

Van: 5.1, 2, e @haskoning.com>
Verzonden: vrijdag 12 juni 2026 20:51
Aan: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @amsterdam.nl>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @fugro.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>; 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
CC: 5.1, 2, e 5.1, 2, e @haskoning.com>
Onderwerp: Oostbrug: Planning SSK-raming

Best gezamenlijke team,

Zoals jullie* weten is het van eminent belang dat we (lees Haskoning) op 8 juli a.s. een gedegen en betrouwbare SSK-raming leveren, **MAAR** dat gaat niet zonder jullie belangrijke bijdrage en inspanning!! Los van het feit dat deze datum al enige tijd staat is de urgentie van deze datum versterkt door recente publicatie in de Telegraaf over de benodigde investeringsbedragen. Dat betekent evenwel dat om deze datum te behalen van jullie allen een (urgente) inspanning gevraagd wordt!


In bijgesloten en onderstaande figuur zijn zowel de afhankelijkheden als de personen (zowel bij de gemeente Amsterdam als bij Haskoning) aangewezen om daar een wezenlijke bijdrage in te leveren. Doel van de figuur is de afhankelijkheden inzichtelijk maken zodat ook duidelijk wordt hoe de processen lopen en waarom de gevraagde bijdrage ook belangrijk is op de vastgestelde datum.

A.s. maandag in het ontwerpoverleg van Haskoning zal ik dit nogmaals onder de aandacht brengen, mochten hier vragen over zijn dan hoor ik deze graag.

Al met al verwacht ik dat we een haalbaar proces, planning en inspanning van jullie vragen. Eigenaren van de bewaking van dit proces en planning zijn 5.1, 2, e (Amsterdam) en ondergetekende (Haskoning), dit betekent dat eventuele issues met dit proces en planning onverwijld bij één van ons moeten worden gemeld vóór woensdag a.s, omdat we dan dit proces en planning bespreken met de respectievelijke kostenramers en verantwoordelijkheden voor de SSK-raming zelf.

Vanzelfsprekend ben ik bereikbaar en beschikbaar voor vragen hierover en ben ik vol vertrouwen en positief gestemd dat ons dit gezamenlijk gaat lukken én bedank ik jullie op voorhand voor je hogelijk gewaardeerde en deskundige inspanning!

Met vriendelijke groet,
5.1, 2, e
p.s. 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e 5.1, 2, e spreekt je binnenkort hierover

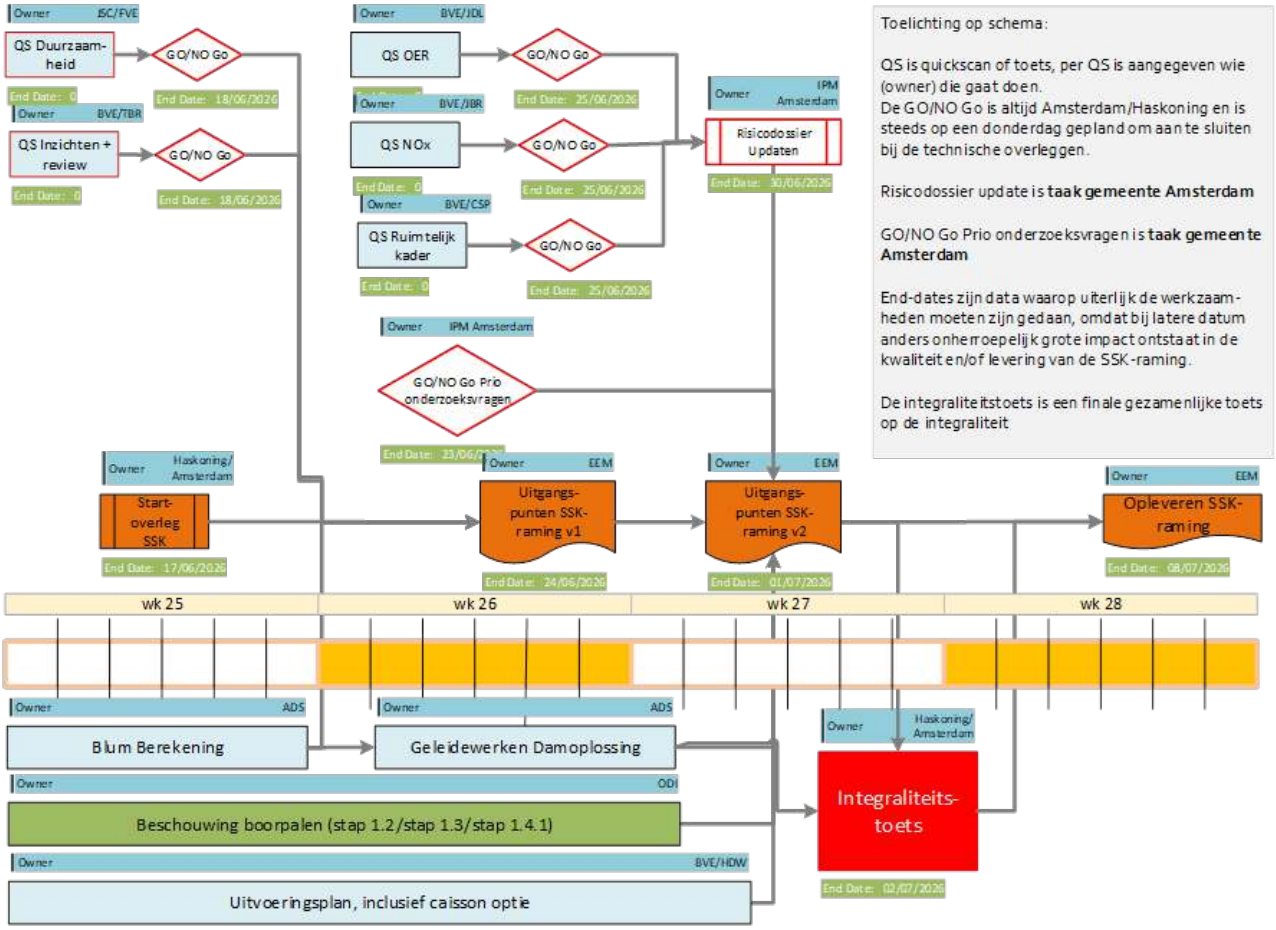

5.1, 2, e 1, 2, e
Sr. Projectmanager

M 5.1, 2, e | **E** 5.1, 2, e haskoning.com | **W** www.haskoning.com
Haskoning Nederland B.V.
Contactweg 47 | Postbus 94241, 1090 GE Amsterdam | Contactweg 47, 1014 AN Amsterdam
KvK : 56515154

Haskoning
Enhancing Society Together

This email and any attachments are intended solely for the use of the addressee(s); disclosure or copying by others than the intended person(s) is strictly prohibited. If you have received this email in error, please treat this email as confidential, notify the sender and delete all copies of the email immediately
