Verslag 31 overleg M&A + Omgevingsdienst

Datum
10 oktober 2024

Referentie
2203-17228- v 0.31

Project
S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM

Aanwezig: 15-10-2024	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1, 2, e	ARTIS	
5.1, 2, e	M&A Amsterdam	
	M&A Amsterdam	5.1, 2, e
	Omgevingsdienst Amsterdam	5.1, 2, e
	Verlaan en Bouwstra	5.1, 2, e
	OTH	5.1, 2, e
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	Salverda	
5.1, 2, e	BBN directievoerder	
	Venema	5.1, 2, e

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
31.01	**Opening en mededelingen**	
	5.1, 2, e opent het overleg en heet iedereen welkom.	
31.02	**Verslag vorige verslag**	
	Geen opmerkingen	
31.03	**Werkplannen**	
	Voor het werk zijn de werkplannen gereed, er worden geen werkplannen (anders dan eventueel in overleg bepaald) meer aangeleverd.	Besluit
31.04	**Natuursteen gevel**	
28.04.1	ARTIS heeft een opname gemaakt van de herstelwerkzaamheden van het natuursteen onder de timpaan, Salverda heeft hiervoor inmiddels een aanvullende opdracht ontvangen. Doelstelling wat betreft de planning is om dit jaar de werkzaamheden af te ronden.	Salverda
30.04.1	De bestaande gootbeugels (rond van het bordes boven het rode natuursteen) worden weer voorzien van een koperen goot.	Salverda

31.01.1	Het rode natuursteen monster is beoordeeld en akkoord bevonden. Deze steen komt uit onderstaande groeve (de specificaties) • Groeve is: Schweinstalersandstein Udelfanger sandstein groeve in de Eiffel. • Type zandsteen: Udelfanger sandstein röd. Uit de groeve komen vier verschillende kleuren rood, ligt er net aan waar ze in de groeve het steen eruit halen, deze hebben allemaal bovenstaande naam. De kleur van de inboetsteen wordt bijpassend aan het gebouw gezocht.	
31.05	**Stucwerkgevel**	
30.05.1	Bij de stukwerkgevel worden op plekken (onder de 'spekband') nog extra retoucheerwerkzaamheden uitgevoerd.	
31.06	**Daken**	
	Geen opmerkingen.	
31.07	**Binnenafbouw**	
29.07.1	Rotonde: afbouw van de ruimte, reactie op de vraag van ARTIS is ontvangen, het extra kleurenonderzoek in de ruimte is inmiddels uitgevoerd. 5.1, 2, e zal hiervan de gegevens verzamelen.	ARTIS/FF *ARTIS*
30.07.1	Vrij leggen bestaande marmering: onder een aantal panelen zat geen bestaande marmering, in het verleden zijn hier werkzaamheden aan uitgevoerd. ARTIS heeft besloten om de vlakken die geen originele marmering hebben te gaan voorzien van een nieuwe marmerimitatie, de overige vlakken blijven origineel met her en der kleine herstellingen. 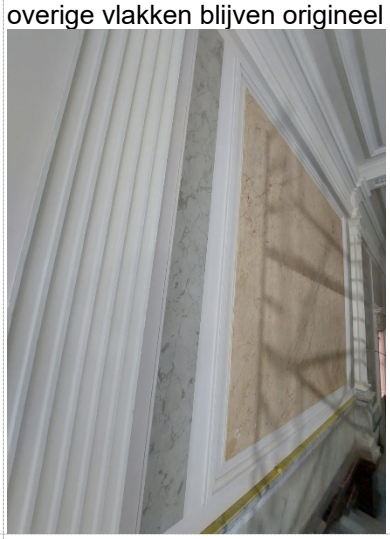	
31.08	**Glas/Kozijnen**	
	Geen opmerkingen.	
31.09	**Kunstopdracht**	
	Het VO van de kunstopdracht wordt tzt toegelicht	LvL
31.10	**Overige bespreekpunten**	
	Geen bijzonderheden te melden.	

31.11	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw. Punten zijn in het verslag verwerkt.	
31.12	**Volgende vergadering**	
	Volgend overleg staat gepland op: dinsdag 26 november, tijdstip 13:00uur.	
