Verslag 18 overleg M&A + Omgevingsdienst

	Datum	Referentie
	9 mei 2023	2203-17228- v 0.18
Behandeld door	**Project**	
5.1.2e	S04622 ARTIS Aquarium AMSTERDAM	

Aanwezig: 9-05-2023	**Namens:**	**Afwezig:**
5.1.2e	ARTIS	
5.1.2e	M&A Amsterdam	5.1, 2, e
5.1.2e	M&A Amsterdam	
5.1.2e	Omgevingsdienst Amsterdam	
	Verlaan en Bouwstra	
5.1.2e	OTH	5.1.2e
	Salverda	
	Salverda	5.1.2e
	BBN directievoerder	
	Salverda	5.1.2e
	Salverda	
	Venema	
	Rijksdienst cultureel erfgoed	

Kopie aan alle aan- en afwezigen; agendapunten zijn items met genoemde datum.

Punt	*Agendapunt*	*Actie door*
18.01	**Opening en mededelingen**	
18.01	5.1.2e heet iedereen welkom en licht kort de nieuwe agendapunten voor dit overleg toe.	
18.01.1	5.1.2e geeft complimenten aan het team over de benaderingen van diverse onderwerpen en overleggen bij het Aquarium project, dit is een voorbeeld binnen ARTIS hoe het bij andere projecten in de dierentuin zou moeten gaan.	Mededeling
18.02	**Verslag vorige verslag**	
	Verslag 18-04-2023 – Geen opmerkingen, Akkoord.	
18.03	**Werkplannen**	
	Geen nieuwe meldingen.	
18.04	**Natuursteen gevel**	
	Onderzoek zandsteen, TNO maakt hiervan een rapportage. Deze zal t.z.t. gedeeld worden. 5.1.2e en 5.1.2e gaan hier nogmaals achteraan.	5.1.2e
	Bij de start van de werkzaamheden worden bij bewerking (uithakken voegen, reinigen en bepalen van voegkleuren) M&A uitgenodigd om dit te beoordelen, kansen zijn bij deze beoordeling om e.e.a. eventueel bij te kunnen sturen.	Salverda

18.04.1	Het testen van reinigen met laser is uitgevoerd, de resultaten van de diverse gradaties zijn in het werk bekeken. Er is gekozen voor reiniging klasse 1 & 2. De vakman start binnenkort met het reinigen, de startdatum wordt gedeeld zodat het werk Beoordeeld kan worden vanaf de start om wellicht nog kleine wijzingen te kunnen bespreken.	Vaststelling
18.04.2	Ook een proef met luchtgommen is uitgevoerd, deze is in het werk ook beoordeeld en akkoord bevonden.	Vaststelling
18.04.3		

18.05	**Stucwerkgevel**	
17.05.1	Tijdens de rondgang zijn hier geen bijzonderheden opgemerkt, voortgang gaat volgens planvorming, kwaliteit van het werk is akkoord.	Vaststelling
18.06	**Daken**	
	Attiek: wordt meegenomen in de werkvoorbereiding en afgestemd met V&B	5.1.2e 5.1.2e
17.06.1	Het dak veiligheidssysteem (Irata) is akkoord met uitzondering van de positie van de koker op het middelste dakvlak (dak timpaan) Positie hiervan wordt van te voren afgestemd.	Salverda
18.06.1	De kleur van de gootlijst is opgezet. De definitieve kleur is bepaald op Keim S107 .	Vaststelling

18.06.2	De hoge vels volgens onderstaand detail is niet maakbaar in de praktijk, in het werk is een proefstuk gemaakt met de maximale hoogte in combinatie met ronde dak. De vels kan maximaal 75mm worden opgezet. Op locatie is dit bekeken en de wijziging is akkoord bevonden 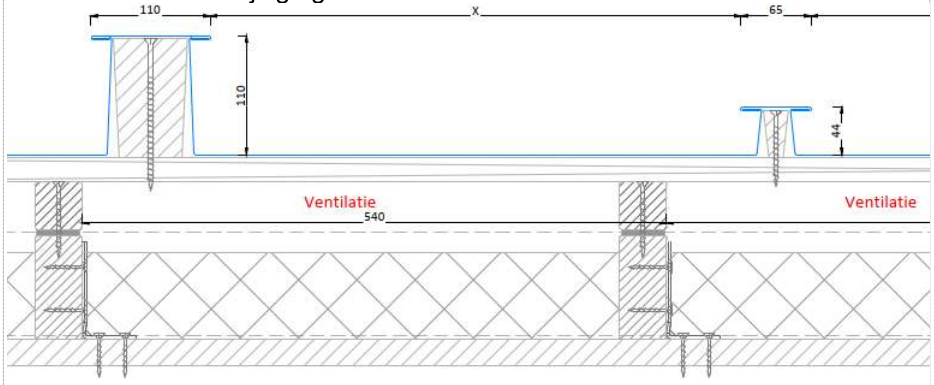	Vaststelling
18.07	**Binnenafbouw**	
16.07.1	De schoren t.b.v. het dak boven de aquaria moet verwijderd worden om voldoende hoogte te creëren boven de trap. Akkoord gegeven om dit te vervangen voor een stalen trek stang aan de bovenkant. Aansluitpunten oude schoor behouden. Detail nog aanleveren.	Salverda
17.07.1	Stukwerk: delen stukwerk worden verwijderd ivm loszittende lagen, nieuwe afwerkingen, zoutbelaste onderdelen. Vooraf met V&B doornemen waar wat verwijderd wordt en waar wat kan worden gehandhaafd. Momenteel worden hiervoor onderzoeken uitgevoerd, de komende periode moet dit meer inzicht geven.	
18.08	**Glas/Kozijnen**	
	Achter kozijnen ruimte Stramien 22-26 / A (nabij ruimte -1.18) zit een betonvloer, Uitzoeken hoe we hier mee omgaan en een voorstel aan 5.1.2e doen. Figuurglas, Overloop van transparantie, er is bepaald door OTH dat er standaard glas wordt geplaatst, in de praktijk gaan we bekijken of het hinderlijk is dat er een constructie zichtbaar is en wellicht dan nog toevoegingen nodig zijn.	vaststelling
18.08.1	De kleur van de kozijnen is opgezet, de definitieve kleur is bepaald op RAL 1015 romig beige-geel.	Vaststelling
18.08.2	De kleur van het raamhout is opgezet, de definitieve kleur is bepaald op Sikkens S 4550-Y40R.	Vaststelling
18.09	**Overige bespreekpunten**	
18.10	**Rondgang bouw**	
	Geen bijzonderheden te melden uit de rondgang van de bouw.	

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1, 2, 3
