From: "5.1,2,e" <5.1,2,e@waternet.nl>
Sent: Wed, 11 Nov 2020 16:42:38 +0200
To: "5.1,2,e" <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Cc: "5.1,2,e" <5.1,2,e@waternet.nl>
Subject: RE: Raakvlaktekening Koninginneweg 20187109

Beste 5.1,2,e

5.2,1

De mogelijkheid tot schuin metselen is niet wenselijk aangezien de putconstructie hierdoor verzwakt en daar is de Koninginneweg veel te druk voor. (teveel zwaar verkeer)

Als je nog een overleg in gedachte hebt kun je 5.1,2,e en mijzelf uitnodigen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Korte Ouderkerkerdijk 7
1096 AC Amsterdam

5.1,2,e

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: woensdag 11 november 2020 09:35
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@waternet.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@waternet.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e@waternet.nl>
Onderwerp: Raakvlaktekening Koninginneweg 20187109

5.1,2,e bijgevoegd een pdf van de nieuwe situatie maar ook waar het riool in is getekend. In de pdf heb ik een aantal mogelijke knelpunten gemarkeerd. Jullie hebben al eerder aangegeven een drietal oversteken te moeten vervangen. Op een flink aantal plaatsen komen putten redelijk dicht bij het spoor uit, wat houden jullie als minimale afstand aan? (ik zal deze vraag ook bij het gvb neeleggen). Is er de mogelijkheid om de put enigszins schuin te vermetselen en tot hoever mag dit? Zal ik voor volgende week een overleg inplannen om deze zaken te kunnen bespreken? Kun jij aangeven wie daar bij aanwezig zou moeten zijn en wanneer jullie gelegenheid hebben?
Dank je wel alvast.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 14:24
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

5.1,2,e

De ondersteken onder de trambaan door zijn werken die waternet zelf wilt uitvoeren.
De verlegging van het riool ø700 op verzoek van de gemeente door de nieuwe indeling zal door de gemeente bekostigd dienen te worden. Hier zullen wij apart een offerte voor opstellen. Graag zien wij deze wens, verlegging op tekening zodat wij deze kunnen beoordelen en ramen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Afdeling Leidingwerken
5.1,2,e
5.1,2,e @waternet.nl

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 13:26
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

5.1,2,e
Met een SOK bedoel ik een samenwerkingsovereenkomst waarin we afspraken tussen Waternet en IB vastleggen over de scope van het werk en bijvoorbeeld de kosten.
Uitvoering van het werk staat gepland van 1e kwartaal 2022. Doel is om het bestek rond de zomer van 2021 op de markt te zetten. Het zou voor waternet dan inhouden dat ze een ontwerp moeten maken voor de verlegging van ongeveer de 100m rond 700 en de 3 oversteken. We moeten even afstemmen of jullie ook de besteksposten maken of dat wij dat doen in overleg met jullie maar daar gaan we vast uitkomen.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 09:16
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

Beste 5.1,2,e

Het stadsdeel Zuid is inmiddels overgenomen door mijn collega 5.1,2,e ; 5.1,2,e @waternet.nl

Kan je ons aangeven wat je met SOK bedoelt.

Graag horen wij zoo spoedig mogelijk of er veranderingen aan de ø700 plaats moeten vinden.
Dit zodat wij ook kunnen checken of het mogelijk is.

Op basis van deze informatie kunnen wij de Projectopdracht maken en deze binnen waternet Uitzetten.
Uiteraard heeft Waternet leidingwerken voorbereidingstijd nodig, minstens 1 jaar.
Hoe eerder alles duidelijk is hoe beter. Om vertragingen te voorkomen.

Wat is nu de planning om te starten.

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
Afdeling Leidingwerken
5.1,2,e
5.1,2,e @waternet.nl

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>
Verzonden: donderdag 5 november 2020 08:35
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

5.1,2,e dank je wel voor je reactie. De drie oversteken die overblijven lopen dwars door ons werk en het zou mooi zijn als we met elkaar kunnen afspreken dat de werkzaamheden in het project van de Koninginneweg gevoegd kunnen worden. Er is wel eerder over gesproken maar formeel vastleggen lijkt me ook goed, dat zal dan wel met een SOK gaan denk ik. Verder is de verwachting dat vanwege de verplaatsing van de halte Zeilstraat naar de Koninginneweg een deel van het 700mm riool aan de noordzijde omgelegd zal moeten worden, het gaat dan over een lengte van ongeveer 100m. Wij gaan de komende weken het nieuwe ontwerp van het spoor over de tekeningen van Waternet leggen om te zien of er nog meer knelpunten zijn en ik zal dan een afspraak met je maken om te zien wat de consequenties zijn.
Met vriendelijke groet,
5.1,2,e

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Verzonden: dinsdag 3 november 2020 10:40
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e @amsterdam.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
CC: 5.1,2,e <5.1,2,e @waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

5.1,2,e

Waternet zal het opgegeven werk op de kruising Koninginnenweg – Emmastraat op een later moment uitvoeren.
De nieuwe werkgrens is geen probleem voor Waternet.

Met vriendelijke groet,


5.1,2,e
5.1,2,e
Afdeling Leidingwerken
5.1,2,e
5.1,2,e@waternet.nl

waternet
waterschap amstel gooi en vecht
gemeente amsterdam

Van: 5.1,2,e <5.1,2,e@amsterdam.nl>
Verzonden: vrijdag 30 oktober 2020 15:26
Aan: 5.1,2,e <5.1,2,e@waternet.nl>; 5.1,2,e <5.1,2,e@waternet.nl>
Onderwerp: RE: Openstaande vragen Koninginneweg 20187109

5.1,2,e
in eerste instantie lag de scope voor het vervangen van het spoor voorbij de kruising Koninginneweg/Emmalaan/ Willemsparkweg maar GVB heeft enkele jaren geleden dit stuk spoor al vervangen. Onze scope is dan ook wat verderop in de Koninginneweg komen te liggen voor het kruispunt met de Emmalaan en Willemsparkweg.
Dit betekend dat het door jullie opgegeven werk niet meer in de scope zit. Moeten jullie de leidingen op dat stuk perse vervangen of kan dat ook nog uitgesteld worden. Als het wel vervangen moet worden zou het denk ik het meest praktische zijn dat we hem wel in de scope van het project gaan stoppen maar dan zullen er nadere afspraken gemaakt moeten worden over de kosten en doorlooptijd.
Overig voorgestelde vervangingen passen wel binnen de scope en we verwachten binnen enkele wekken de wenstrace procedure op te starten en ook met jullie te willen overleggen over eventuele voor het project benodigde omleggingen van de rioleringen.
Alvast goed weekend.

Onderstaand screenshot van de locaties waar Waternet Leidingwerken groot werk heeft.

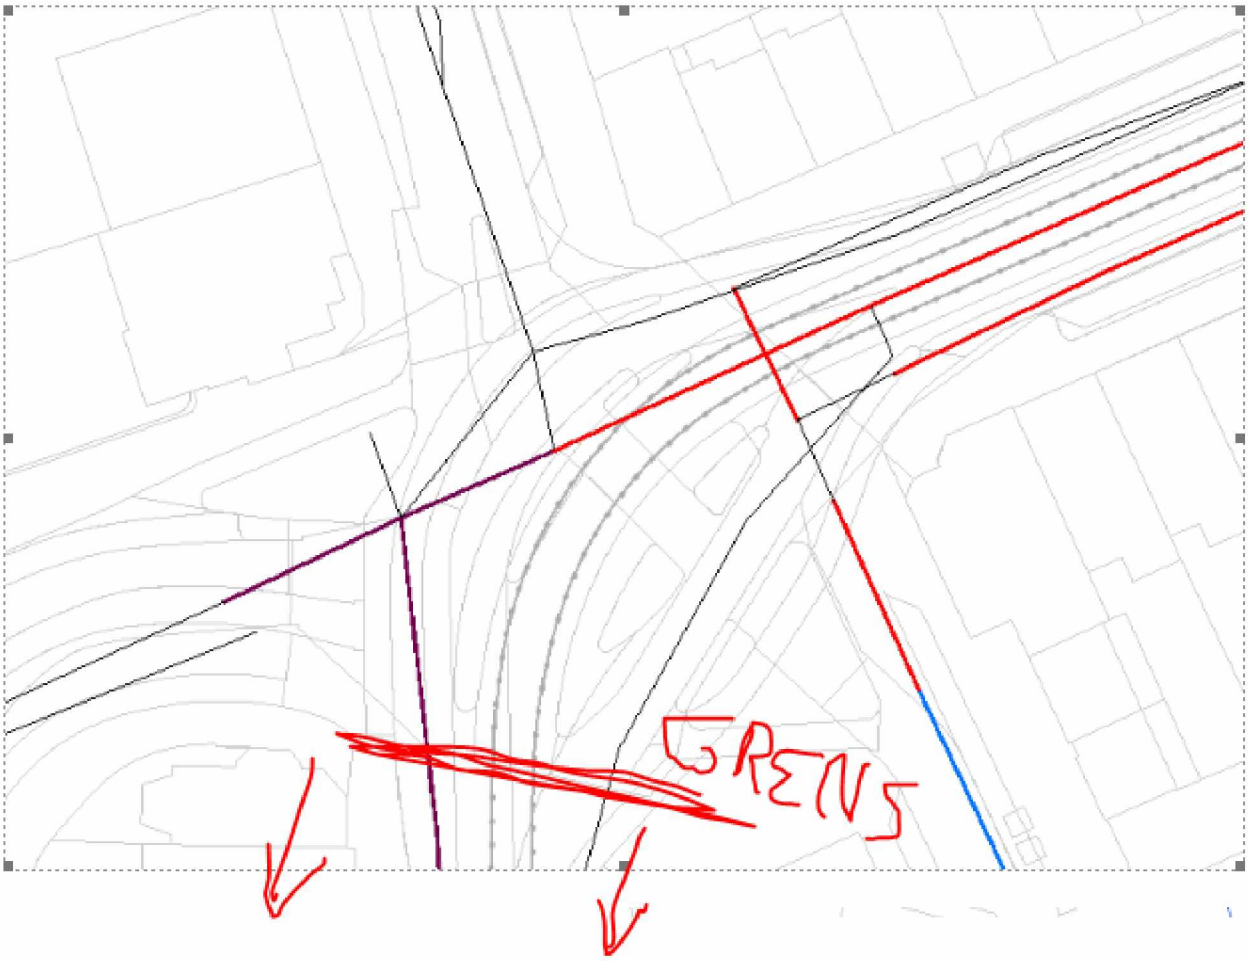

Met vriendelijke groet,

5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e
5.1,2,e @amsterdam.nl

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf

Dubbel. Zie document: 1 / Pagina 4 t/m 10 / Naam document: RE Openstaande vragen Koninginneweg 20187109.pdf
