Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam
Projectnummer opdrachtgever:	AI2018-1026
Project:	Monitoring Brouwersgracht, Leliegracht en Kloveniersburgwal
Projectnummer:	INFR180323
Betreft:	Rapportage nulmeting Brouwersgracht
Referentie:	180323-RAP-004

Auteur(s):		Paraaf:
Gecontroleerd:		Paraaf:
Goedgekeurd:		Paraaf:
Geautoriseerd:		Paraaf:

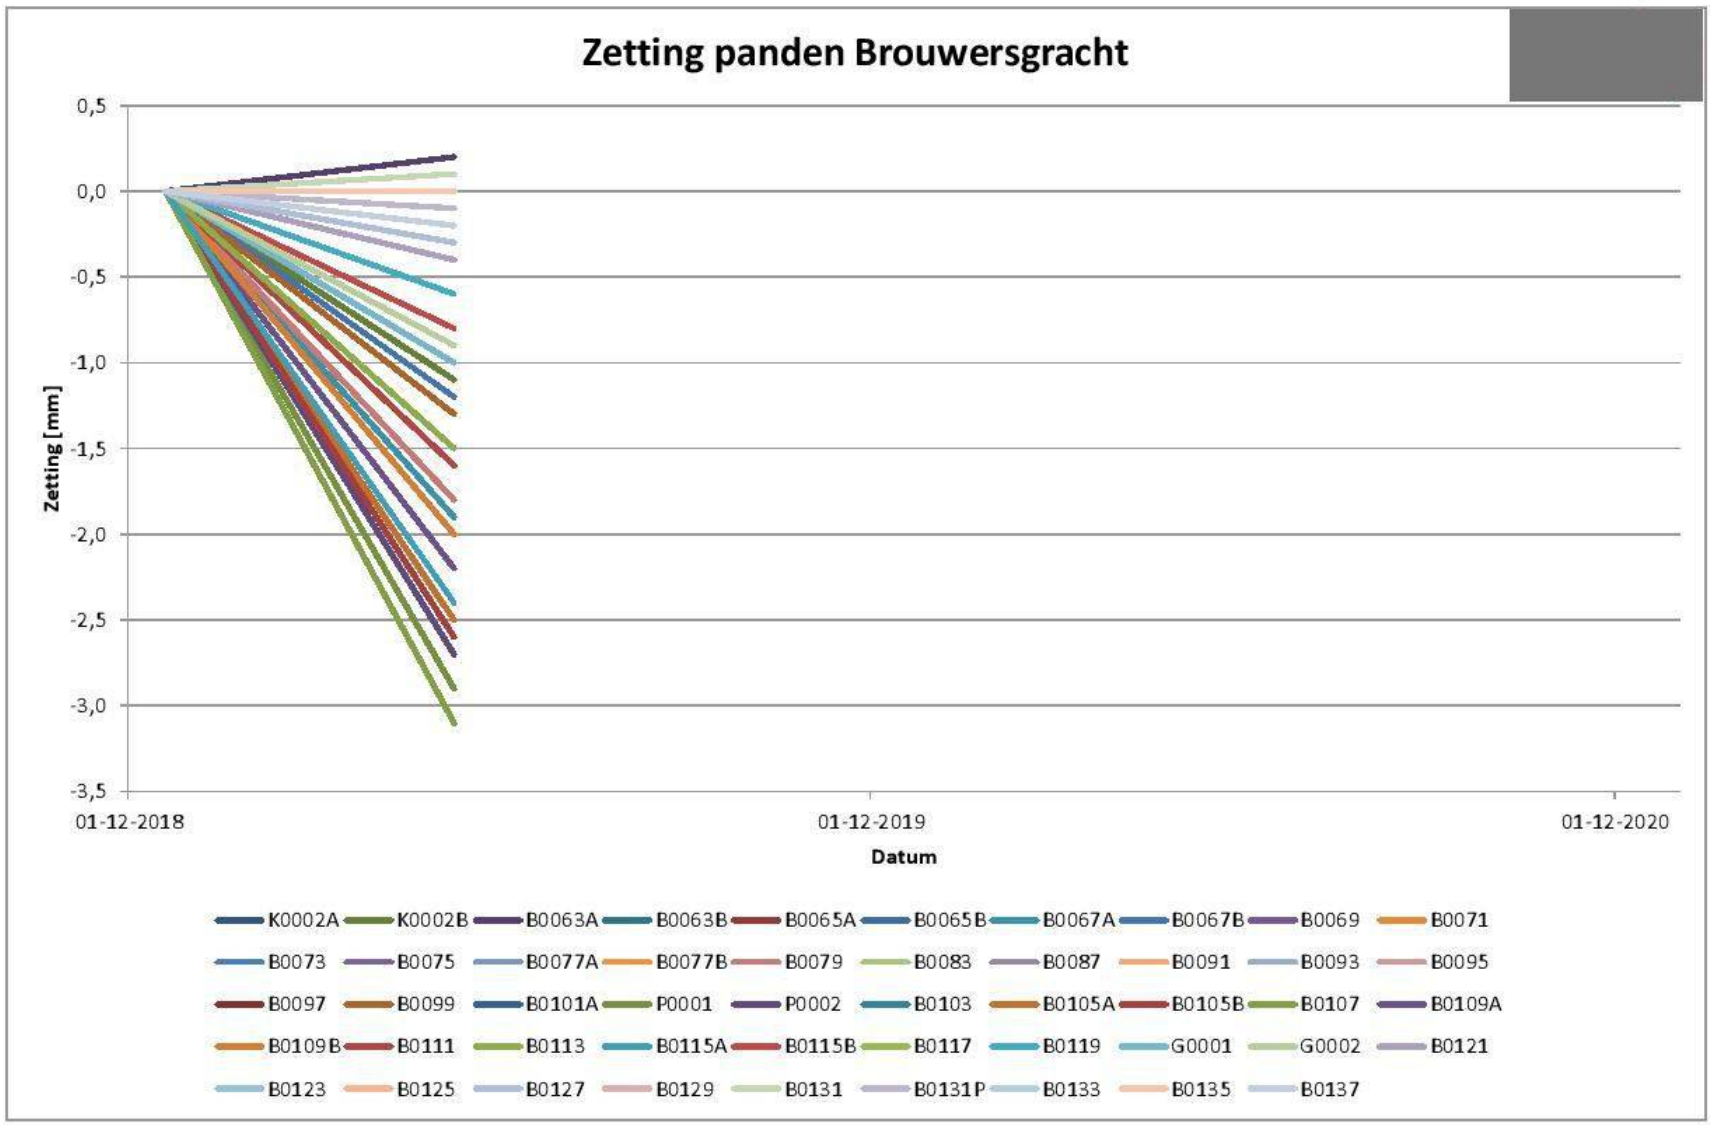
Datum:	21-8-2019
Revisie:	0
Status:	D
Aantal bladen:	7

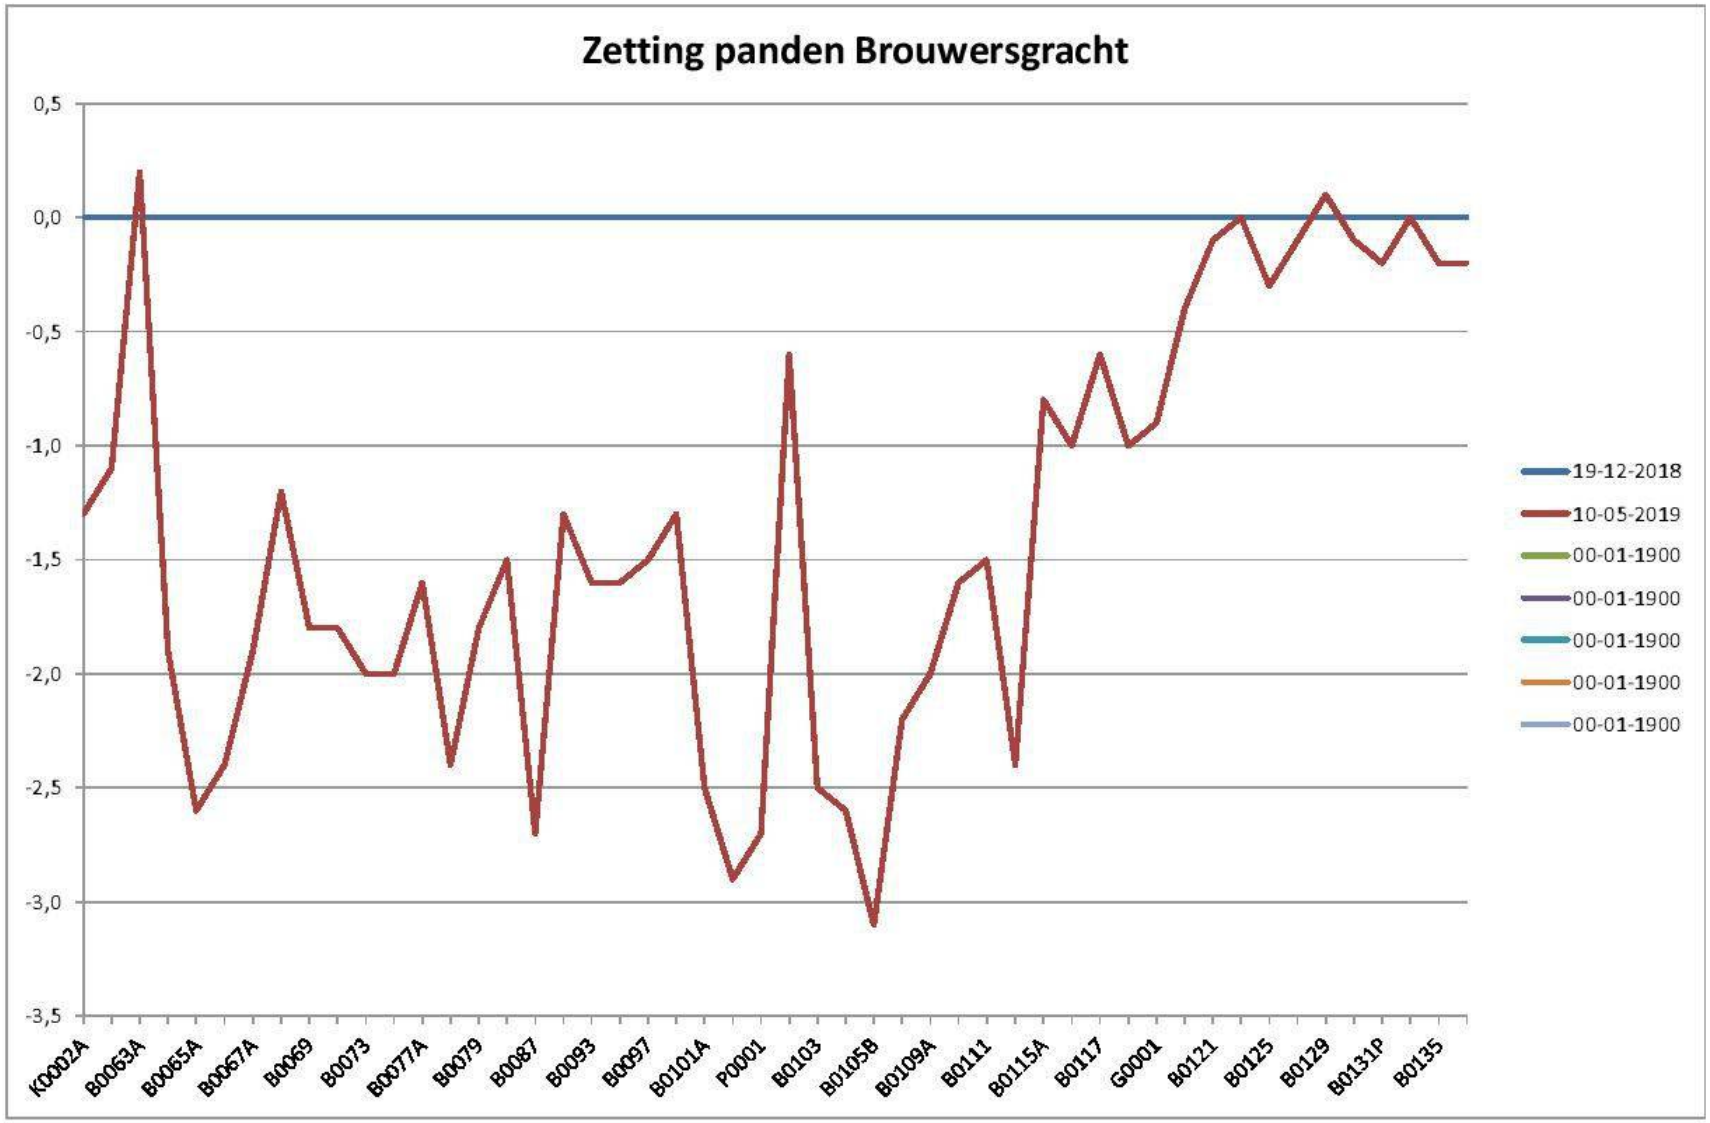
Iv-Infra

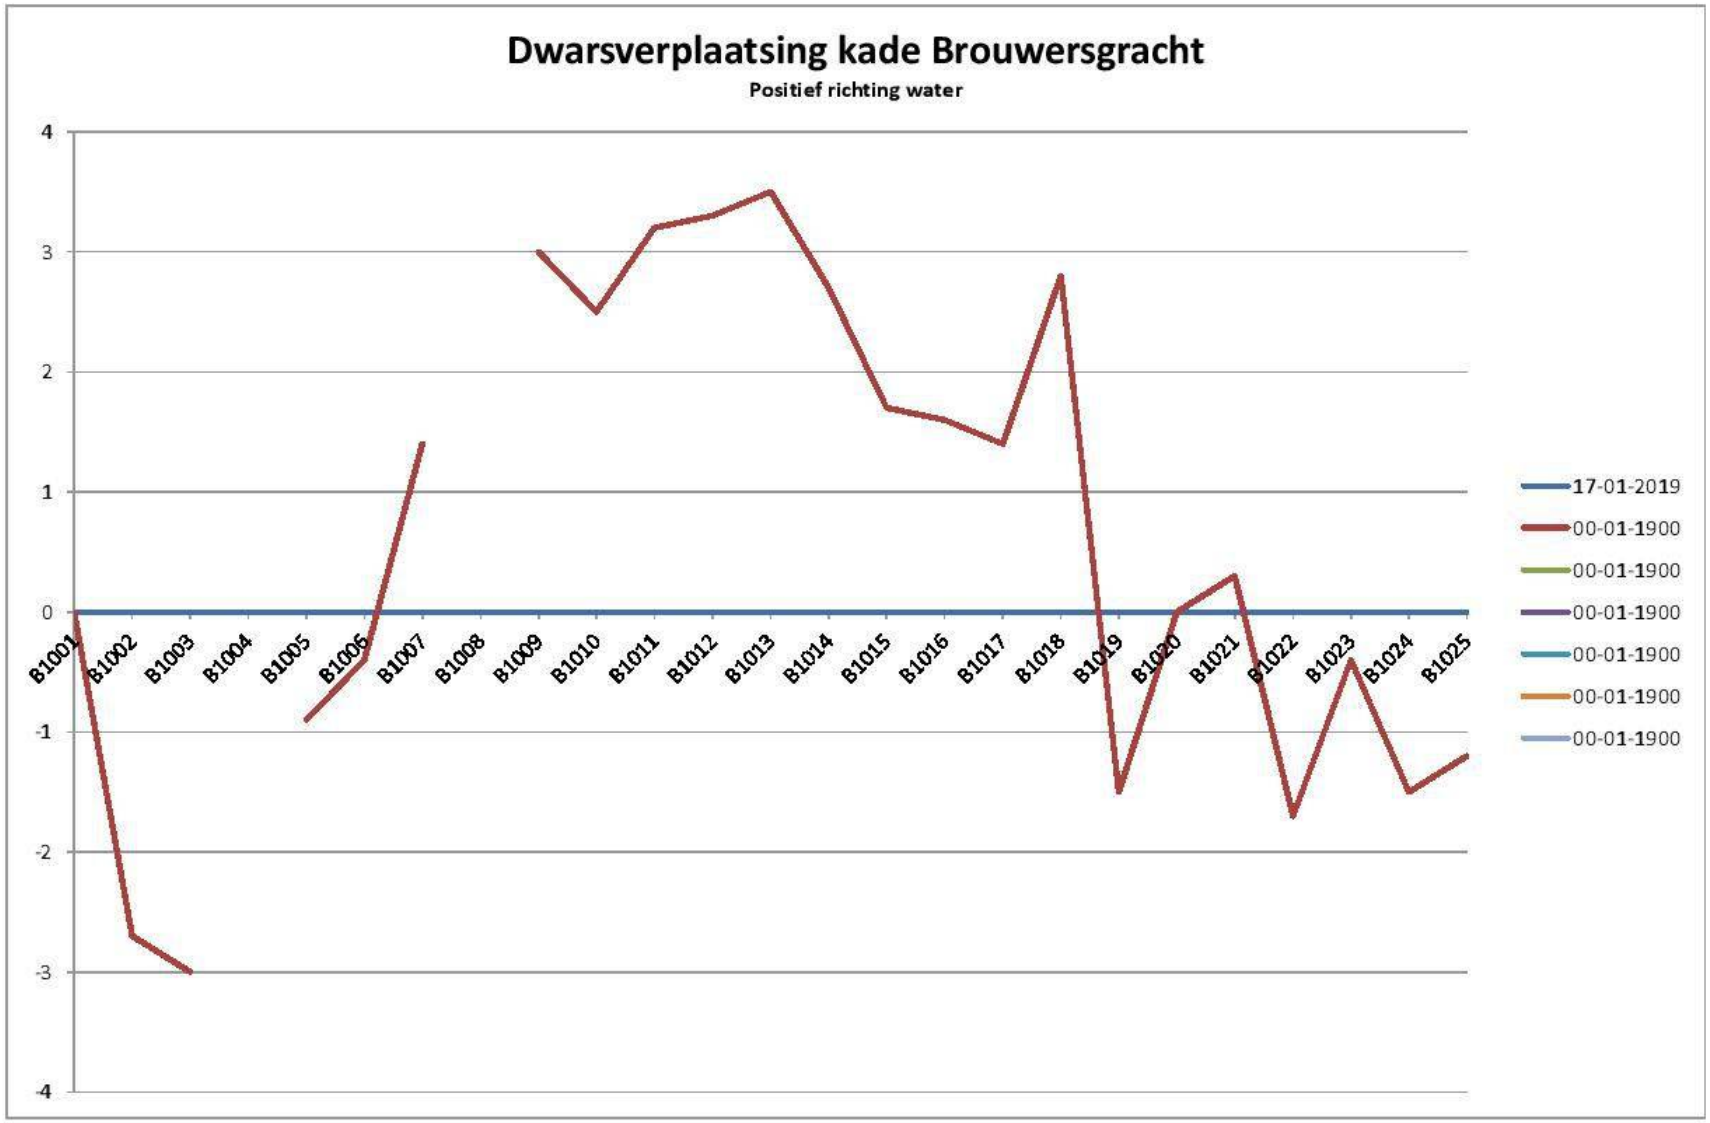
Punt		Omschrijving	Soort meetbout tpv pand	Nulmeting 19-12-2018	Herhalingsmeting 1 10-5-2019	
				NAP-hoogte [m]	Zetting t.o.v. vorige meting [mm]	Zetting t.o.v. meest recente nul-meting [mm]
K0002A	Z	Keizersgracht 2A	Meetbout	2,0511	-1,3	-1,3
K0002B	Z	Keizersgracht 2A	Meetbout	2,5461	-1,1	-1,1
B0063A	Z	Brouwersgracht 63	Sticker	3,4694	0,2	0,2
B0063B	Z	Brouwersgracht 63	Sticker	3,4016	-1,9	-1,9
B0065A	Z	Brouwersgracht 65	Meetbout	1,8986	-2,6	-2,6
B0065B	Z	Brouwersgracht 65	Meetbout	1,5496	-2,4	-2,4
B0067A	Z	Brouwersgracht 67	Sticker	3,4400	-1,9	-1,9
B0067B	Z	Brouwersgracht 67	Sticker	3,4665	-1,2	-1,2
B0069	Z	Brouwersgracht 69	Sticker	3,1148	-1,8	-1,8
B0071	Z	Brouwersgracht 71	Meetbout	1,5054	-1,8	-1,8
B0073	Z	Brouwersgracht 73	Meetbout	2,0355	-2,0	-2,0
B0075	Z	Brouwersgracht 75	Meetbout	1,4763	-2,0	-2,0
B0077A	Z	Brouwersgracht 77	Meetbout	1,5943	-1,6	-1,6
B0077B	Z	Brouwersgracht 77	Meetbout	2,0821	-2,4	-2,4
B0079	Z	Brouwersgracht 79	Meetbout	1,3810	-1,8	-1,8
B0083	Z	Brouwersgracht 83	Sticker	3,4119	-1,5	-1,5
B0087	Z	Brouwersgracht 87/89	Sticker	3,5349	-2,7	-2,7
B0091	Z	Brouwersgracht 91	Sticker	3,6313	-1,3	-1,3
B0093	Z	Brouwersgracht 93	Meetbout	1,4298	-1,6	-1,6
B0095	Z	Brouwersgracht 95	Meetbout	1,4087	-1,6	-1,6
B0097	Z	Brouwersgracht 97	Meetbout	1,5696	-1,5	-1,5
B0099	Z	Brouwersgracht 99	Meetbout	1,4575	-1,3	-1,3
B0101A	Z	Brouwersgracht 101	Meetbout	2,9445	-2,5	-2,5
B0101B	Z	Brouwersgracht 101	Meetbout	2,2416	-2,9	-2,9
P0001	Z	Prinsengracht 1	Meetbout	2,9601	-2,7	-2,7
P0002	Z	Prinsengracht 2	Sticker	4,0108	-0,6	-0,6
B0103	Z	Brouwersgracht 103	Meetbout	1,8178	-2,5	-2,5
B0105A	Z	Brouwersgracht 105	Meetbout	1,7856	-2,6	-2,6
B0105B	Z	Brouwersgracht 105	Meetbout	1,8510	-3,1	-3,1
B0107	Z	Brouwersgracht 107	Meetbout	1,2094	-2,2	-2,2
B0109A	Z	Brouwersgracht 109	Meetbout	1,7780	-2,0	-2,0
B0109B	Z	Brouwersgracht 109	Meetbout	1,4123	-1,6	-1,6
B0111	Z	Brouwersgracht 111	Meetbout	1,7133	-1,5	-1,5
B0113	Z	Brouwersgracht 113	Sticker	3,0586	-2,4	-2,4
B0115A	Z	Brouwersgracht 115	Meetbout	1,1152	-0,8	-0,8
B0115B	Z	Brouwersgracht 115	Meetbout	1,0189	-1,0	-1,0
B0117	Z	Brouwersgracht 117	Meetbout	0,7531	-0,6	-0,6
B0119	Z	Brouwersgracht 119	Meetbout	0,8223	-1,0	-1,0
G0001	Z	Goudsbloemstraat 1	Meetbout	0,9742	-0,9	-0,9
G0002	Z	Goudsbloemstraat 2	Meetbout	0,8505	-0,4	-0,4
B0121	Z	Brouwersgracht 121	Meetbout	0,9020	-0,1	-0,1
B0123	Z	Brouwersgracht 123	Meetbout	0,8367	0,0	0,0
B0125	Z	Brouwersgracht 125	Sticker	2,9603	-0,3	-0,3
B0127	Z	Brouwersgracht 127	Meetbout	0,8605	-0,1	-0,1
B0129	Z	Brouwersgracht 129	Meetbout	0,9224	0,1	0,1
B0131	Z	Brouwersgracht 131	Meetbout	1,1505	-0,1	-0,1
B0131P	Z	Brouwersgracht 131 trap	Sticker	2,3379	-0,2	-0,2
B0133	Z	Brouwersgracht 133	(Nog) geen toestemming			
B0135	Z	Brouwersgracht 135	Meetbout	1,1282	-0,2	-0,2
B0137	Z	Brouwersgracht 137	Sticker	3,2027	-0,2	-0,2

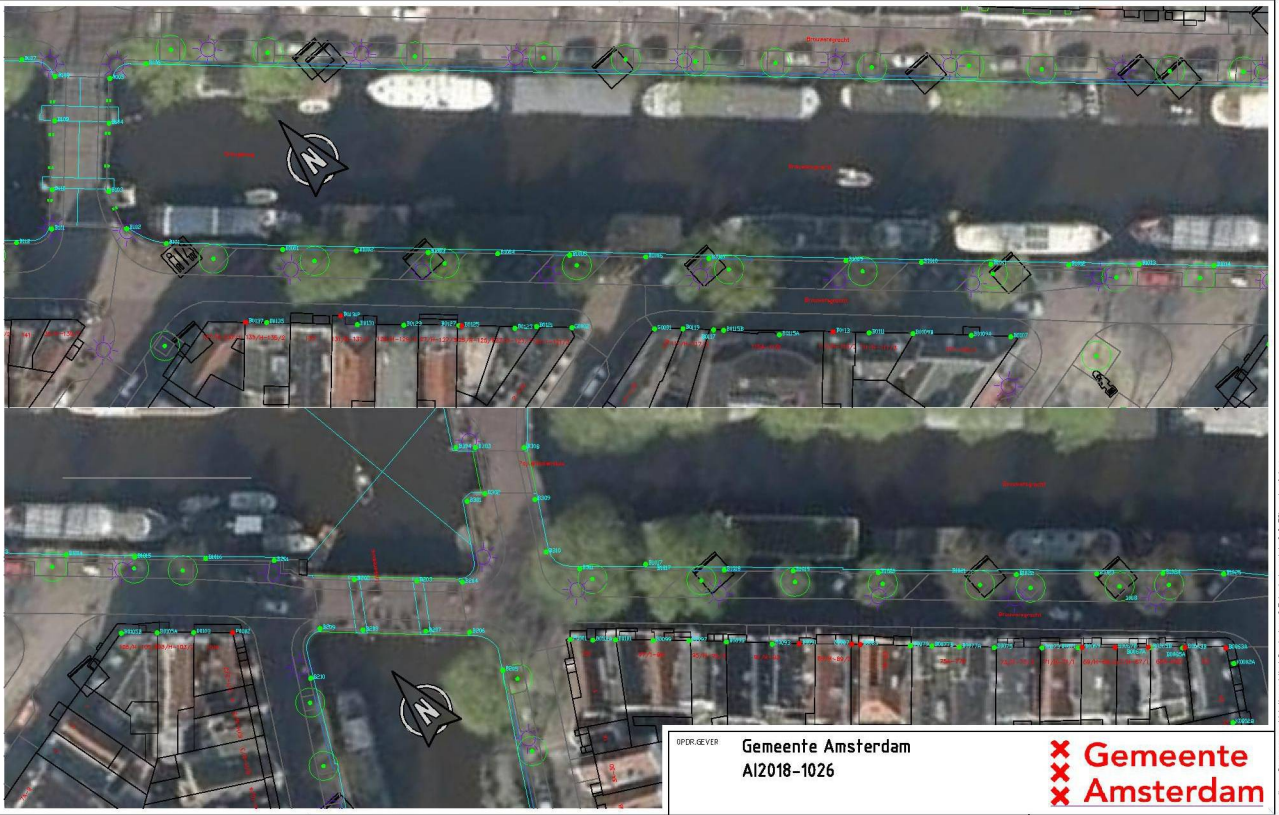
Iv-Infra

Punt		Datum		Opmerkingen	Nulmeting 17-1-2019			Herhalingsmeting 1 0-1-1900		
		0-meting			X	Y	Z	ΔX	ΔY	ΔZ
B101	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	984,1939	5000,5587	1,5314	-2,1	-0,7	-0,7
B102	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	978,8097	5002,4645	1,9013	-2,2	-0,2	-1,3
B103	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,2812	5007,4716	2,1906	-0,6	0,6	-0,7
B104	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,1490	5016,6945	2,1895	-1,3	-1,8	-1,2
B105	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,1748	5022,7822	1,8968	-0,7	-0,1	-0,9
B106	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	981,0678	5024,8179	1,4390	-2,1	0,1	-0,5
B107	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	964,2094	5025,1153	1,4454	0,3	-1,1	-1,1
B108	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,7552	5022,9134	1,8952	-0,7	-0,6	-0,9
B109	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,7684	5016,8864	2,1755	-2,8	-0,8	-1,0
B110	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,6020	5007,5687	2,1653	-1,5	-0,6	-0,8
B111	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,6516	5002,2517	1,8759	-1,6	-0,6	-1,1
B112	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	963,8916	5000,3004	1,3961	-0,2	-0,5	-1,0
B201	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1154,6050	4999,6440	2,0144	-1,0	4,2	-2,1
B202	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1165,5107	4997,2476	3,2639	-1,9	2,9	-1,6
B203	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1173,9702	4997,2108	3,3090	-0,5	2,8	-1,7
B204	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1180,1671	4997,1326	2,9060	0,1	3,2	-1,5
B205	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1185,8393	4985,2152	2,0021	-0,6	3,3	-1,1
B206	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1181,2718	4990,2929	2,8020	-0,2	2,1	-1,6
B207	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1175,3281	4990,3283	3,3084	-0,9	1,2	-2,0
B208	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1166,7980	4990,3406	3,2792	-2,4	1,3	-1,8
B209	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1160,9529	4990,4381	2,7499	-2,4	1,0	-1,4
B210	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1159,8068	4983,7020	2,0020	-1,7	2,1	-1,1
B301	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1180,5985	5008,0919	2,8219	-1,3	1,8	-0,6
B302	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1183,0074	5009,1887	3,0224	0,3	2,8	-0,7
B303	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1181,6141	5015,4011	3,0059	-0,4	2,1	-1,1
B304	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1178,9738	5015,3683	2,8330	0,1	2,1	-1,0
B305	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1176,8463	5024,4379	2,2605	-1,2	1,1	-1,3
B306	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1191,8516	5024,5474	1,7537	-2,7	0,9	-0,4
B307	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1188,2140	5023,2735	2,0358	-2,8	2,6	-0,6
B308	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1188,2277	5015,4735	2,9201	-1,5	2,0	-1,0
B309	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1189,7949	5008,5071	2,9179	-0,8	0,9	-0,9
B310	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1191,4569	5001,4317	2,1978	-2,2	-0,1	-1,0
B311	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1196,0549	4999,2061	1,7825	-2,3	-1,0	-0,5
B1001	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 146	Meetbout			0,6650	0,0	0,0	-0,1
B1002	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1010,0000	5000,0000	0,3298	-3,2	-2,7	-0,4
B1003	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1019,7300	4999,9328	0,3275	-3,5	-3,0	-0,4
B1004	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1029,1821	4999,9392	0,3441			
B1005	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1038,9530	4999,8861	0,3300	-3,2	-0,9	-1,2
B1006	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1049,2674	4999,8386	0,3346	-5,2	-0,4	-2,6
B1007	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1057,8339	4999,7883	0,3502	-2,8	1,4	0,2
B1008	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout						
B1009	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1076,4313	4999,7928	0,3682	-2,8	3,0	1,5
B1010	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1086,6595	4999,7373	0,4318	-2,8	2,5	1,2
B1011	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1096,1098	4999,6728	0,5743	-2,3	3,2	1,3
B1012	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1106,6750	4999,7062	0,7491	-1,8	3,3	0,5
B1013	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1116,2096	4999,9933	0,9378	-2,5	3,5	-0,3
B1014	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1126,3650	4999,9627	1,1739	-3,2	2,7	-0,4
B1015	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1135,6602	4999,7919	1,3246	-3,0	1,7	-1,1
B1016	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 59	Meetbout	1145,2906	4999,7542	1,5471	-0,3	1,6	0,1
B1017	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 57	Meetbout	1206,1528	4999,3161	1,1977	0,1	1,4	-0,9
B1018	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1215,6387	4999,4109	0,8512	-0,6	2,8	0,3
B1019	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1225,0185	4999,4487	0,8248	-0,1	-1,5	0,2
B1020	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1236,5652	4999,3836	0,8347	-0,3	0,0	0,5
B1021	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1246,1816	4999,6107	0,7300	0,0	0,3	-2,4
B1022	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1255,2926	4999,4374	0,8148	-1,6	-1,7	-0,4
B1023	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1266,1953	4999,7103	0,8045	-0,7	-0,4	-1,0
B1024	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1275,1802	4999,9687	0,8985	-4,9	-1,5	-0,8
B1025	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 55	Meetbout	1283,4058	5000,0000	1,4768	-4,3	-1,2	-1,0


Zetting panden Brouwersgracht
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
Zetting [mm]
01-12-2018
01-12-2019
01-12-2020
Datum
K0002A K0002B B0063A B0063B B0065A B0065B B0067A B0067B B0069 B0071
B0073 B0075 B0077A B0077B B0079 B0083 B0087 B0091 B0093 B0095
B0097 B0099 B0101A P0001 P0002 B0103 B0105A B0105B B0107 B0109A
B0109B B0111 B0113 B0115A B0115B B0117 B0119 G0001 G0002 B0121
B0123 B0125 B0127 B0129 B0131 B0131P B0133 B0135 B0137


Zetting panden Brouwersgracht
0,5
0,0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0
-3,5
K0002A
B0063A
B0065A
B0067A
B0069
B0073
B0077A
B0079
B0087
B0093
B0097
B0101A
P0001
B0103
B0105B
B0109A
B0111
B0115A
B0117
G0001
B0121
B0125
B0129
B0131P
B0135
19-12-2018
10-05-2019
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900


Dwarsverplaatsing kade Brouwersgracht
Positief richting water
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
B1001
B1002
B1003
B1004
B1005
B1006
B1007
B1008
B1009
B1010
B1011
B1012
B1013
B1014
B1015
B1016
B1017
B1018
B1019
B1020
B1021
B1022
B1023
B1024
B1025
17-01-2019
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900
00-01-1900



OPDR.GEVER: Gemeente Amsterdam
AI2018-1026

Gemeente Amsterdam

PROJECT: Monitoring Brouwersgracht, Leliegracht en Kloveniersburgwal

ONDERDEEL: Locatie meetpunten Brouwersgracht

OMSCHR./ VERSIE: R0

DATUM: 19-03-2018

GETEKEND:

STATUS: D

GECONTROLEERD:

GEZIEN:

SCHAAL: NVT

FORMAAT: A3

DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN N
ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR MAG DEZE OP GENERLEI WIJZE WORDEN GEKOPIEERD OF OPENBAAR GEMAAKT.

PROJECTNR: INFR180323

TEKENINGNR: 180323-TEK-001

BLADNR: 1

N:\INFR\180323 Amsterdam, aanleren Brouwersgracht Leliegracht\04 Producten\03 Tekening\Acad\180323-TEK-001-R0.dwg
