Opdrachtgever:	Gemeente Amsterdam
Projectnummer opdrachtgever:	AI2018-1026
Project:	Monitoring Brouwersgracht, Leliegracht en Kloveniersburgwal
Projectnummer:	INFR180323
Betreft:	Rapportage nulmeting Brouwersgracht
Referentie:	180323-RAP-001

Auteur(s):		Paraaf:
Gecontroleerd:		Paraaf:
Goedgekeurd:		Paraaf:
Geautoriseerd:		Paraaf:

Datum:	13-3-2019
Revisie:	0
Status:	D
Aantal bladen:	4

Punt		Omschrijving	Soort meetbout tpv pand	Nulmeting 19-12-2018	Herhalingsmeting 1 0-1-1900	
				NAP-hoogte [m]	Zetting t.o.v. vorige meting [mm]	Zetting t.o.v. meest recente nul-meting [mm]
K0002A	Z	Keizersgracht 2A	Meetbout	2,0511	-2051,1	-2051,1
K0002B	Z	Keizersgracht 2A	Meetbout	2,5461	-2546,1	-2546,1
B0063A	Z	Brouwersgracht 63	Sticker	3,4694	-3469,4	-3469,4
B0063B	Z	Brouwersgracht 63	Sticker	3,4016	-3401,6	-3401,6
B0065A	Z	Brouwersgracht 65	Meetbout	1,8986	-1898,6	-1898,6
B0065B	Z	Brouwersgracht 65	Meetbout	1,5496	-1549,6	-1549,6
B0067A	Z	Brouwersgracht 67	Sticker	3,4400	-3440,0	-3440,0
B0067B	Z	Brouwersgracht 67	Sticker	3,4665	-3466,5	-3466,5
B0069	Z	Brouwersgracht 69	Sticker	3,1148	-3114,8	-3114,8
B0071	Z	Brouwersgracht 71	Meetbout	1,5054	-1505,4	-1505,4
B0073	Z	Brouwersgracht 73	Meetbout	2,0355	-2035,5	-2035,5
B0075	Z	Brouwersgracht 75	Meetbout	1,4763	-1476,3	-1476,3
B0077A	Z	Brouwersgracht 77	Meetbout	1,5943	-1594,3	-1594,3
B0077B	Z	Brouwersgracht 77	Meetbout	2,0821	-2082,1	-2082,1
B0079	Z	Brouwersgracht 79	Meetbout	1,3810	-1381,0	-1381,0
B0083	Z	Brouwersgracht 83	Sticker	3,4119	-3411,9	-3411,9
B0087	Z	Brouwersgracht 87/89	Sticker	3,5349	-3534,9	-3534,9
B0091	Z	Brouwersgracht 91	Sticker	3,6313	-3631,3	-3631,3
B0093	Z	Brouwersgracht 93	Meetbout	1,4298	-1429,8	-1429,8
B0095	Z	Brouwersgracht 95	Meetbout	1,4087	-1408,7	-1408,7
B0097	Z	Brouwersgracht 97	Meetbout	1,5696	-1569,6	-1569,6
B0099	Z	Brouwersgracht 99	Meetbout	1,4575	-1457,5	-1457,5
B0101	Z	Brouwersgracht 101	Meetbout	2,9445	-2944,5	-2944,5
P0001	Z	Prinsengracht 1	Meetbout	2,9601	-2960,1	-2960,1
P0002	Z	Prinsengracht 2	Sticker	4,0108	-4010,8	-4010,8
B0103	Z	Brouwersgracht 103	Meetbout	1,8178	-1817,8	-1817,8
B0105A	Z	Brouwersgracht 105	Meetbout	1,7856	-1785,6	-1785,6
B0105B	Z	Brouwersgracht 105	Meetbout	1,8510	-1851,0	-1851,0
B0107	Z	Brouwersgracht 107	Meetbout	1,2094	-1209,4	-1209,4
B0109A	Z	Brouwersgracht 109	Meetbout	1,7780	-1778,0	-1778,0
B0109B	Z	Brouwersgracht 109	Meetbout	1,4123	-1412,3	-1412,3
B0111	Z	Brouwersgracht 111	Meetbout	1,7133	-1713,3	-1713,3
B0113	Z	Brouwersgracht 113	Sticker	3,0586	-3058,6	-3058,6
B0115A	Z	Brouwersgracht 115	Meetbout	1,1152	-1115,2	-1115,2
B0115B	Z	Brouwersgracht 115	Meetbout	1,0189	-1018,9	-1018,9
B0117	Z	Brouwersgracht 117	Meetbout	0,7531	-753,1	-753,1
B0119	Z	Brouwersgracht 119	Meetbout	0,8223	-822,3	-822,3
G0001	Z	Goudsbloemstraat 1	Meetbout	0,9742	-974,2	-974,2
G0002	Z	Goudsbloemstraat 2	Meetbout	0,8505	-850,5	-850,5
B0121	Z	Brouwersgracht 121	Meetbout	0,9020	-902,0	-902,0
B0123	Z	Brouwersgracht 123	Meetbout	0,8367	-836,7	-836,7
B0125	Z	Brouwersgracht 125	Sticker	2,9603	-2960,3	-2960,3
B0127	Z	Brouwersgracht 127	Meetbout	0,8605	-860,5	-860,5
B0129	Z	Brouwersgracht 129	Meetbout	0,9224	-922,4	-922,4
B0131	Z	Brouwersgracht 131	Meetbout	1,1505	-1150,5	-1150,5
B0131P	Z	Brouwersgracht 131 trap	Sticker	2,3379	-2337,9	-2337,9
B0133	Z	Brouwersgracht 133	(Nog) geen toestemming			
B0135	Z	Brouwersgracht 135	Meetbout	1,1282	-1128,2	-1128,2
B0137	Z	Brouwersgracht 137	Sticker	3,2027	-3202,7	-3202,7

Punt		Datum		Opmerkingen	Nulmeting 17-1-2019		
		0-meting			X	Y	Z
B101	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	984,1939	5000,5587	1,5314
B102	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	978,8097	5002,4645	1,9013
B103	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,2812	5007,4716	2,1906
B104	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,1490	5016,6945	2,1895
B105	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	976,1748	5022,7822	1,8968
B106	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	981,0678	5024,8179	1,4390
B107	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	964,2094	5025,1153	1,4454
B108	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,7552	5022,9134	1,8952
B109	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,7684	5016,8864	2,1755
B110	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,6020	5007,5687	2,1653
B111	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	968,6516	5002,2517	1,8759
B112	XYZ	17-1-2019	Brug 146	Meetbout	963,8916	5000,3004	1,3961
B201	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1154,6050	4999,6440	2,0144
B202	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1165,5107	4997,2476	3,2639
B203	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1173,9702	4997,2108	3,3090
B204	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1180,1671	4997,1326	2,9060
B205	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1185,8393	4985,2152	2,0021
B206	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1181,2718	4990,2929	2,8020
B207	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1175,3281	4990,3283	3,3084
B208	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1166,7980	4990,3406	3,2792
B209	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1160,9529	4990,4381	2,7499
B210	XYZ	17-1-2019	Brug 59	Meetbout	1159,8068	4983,7020	2,0020
B301	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1180,5985	5008,0919	2,8219
B302	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1183,0074	5009,1887	3,0224
B303	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1181,6141	5015,4011	3,0059
B304	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1178,9738	5015,3683	2,8330
B305	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1176,8463	5024,4379	2,2605
B306	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1191,8516	5024,5474	1,7537
B307	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1188,2140	5023,2735	2,0358
B308	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1188,2277	5015,4735	2,9201
B309	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1189,7949	5008,5071	2,9179
B310	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1191,4569	5001,4317	2,1978
B311	XYZ	17-1-2019	Brug 57	Meetbout	1196,0549	4999,2061	1,7825
B1001	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 146	Meetbout			0,6650
B1002	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1010,0000	5000,0000	0,3298
B1003	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1019,7300	4999,9328	0,3275
B1004	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1029,1821	4999,9392	0,3441
B1005	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1038,9530	4999,8861	0,3300
B1006	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1049,2674	4999,8386	0,3346
B1007	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1057,8339	4999,7883	0,3502
B1008	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout			
B1009	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1076,4313	4999,7928	0,3682
B1010	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1086,6595	4999,7373	0,4318
B1011	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1096,1098	4999,6728	0,5743
B1012	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1106,6750	4999,7062	0,7491
B1013	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1116,2096	4999,9933	0,9378
B1014	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1126,3650	4999,9627	1,1739
B1015	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1135,6602	4999,7919	1,3246
B1016	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 59	Meetbout	1145,2906	4999,7542	1,5471
B1017	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 57	Meetbout			1,1977
B1018	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1215,6387	4999,4109	0,8512
B1019	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1225,0185	4999,4487	0,8248
B1020	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1236,5652	4999,3836	0,8347
B1021	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1246,1816	4999,6107	0,7300
B1022	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1255,2926	4999,4374	0,8148
B1023	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1266,1953	4999,7103	0,8045
B1024	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade	Meetbout	1275,1802	4999,9687	0,8985
B1025	XYZ	17-1-2019	Zuidelijke kade, zijde brug 55	Meetbout	1283,4058	5000,0000	1,4768

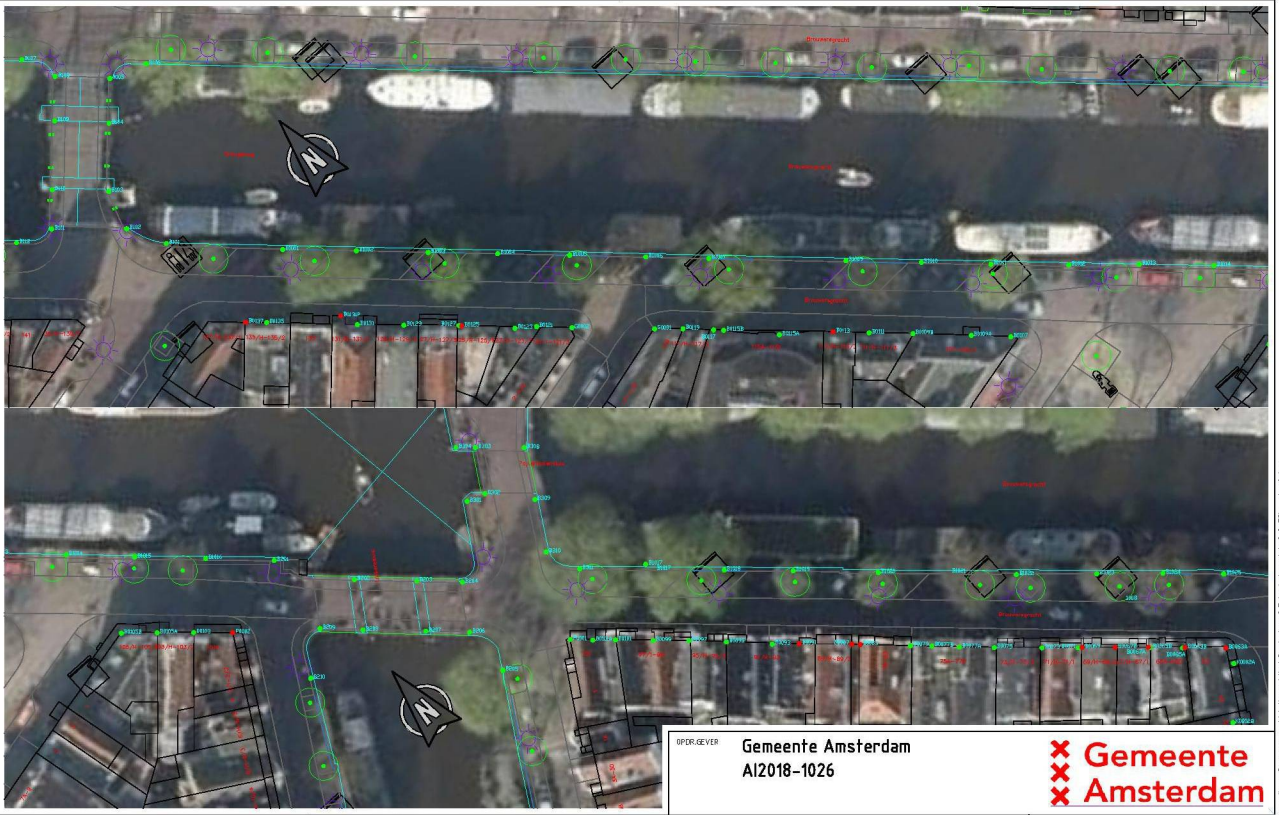

OPDR.GEVER: Gemeente Amsterdam
AI2018-1026

Gemeente Amsterdam

PROJECT: Monitoring Brouwersgracht, Leliegracht en Kloveniersburgwal

ONDERDEEL: Locatie meetpunten Brouwersgracht

OMSCHR./ VERSIE: R0			
DATUM: 19-03-2018		GECONTROLEERD:	
GETEKEND:		GEZIEN:	
STATUS: D		SCHAAL: NVT	
DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN [redacted] ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGENAAR MAG DEZE OP GENERLEI WIJZE WORDEN GEKOPIEERD OF OPENBAAR GEMAAKT.		FORMAAT: A3	

PROJECTNR: INFR180323

TEKENINGNR: 180323-TEK-001

BLADNR: 1

N:\INFR\180323 Amsterdam, manteren Brouwersgracht Leliegracht\04 Producten\03 Tekening\Acad\180323-TEK-001-R03.dwg
