Id	Taakmodus	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
0		**Maassluisstraat proces kaderafspraken**	**2460 dagen**	**maa 7-4-25**	**vri 24-11-34**
1		**projectteam LDK en adviseurs**	**1858 dagen**	**woe 10-12-2**	**maa 14-3-33**
2		**Ontwikkelfase blok 1**	**707 dagen**	**woe 10-12-2**	**don 12-10-28**
3		**architectenselectie**	**83 dagen**	**woe 10-12-2**	**vri 17-4-26**
14		**bepaling warmteconcept**	**25 dagen**	**maa 2-2-26**	**vri 6-3-26**
17		**selectie overige adviseurs op basis van SO**	1 mnd	maa 20-4-26	vri 15-5-26
18		voorontwerp	4 mndn	maa 1-6-26	vri 9-10-26
19		definitief ontwerp	5 mndn	vri 8-1-27	don 27-5-27
20		**Voorbereiding omgevingsvergunning**	**407 dagen**	**woe 10-12-2**	**don 19-8-27**
21		stukken adviseurs	3 mndn	vri 28-5-27	don 19-8-27
22		**rapporten adviseurs**	**357 dagen**	**woe 10-12-2**	**don 10-6-27**
39		**bouwvoorbereiding**	**300 dagen**	**vri 20-8-27**	**don 12-10-28**
42		**Ontwikkelfase blok 2**	36 mndn	maa 15-5-28	maa 17-2-31
43		**Ontwikkelfase blok 4**	36 mndn	maa 10-6-30	maa 14-3-33
44		**Uitvoering**	**1560 dagen**	**maa 7-8-28**	**vri 28-7-34**
45		sloop fase 1	6 mndn	maa 7-8-28	vri 19-1-29
46		bouw fase 1	18 mndn	maa 22-1-29	vri 7-6-30
47		sloop fase 2	6 mndn	maa 2-9-30	vri 14-2-31
48		bouw fase 2	18 mndn	maa 17-2-31	vri 2-7-32
49		sloop fase 3	6 mndn	maa 17-2-31	vri 1-8-31
50		bouw fase 3	18 mndn	maa 4-8-31	vri 17-12-32
51		sloop fase 4	6 mndn	maa 27-9-32	vri 11-3-33
52		bouw fase 4	18 mndn	maa 14-3-33	vri 28-7-34
53		oplevering laatste fase	0 dagen	vri 28-7-34	vri 28-7-34
54					
55		**Besluitvormingsproces Lieven De Key**	**2355 dagen**	**maa 29-9-25**	**vri 24-11-34**
79					
80		**Participatieproces Amsterdamse Kaderafspraken**	**1005 dagen**	**maa 20-4-26**	**vri 29-3-30**
81		**Ontwikkelfase**	**165 dagen**	**maa 20-4-26**	**vri 8-1-27**
82		**Bijeenkomsten BC**	**165 dagen**	**maa 20-4-26**	**vri 8-1-27**
83		1 meedenken over het ontwerpplan SO	1 dag	maa 20-4-26	maa 20-4-26
84		**2 vaststellen sociaal plan**	**55 dagen**	**maa 12-10-2**	**vri 8-1-27**
85		bewonersraadpleging over het sociaal pl	15 dagen	maa 12-10-2	vri 30-10-26
86		advies BC over het sociaal plan	6 wkn	maa 2-11-26	vri 11-12-26
87		schriftelijke reactie op advies BC	2 wkn	maa 14-12-2	vri 8-1-27
88		**Peildatum**	**840 dagen**	**maa 11-1-27**	**vri 29-3-30**
89		aanvragen peildatum fase 1	6 wkn	maa 11-1-27	vri 19-2-27
90		gemeente geeft een peildatum af	18 mndn	maa 22-2-27	vri 7-7-28
91		aanvragen peildatum fase 2	6 wkn	maa 9-8-27	vri 17-9-27
92		gemeente geeft een peildatum af	18 mndn	maa 20-9-27	vri 2-2-29
93		aanvragen peildatum fase 3	6 wkn	maa 6-3-28	vri 14-4-28
94		gemeente geeft een peildatum af	18 mndn	maa 17-4-28	vri 31-8-29
95		aanvragen peildatum fase 4	6 wkn	maa 2-10-28	vri 10-11-28

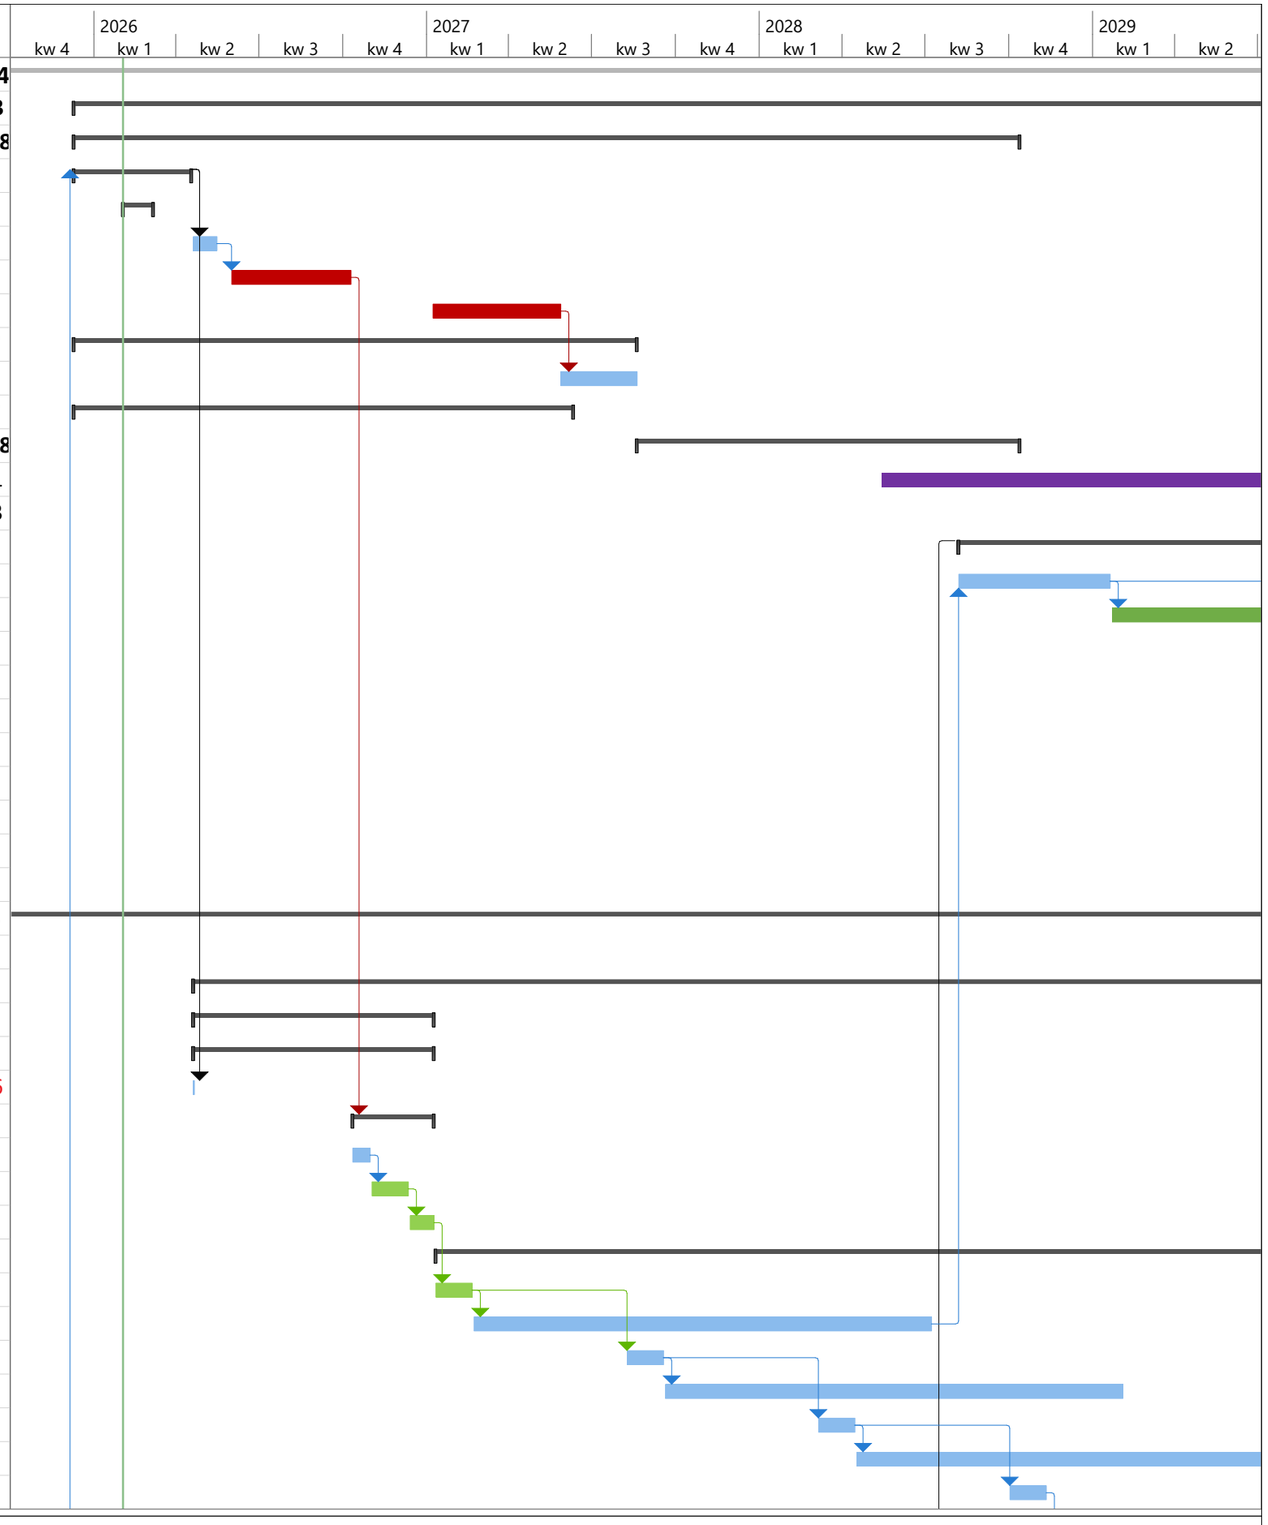

Project: Maassluisstraat proces
Datum: maa 2-2-26

Taak	Projectsamenvatting	Handmatig taak	Alleen begindatum	Deadline			
Splitsing	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum	Voortgang			
Mijlpaal	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang, handmatig			
Samenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Externe mijlpaal				

Id		Taakmodus	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
96			gemeente geeft een peildatum af	18 mndn	maa 13-11-25	vri 29-3-30
97			**uitvoeringsfase**	**120 dagen**	**maa 7-8-28**	**vri 19-1-29**
100						
101			**Transformatie (ACE)**	**248 dagen**	**din 2-12-25**	**don 17-12-26**
117						
118			**Plaberum**	**285 dagen**	**maa 7-4-25**	**vri 19-6-26**
119			**Investeringsnota Stedenboouwkundig ontwerp**	**197 dagen**	**maa 7-4-25**	**woe 18-2-26**
120	✓		concept investeringsnota en besluit	6 mndn	maa 7-4-25	vri 17-10-25
121	✓		ter inzage	6 wkn	don 9-10-25	woe 19-11-25
122	✓		concept definitief maken	6 wkn	don 20-11-25	woe 14-1-26
123	✓		bestuurlijk vaststellen gemeenteraad	1 mnd	don 15-1-26	woe 11-2-26
124			akkoord	0 dagen	woe 18-2-26	woe 18-2-26
125			**Afsprakenbrief over 4 fasen**	6 mndn	maa 5-1-26	vri 19-6-26
126						
127			**Vergunningstrajecten**	**547 dagen**	**woe 18-2-26**	**don 27-4-28**
150						
151			**selectie bouwer**	**43 dagen**	**maa 20-4-26**	**woe 17-6-26**
160						
161			**marktprogramma Fase 3**	**620 dagen**	**maa 19-3-29**	**vri 1-8-31**
170						
171			**opzegging contracten garageboxen**	**1343 dagen**	**don 20-11-25**	**maa 3-3-31**
177						
178			**Tuinontwerp fase 1**	**90 dagen**	**maa 18-5-26**	**vri 9-10-26**

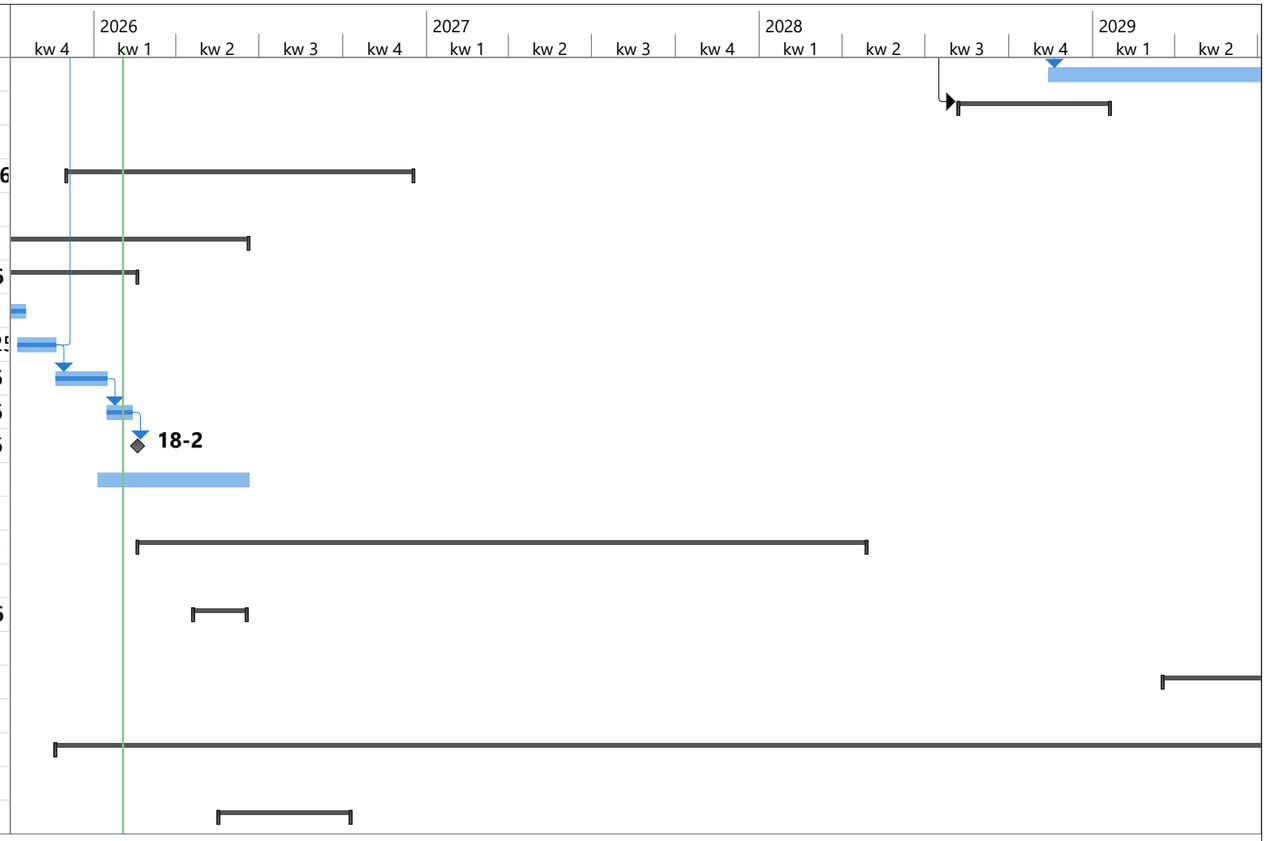

Project: Maassluisstraat proces
Datum: maa 2-2-26

Taak	Projectsamenvatting	Handmatig taak	Alleen begindatum	Deadline			
Splitsing	Inactieve taken	Alleen duur	Alleen einddatum	Voortgang			
Mijlpaal	Inactieve mijlpaal	Handmatige samenvatting	Externe taken	Voortgang, handmatig			
Samenvatting	Inactieve samenvatting	Handmatige samenvatting	Externe mijlpaal				
