Gemeente Amsterdam

Review integraal referentieontwerp en kostenraming Oostbrug

Aan	5.1, 2, e Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam
Van	5.1, 2, e @amsterdam.nl; 5.1, 2, e
	5.1, 2, e @amsterdam.nl
Kopie aan	IPM team Oostbrug
Datum	maandag 24 november 2025

Gemeente Amsterdam bereid de bestuurlijke besluitvorming voor over de Oostbrug, een (eerste) vaste oeververbinding tussen Noord en de Centrale stad. Dit project maakt onderdeel uit van de Amsterdamse "Regeling Grote Projecten" en heeft daarom bijzonder aandacht voor kwaliteitsborging en tegenspraak. In dat kader hebben we Ingenieursbureau Gemeente Rotterdam, bij monde van ingenieur 5.1, 2, e gevraagd een review uit te voeren op het integrale referentieontwerp en de daarbij behorende kostenraming van de Oostbrug. Deze producten vormen onder meer de onderbouwing van de bestuurlijke besluitvorming.

<u>Wie voeren de review uit:</u>
De review wordt uitgevoerd door 5.1, 2, e (adviseur IGR) en 5.1, 2, e (kostendeskundige). Daar waar nadere kennis of deskundigheid nodig is kunnen zij leunen op ondersteuning vanuit het Ingenieursbureau Rotterdam.


<u>Procesvoorstel:</u>
1. IGR stelt voor één integrale review te doen op basis van de stukken die de besluitvorming in gaan (dus niet op een tussenversie);
2. IGR wil de raming toetsen in samenhang met de inhoud;
3. OG wil een opdeling tussen review op de inhoud en review op de raming, zodat de review van IGR op de inhoud nog verwerkt kan worden door HK voordat zij gaan ramen;
4. IGR zal hun review expliciet en traceerbaar doen, t.w.: bevindingen in de betreffende documenten en daarvan vervolgens een reviewverslag maken;
5. IGR wil op de "90% versie" van een product reviewen (NB: een 90% versie is een product dat leesbaar is, gereed is, waarin de belangrijkste keuzes zijn gemaakt en dat is voorzien van een zogenaamde uitgangspunten nota);
6. IGR wil vooraf de 90% versie ontvangen, daarop hun concept review uitvoeren, dit fysiek gezamenlijk met OG en Haskoning [HK} bespreken en daarna de definitieve review opstellen;
7. IGR wil 2 weken doorlooptijd voor het uitvoeren van de concept review op het referentieontwerp en 2 weken doorlooptijd voor het uitvoeren van de concept review op de kostenraming;
8. IGR wil vroegtijdig inzicht hebben wanneer zij de documenten ter review ontvangen;
9. OG doet een procesvoorstel op inhoud/tijd; [actie TB] zie onder;
10. De bestaande lopende opdracht tussen IGR-OG van 2025 wordt afgesloten/afgerond [actie MS];

11. IGR zal o.b.v. van [9] een nieuwe offerte 2026 opstellen voor het uitvoeren deze review [actie JR];
12. OG levert voor TM/inhoud: de integrale referentie-ontwerpnota. Dit document bevat een complete onderbouwing van het referentieontwerp op SO niveau (incl. de eerdere fase 1 + 2). In de fase 1 is IGR/JR ook al gekend. [actie TB];
13. OG na intern overeenstemming de planning laten aanpassen en delen met HK [actie TB];
14. OG reserveren tijd overleg met HK voor doorspreken review/warme overdracht [actie TB].


Onderstaand o.b.v. onze huidige planning(en) een voorstel hoe deze review met IGR meer gedetailleerd in de tijd vorm gegeven kan worden.
Hierbij is meer marge genomen voor 'afronden integraal referentie ontwerp met data grondonderzoek'. Van 30/1/25 gereed naar ca. 20/2/26 (week 8-2026)

<u>Citaat Basisplanning Oostbrug, OSF 3-2025, d.d. 11 november 2025:</u>

Referentieontwerp op SO-niveau, Schetsontwerp			
Referentie ontwerp op SO-niveau fase 2 exclusief raming opstellen	16	3-2-2025 A	30-10-2025
Referentieontwerp naar Integraal referentieontwerp, concept	11	2-10-2025 A	19-12-2025
SSK-raming, review, verwerken	4	17-11-2025*	12-12-2025
Afronden integraal referentie ontwerp met data grondonderzoek	6	22-12-2025	30-1-2026
Externe review	8	2-2-2026	27-3-2026
KES incl terugkoppelingt aan stakeholders	39	21-7-2025 A	27-3-2026
Afronden integraal referentie ontwerp op KES	4	30-3-2026	24-4-2026
Integrale kostenraming, (2 wk) interne en externe review (2+2 wk) + verwerken 2 wk	8	30-3-2026	22-5-2026
Verwerken in ontwerp en in boekje Definitienota (1 ipv 2 wk)	1	25-5-2026	29-5-2026
Marktconsultatie en inkoopstrategie	12	30-3-2026	19-6-2026

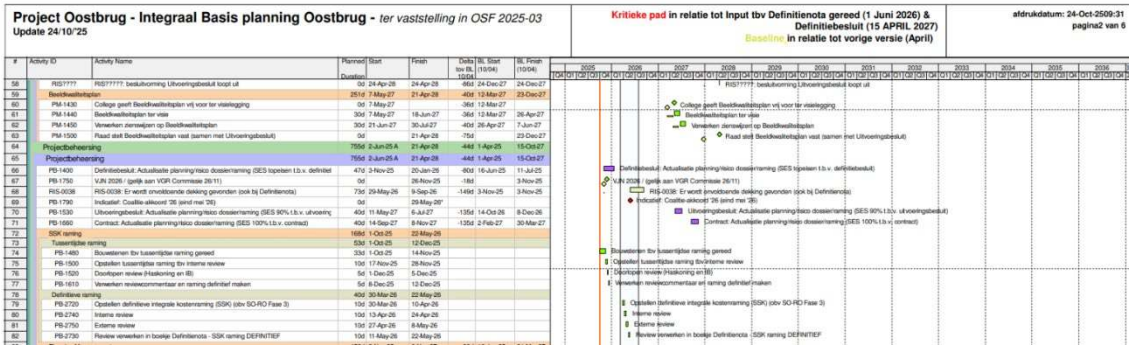

9- OG doet een procesvoorstel op inhoud/tijd; [TB]: zie onder

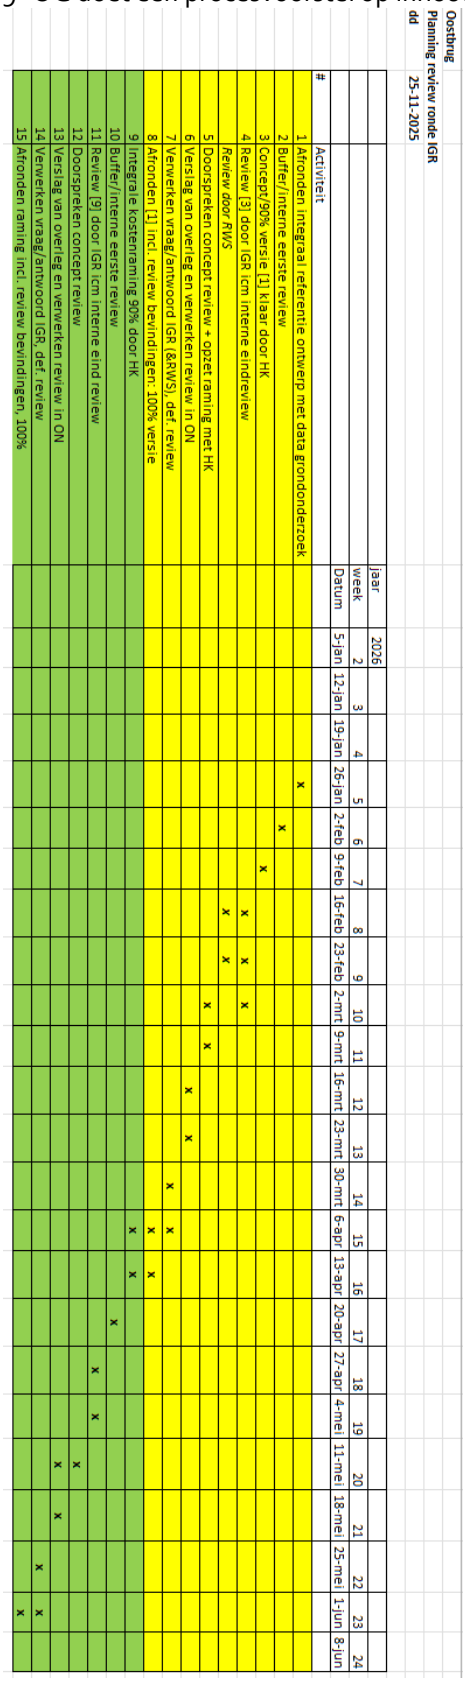

Oostbrug																										
Planning review ronde IGR																										
dd	25-11-2025																									
				jaar	2026																					
#	Activiteit			week	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				Datum	5-jan	12-jan	19-jan	26-jan	2-feb	9-feb	16-feb	23-feb	2-mrt	9-mrt	16-mrt	23-mrt	30-mrt	6-apr	13-apr	20-apr	27-apr	4-mei	11-mei	18-mei	25-mei	1-jun	8-jun
1	Afronden integraal referentie ontwerp met data grondonderzoek						x																			
2	Buffer/interne eerste review								x																	
3	Concept/90% versie [1] klaar door HK									x																
4	Review [3] door IGR icm interne eindreview										x	x	x													
	Review door RWS										x	x	x													
5	Doorspreken concept review + opzet raming met HK											x	x	x												
6	Verslag van overleg en verwerken review in ON													x	x											
7	Verwerken vraag/antwoord IGR (&RWS), def. review															x	x									
8	Afronden [1] incl. review bevindingen, 100% versie																	x	x							
9	Integrale kostenraming 90% door HK																		x	x						
10	Buffer/interne eerste review																				x					
11	Review [9] door IGR icm interne eind review																					x				
12	Doorspreken concept review																						x			
13	Verslag van overleg en verwerken review in ON																						x			
14	Verwerken vraag/antwoord IGR, def. review																							x	x	
15	Afronden raming incl. review bevindingen, 100%																							x	x	x
