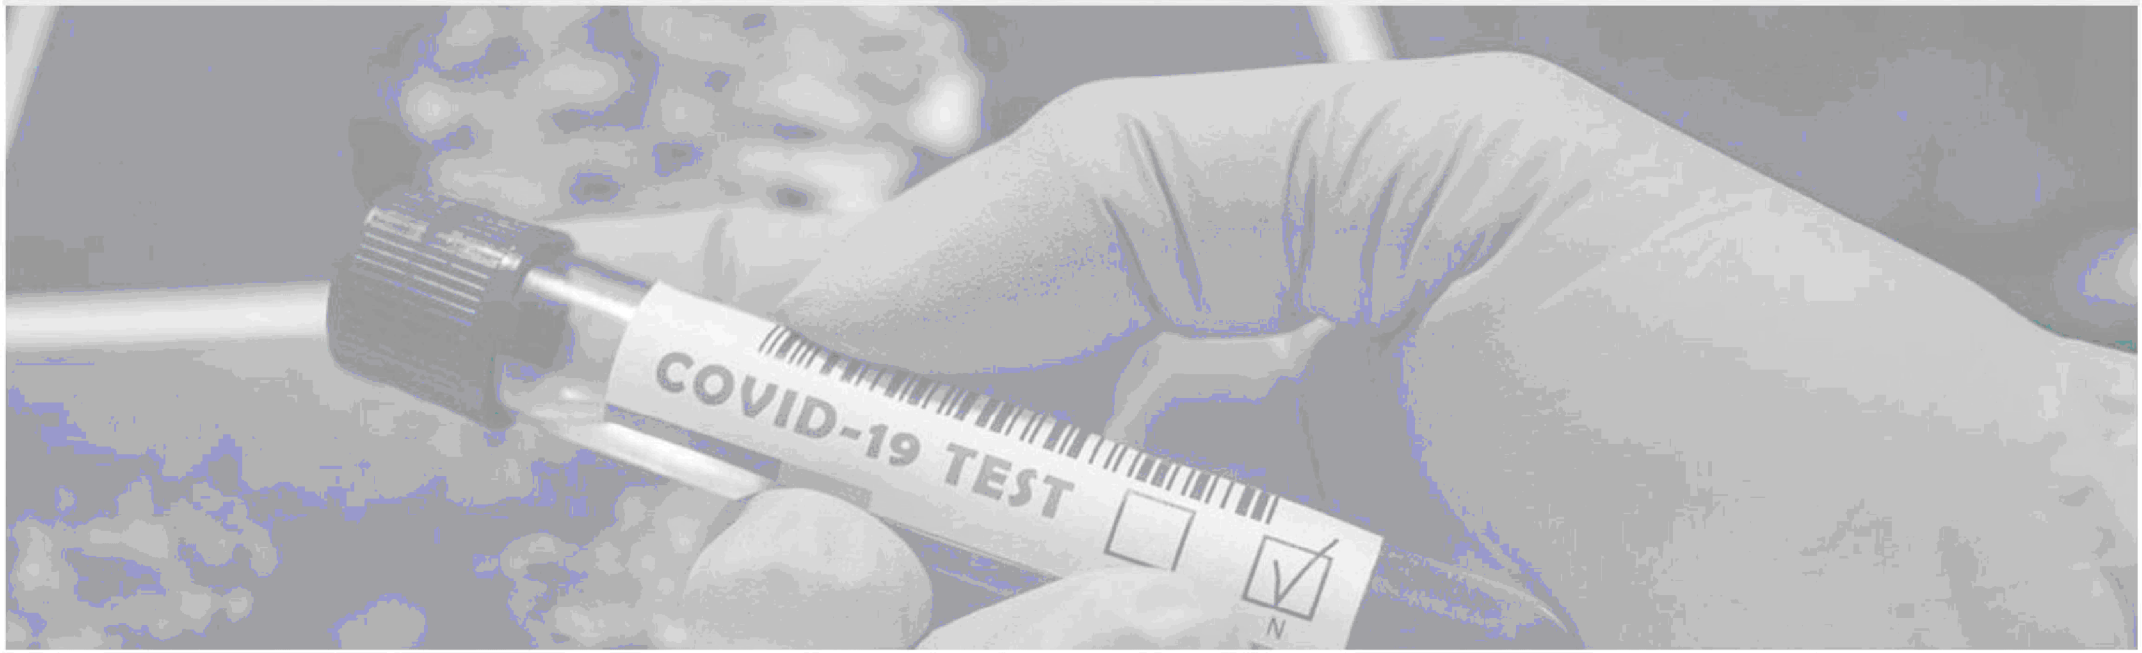


Opschalingsplan ademtest spoor 1

Bestemd voor Stuurgroep Sneltesten en LCT

Advies Stuurgroep Sneltesten/LCT | De Werkgroep Opschaling adviseert de 500 SpiroNoses uit te rollen binnen spoor 1

Advies	• De Werkgroep Opschaling adviseert de ademtest uit te rollen in spoor 1. • Advies om 500 SpiroNoses beschikbaar te stellen voor de eerste 6 weken (t/m 14 mei) voor 15 GGD locaties.

Criteria	Toelichting advies
❑ Er is behoefte aan deze specifieke test	• Er is behoefte in de markt naar deze specifieke test. • De te testen persoon heeft meteen de uitslag. Dit is uniek voor een COVID-test. • Het is een fijnere (minder invasieve) testmethode dan bijvoorbeeld de PCR-test, waarbij de afname diep met een wattenstaaf de keel en neus in moet.
❑ Het allocatieplan is helder	• Het allocatieplan is helder weergegeven. • De locatieverdeling door Nederland is realistisch.
❑ De planning van de uitrol is realistisch en haalbaar	• De planning van de uitrol is realistisch en haalbaar en goed inzichtelijk gemaakt per week. • Vanaf week 14 start de doorstart van de ademtest bij de GGD'en. Start is in Amsterdam en Venray. Daarna is de doorstart naar de andere geschikte GGD locaties in Nederland. • Op dit moment is er geen geïntegreerde detailplanning per week voor de sporen 1, 2a en 2b/c. Op het moment dat er een piek qua uitvraag van de SpiroNoses in alle sporen is, dan geeft Breathomix aan dat er eventuele weekverschuivingen mogelijk zijn. Dit wordt dan afgestemd tussen de sporen en Breathomix.
❑ De kosten van de uitrol zijn in kaart gebracht en haalbaar	• De locatie gerelateerde kosten zijn sterk afhankelijk van de locatie randvoorwaarden (Breathomix). Daar is de afgelopen dagen een hernieuwde interpretatie door Breathomix voor gegeven. Zodra deze nieuwste versie van randvoorwaarden beschikbaar is, zullen de te verwachten kosten berekend worden.
❑ De benodigde resources voor de uitrol zijn goed in kaart gebracht	• De GGD-GHOR heeft (hoog over) goed in kaart gebracht wat er nodig is voor een succesvolle uitrol van de ademtest in spoor 1. Dit betreft o.a. de training van de afnemers en de super-users, het gereedmaken van de GGD locaties en de servicedesk.
❑ De implementatiepartner kent de randvoorwaarden voor succesvolle uitrol en handelt hiernaar	• De GGD-GHOR is op de hoogte van de randvoorwaarden voor een succesvolle uitrol van de ademtest en doet een check bij alle GGD locaties of ze kunnen voldoen aan de randvoorwaarden.
