Project	WereldWonder Artis Aquarium_VOORLOPIG 1
Opdrachtgever	ARTIS
Planner	[redacted]
DATUM d.d.	03-12-2021

SALVERDA BOUW

BIJLAGE 01

ALGEMEEN TIJDSCHEMA

CONTRACT

Regel	Balk naam	Duur	Start	Eind	Voorgangers	Opvolgers
1	Keuze opdrachtgever van de geselecteerde aannemer	1d	16-7-2021	16-7-2021		2
2	Verificatiegesprek / plan van aanpak / ingediende offerte	15d	19-7-2021	31-8-2021	1	5
3	**Aquarium**	**640d**	**13-12-2021**	**30-10-2024**		
4	**Overeenkomst/voorbereiding project t.b.v. start uitvoering**	**202d**	**13-12-2021**	**14-11-2022**		
5	Contractvorming	1d	13-12-2021	13-12-2021	2	6
6	Projectstartup	1d	14-12-2021	14-12-2021	5	10; 9; 8; 14; 7
7	Risicosessies (opstarten en uitwerken)	40d	15-12-2021	2-3-2022	6	
8	Check voorwaarden omgevingsvergunning	15d	15-12-2021	26-1-2022	6	ns
9	Gegevensbehoefte Schema	15d	15-12-2021	26-1-2022	6	
10	Opstellen inhoudsopgave aan te leveren werkplannen	15d	15-12-2021	26-1-2022	6	11
11	Startoverleg M&A	1d	27-1-2022	27-1-2022	10	12
12	Afstemmen projectplan met M&A	15d	28-1-2022	17-2-2022	11	13
13	Akkoord projectplan	5d	18-2-2022	24-2-2022	12	18
14	Werkgroepen restauraties (samenstellen en plannen uitwerken), doorlopend	200d	15-12-2021	14-11-2022	6	15 SS; 17 SS
15	Werkgroepen constructief (samenstellen en plannen uitwerken), doorlopend	200d	15-12-2021	14-11-2022	14 SS	16 SS; ns SS 20,00d;
16	Opstellen werkplan (bemaling/demontage/sloopwerkzaamheden)	50d	15-12-2021	16-3-2022	15 SS	ns
17	Werkgroepen afbouw (samenstellen en plannen uitwerken), doorlopend	150d	15-12-2021	5-9-2022	14 SS	
18	Werkplannen uitwerken naar uitvoeringsstukken ter goedkeuring partijen, doorlopend	150d	25-2-2022	25-10-2022	13	
19	**Werkplan 'zout' en 'conditionering gebouw'**	**50d**	**15-12-2021**	**16-3-2022**		
20	**Bouwplaatsinrichting fase SLOOP**	**75d**	**27-1-2022**	**16-5-2022**		
21	**Voorbereiding en uitvoering strip- en constructieve sloop**	**107d**	**3-2-2022**	**11-7-2022**		
22	**start uitvoering tot oplevering**	**576,00d**	**1-4-2022**	**30-10-2024**		
	OPTIES (uiterlijke opdrachten)					
23	1: Gevels + bordes		1-6-2022	1-6-2022		
24	2: Rotonde: ramen in buitengevel openen		1-6-2022	1-6-2022		
25	3: Jaren 90: doorgangen		1-6-2022	1-6-2022		
26	4: Jaren 90: overig bouwkundig en installatietechnisch		1-6-2022	1-6-2022		
27	5: Rotonde: dak detaillering aanpassen t.b.v. mogelijk daglicht		1-6-2022	1-6-2022		
28	6: Rotonde: bouwkundig en installatietechnische invulling BGG		1-6-2022	1-6-2022		
29	7: Rotonde: bouwkundig en installatietechnische invulling 1e verd		1-6-2022	1-6-2022		
30	8: Bestaande diensttrappen aanpassen		1-6-2022	1-6-2022		
31	9: PV panelen op het dak aansluiten		1-12-2022	1-12-2022		
32	10: Inrichting zolders		1-12-2022	1-12-2022		

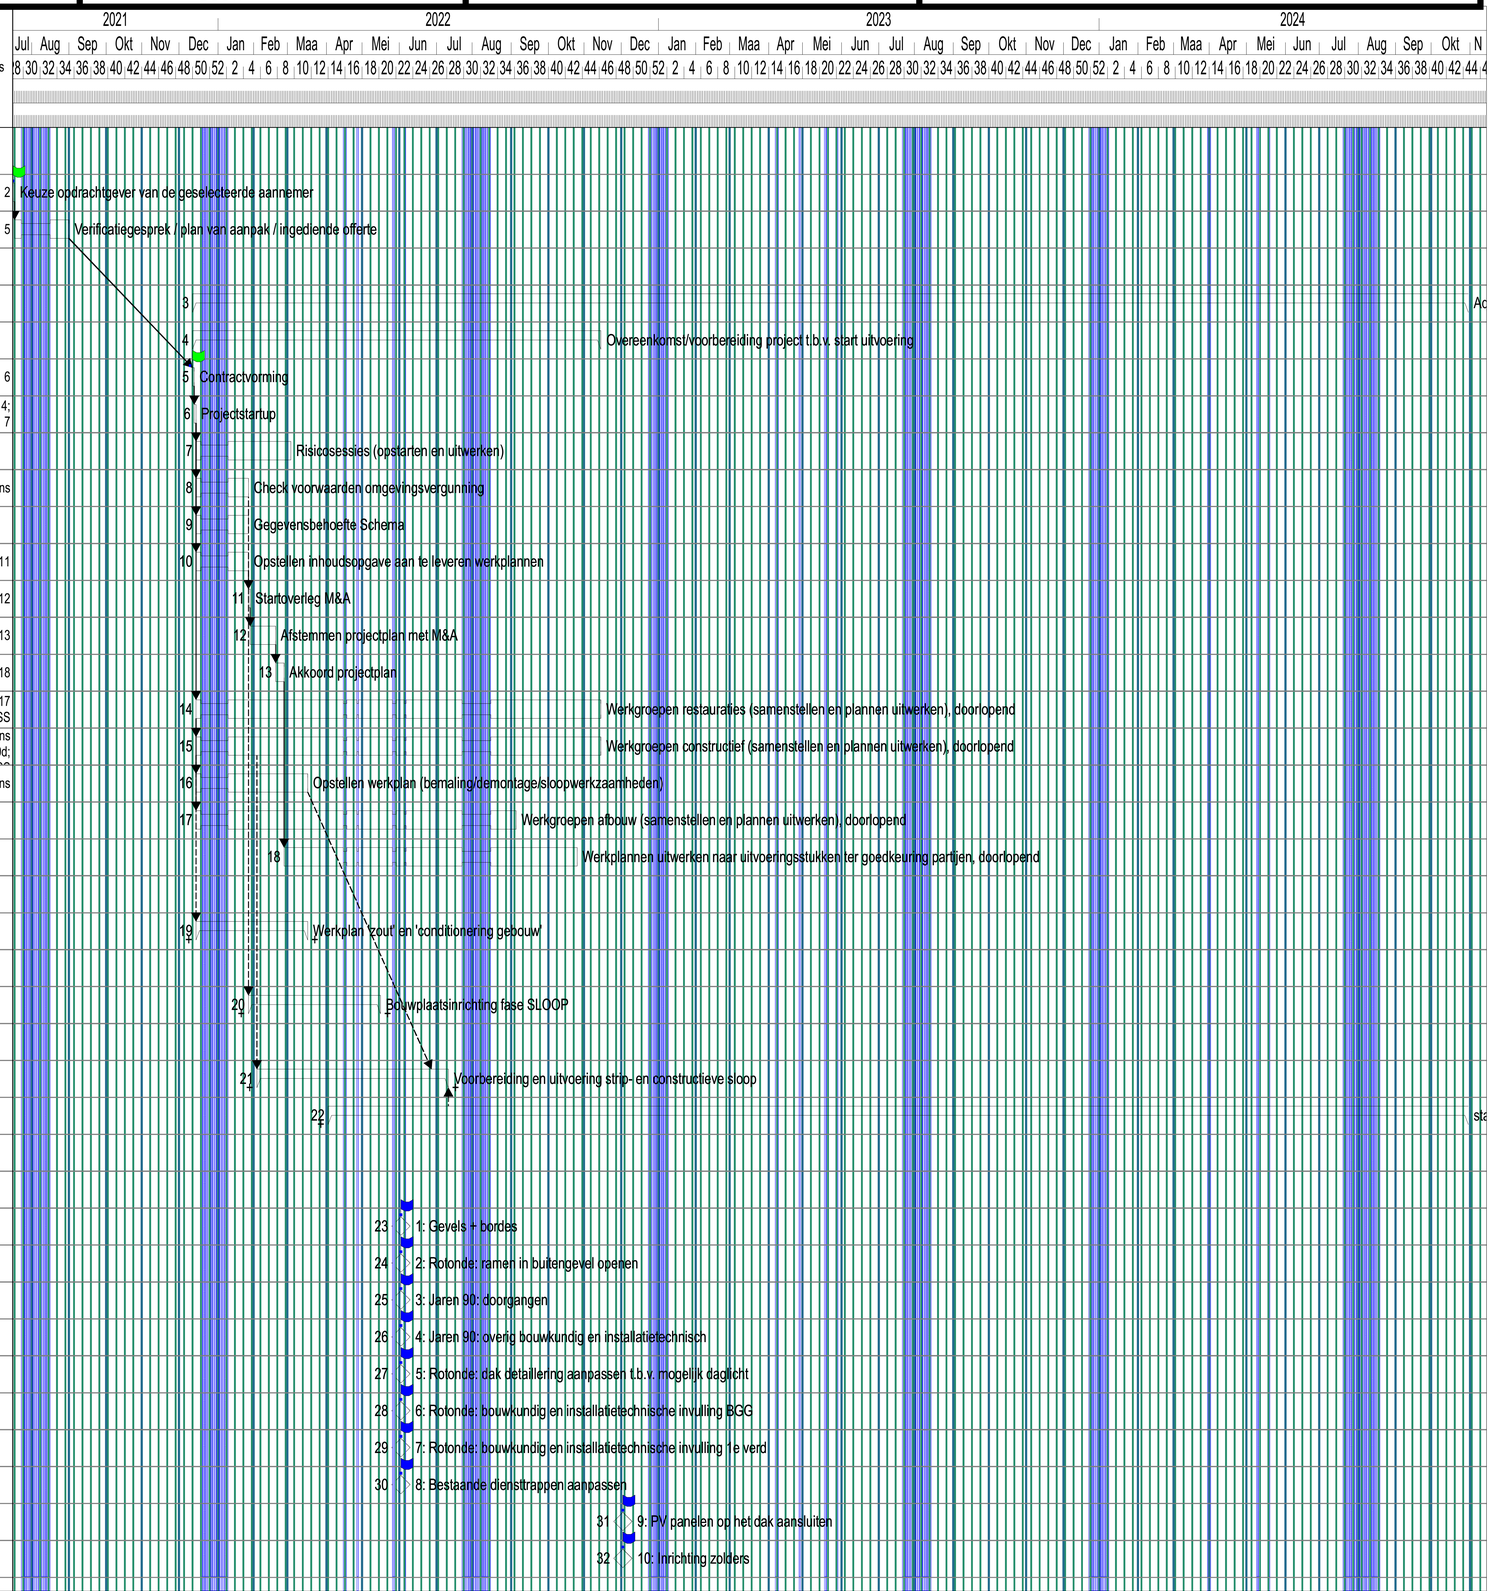

Mijlpaalweergaven

◇ Diamant

Legenda toegepaste uitzonderingsgrondslagen

In dit document zijn gegevens definitief geanonimiseerd op grond van:

Wet	Artikel	Omschrijving	Pagina's
Wet open overheid	Art. 5.1 lid 2 sub e	De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer	1
