Gemeente Amsterdam

Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Doorkijk t/m vrijgave SMP voor inspraak

Juni 2020

Auteur: Projectteam Universiteitskwartier Stadsdeel Centrum

Aan deze planning kunnen geen rechten worden verleend

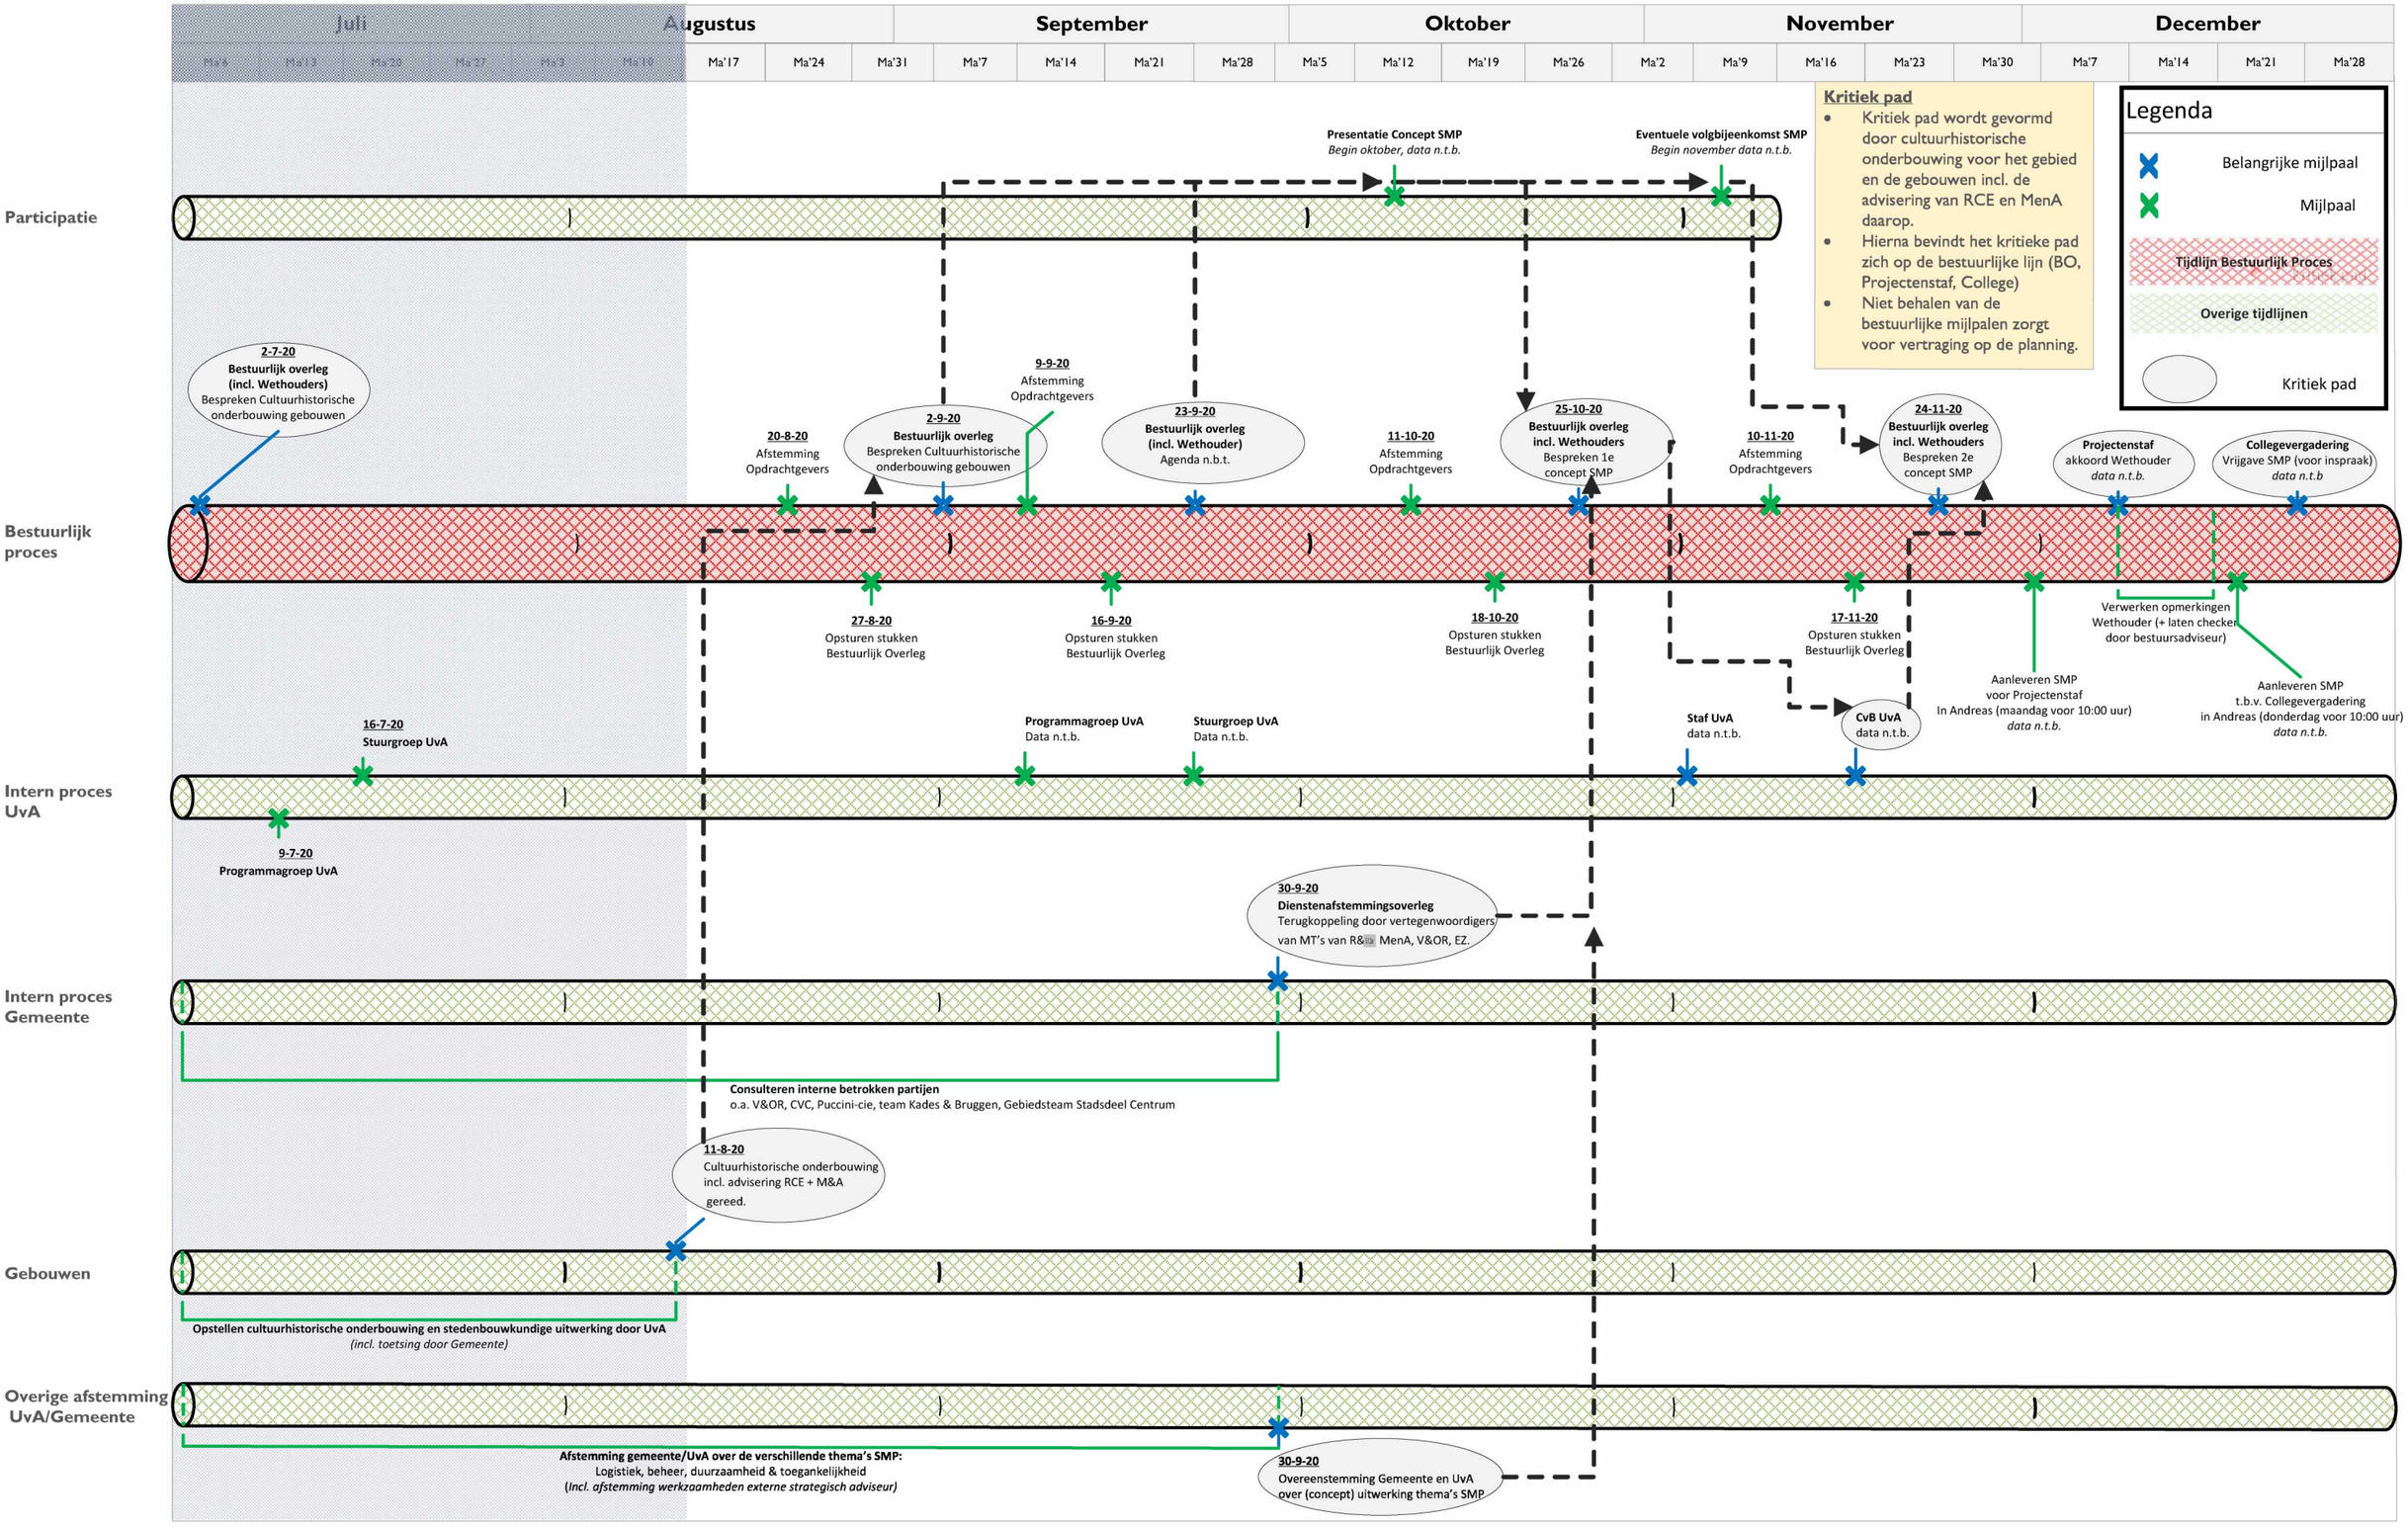

Strategisch Masterplan Universiteitskwartier

Bestuurlijk besluitvormingsproces gemeente Amsterdam

Juni 2020

Auteur: Projectteam Universiteitskwartier Stadsdeel Centrum

Aan deze planning kunnen geen rechten worden verleend

Maand 1				Maand 2					Maand 3					Maand 4				
Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	Week 6	Week 7	Week 8	Week 9	Week 10	Week 11	Week 12	Week 13	Week 14	Week 15	Week 16	Week 17	Week 18

TO DO:

- **Op basis van 'vrijgave SMP (voor inspraak)' bepalen wanneer bestuurlijk traject start**
- **Hierop planning passend maken aan data DB, Staf, College en Raad**
- **Voorbereiding en interne afstemmingsmomenten met diverse afdelingen/ diensten t.z.t. in planning toevoegen**

Legenda

- Besluit
- Overige mijlpalen
- Tijdlijn Bestuurlijk Proces

Bestuurlijk Proces

Inspraaktermijn gereed

Projectenstaf
Vaststellen SMP & NvB

Collegevergadering
Vaststellen SMP & NvB

Commissievergadering RO
Bespreken SMP

Raadsvergadering
Besluit op vaststelling SMP

Inspraaktermijn
Circa. 6 weken (afhankelijk van recessen)

Verwerken inspraakreactie
in Nota van Beantwoording
Duur: *ca. 3 weken*

Verwerken opmerkingen
Wethouder (+laten checken
door bestuursadviseur)
Duur: *ca. 1 week*

Verwerken opmerkingen College
Duur: *Ca. 1,5 week*

Aanleveren SMP (incl. NvB)
voor Projectenstaf
Aanlevertermijn: *5 dagen*

Aanleveren SMP (incl. NvB)
t.b.v. Collegevergadering
in Andreas (voor 10:00 uur)
Aanlevertermijn: *zes dagen*

Aanleveren SMP t.b.v.
Commissievergadering RO
(in Andreas)
Aanlevertermijn: *3 weken*
