Gemeente Amsterdam

Monitor Aanpak Kolenkitbuurt

Juni 2026

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.



Inleiding

Deze monitor beschrijft de voortgang van de Aanpak Kolenkitbuurt. Dit is de derde uitvoeringsmonitor van het programmaplan *Aanpak Kolenkitbuurt 2024-2035* dat in januari 2025 is vastgesteld door het dagelijks bestuur van stadsdeel West. Het programma vervangt de *Gebiedsopgave Integrale Aanpak Kolenkitbuurt 2023-2026*.



Met de Aanpak Kolenkitbuurt willen we een structurele verbetering van de woningen, leefomgeving en sociaal-economische positie van bewoners realiseren. Dat doen we door bestaande inzet te intensiveren, aan te passen en te experimenteren met nieuwe werkwijzen en interventies. Doordat bewoners samen met buurtpartners een vaste en actieve rol hebben, benutten we de wijsheid en kracht van de gemeenschap.

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Deze monitor geeft een beeld van de inspanningen van het programma in de eerste helft van 2026. De voortgang van het programma als geheel, van de vier programmalijnen en van de individuele inspanningen is in beeld gebracht aan de hand van vijf indicatoren: status, type opbrengst, samenwerkingsvormen, type inzet en doelstellingen. Ook bevat de monitor een financiële stand van zaken.

Voortgang aan de hand van indicatoren

De voortgang van het programma brengen we in beeld aan de hand van vijf indicatoren.

Status
Status geeft een beeld over de voortgang van de inspanningen: zijn ze afgerond, uitgevoerd of in voorbereiding.

Type opbrengst
Inspanningen hebben verschillende type opbrengsten. Zo zijn er inspanningen die concrete, zichtbare resultaten voor bewoners opleveren. Andere inspanningen leveren kennis op over hoe iets op een andere of betere manier kan worden opgelost. Weer andere inspanningen zijn gericht op de systeemvoorwaarden of -doorbraken (bijvoorbeeld in regelgeving) die nodig zijn om problemen in de Kolenkitbuurt duurzaam aan te pakken.

Samenwerkingsvormen
De samenwerkingsvorm geeft aan welke partijen betrokken zijn bij de uitvoering van de inspanningen. Passend bij het programma worden veel inspanningen opgepakt door meerdere partners. Het is ook mogelijk dat een inspanning (bijna) geheel door de gemeente of een partner wordt opgepakt.

Type inzet
Bij het type inzet gaat het om meer doen, het beter doen of het anders doen. Onder 'meer doen' verstaan we het continueren van iets bestaands, met een intensievere inzet. Onder 'beter' verstaan we het continueren van iets bestaands, maar dat ook verbeteren. Onder 'anders' verstaan we het inzetten van iets nieuws, buiten de bestaande paden.

Doelstellingen
Onder doelstellingen wordt door middel van een kleur aangegeven op welke doelstelling(en) een inspanning gericht is. In het programmaplan Aanpak Kolenkitbuurt zijn zeven doelen vastgesteld. Hieronder is de legenda weergegeven.

- Hoge kwaliteit woningen en leefomgeving (1)
- Kansen voor werk en ondernemen (2)
- Veel ontmoetingen en activiteiten (3)
- Bewoners van alle groepen zijn trots en hebben het gevoel bij de wijk te horen (4)
- Een veilige buurt door sterke sociale netwerken (5)
- Buurtbewoners zijn gezonder (6)
- Goede hulp voor kwetsbare bewoners (7)

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Voortgang programma

Het programma bestaat momenteel uit 36 inspanningen, verdeeld over vier programmalijnen. Van deze inspanningen zijn er 29 in uitvoering en 6 in voorbereiding. Eén inspanning is gepauzeerd. Daarnaast zijn in de afgelopen periode 5 inspanningen afgerond en/of geborgd, zoals de preventieve huisbezoeken in Kolenkit Noord en de spelinloop. Het borgen van inspanningen houdt in dat deze duurzaam worden verankerd in de buurt door ze onderdeel te maken van reguliere inspanningen van de gemeente en/of partnerorganisaties. Er is geen actieve betrokkenheid meer van het programma.

Inspanningen dragen vaak bij aan meerdere doelstellingen binnen het programma; hierop wordt ook gestuurd. Zo draagt het merendeel van de inspanningen bij aan trots op en verbondenheid met de buurt (21), hoewel dit lang niet altijd de primaire doelstelling is. Een groot deel van de inspanningen is gericht op het bieden van goede hulp aan bewoners in een kwetsbare situatie (18). Daarnaast is er aandacht voor het stimuleren van ontmoetingen en activiteiten in de buurt (17) en het bevorderen van gezondheid en welzijn van bewoners (15). Ook wordt gewerkt aan het versterken van sociale netwerken en veiligheid in de buurt (12), het verbeteren van de kwaliteit van woningen en de leefomgeving (11) en het vergroten van kansen voor werk en ondernemen (11). De spreiding over de verschillende doelstellingen laat zien dat integraal gewerkt wordt aan zowel sociale als fysieke verbeteringen in de Kolenkitbuurt.

Het overgrote deel van de inspanningen wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere partners én bewoners (58%) of met meerdere partners (39%). Ten opzichte van het jaarbeeld, waarbij beide samenwerkingsvormen elk 40% vertegenwoordigden, is de samenwerking mét bewoners duidelijk toegenomen. Deze toename past bij de rode draden die voor 2026 zijn geformuleerd: het werken aan vertrouwen en het organiseren van dialogen over thema's die door de buurt zelf worden gekozen. Voorbeelden zijn verbeteringen aan de openbare ruimte en leefomgeving waarbij bewoners actief meedenken en meedoen, gezamenlijke buurtactiviteiten en inspanningen gericht op ontmoeting en sociale samenhang.

Slechts één inspanningen wordt op dit moment door de gemeente uitgevoerd namelijk de uitbreiding van de speeltuin aan de Wiltzanglaan.

Ook dit jaar ligt de nadruk op het anders doen van zaken: 61% van de inspanningen betreft vernieuwende werkwijzen, nagenoeg gelijk aan het jaarbeeld (62%). De verhoudingen voor 'beter doen' (17%) en 'meer doen' (17%) zijn eveneens vrijwel stabiel gebleven ten opzichte van respectievelijk 16% en 18% in het jaarbeeld. Voor 6% van de inspanningen wordt de precieze inzet nog nader bepaald. De nadruk op vernieuwing weerspiegelt de ambitie om niet alleen meer van hetzelfde te doen, maar structureel anders te werken aan de uitdagingen in de buurt.

De opbrengsten van het programma zijn in toenemende mate zichtbaar voor bewoners: 75% van de inspanningen is direct merkbaar in de buurt, een stijging ten opzichte van het jaarbeeld (69%). De aandacht voor systeemvoorwaarden (14%) en kennisontwikkeling (11%) is licht gedaald ten opzichte van respectievelijk 16% en 16% in het jaarbeeld. Deze verschuiving weerspiegelt de voortgang van het programma: waar eerder meer werd geïnvesteerd in randvoorwaarden en leren, vertaalt de inzet zich nu in toenemende mate in concrete, zichtbare resultaten voor bewoners.

Aantal inspanningen per doelstelling. Eén inspanning kan zich richten op meerdere doelstellingen.

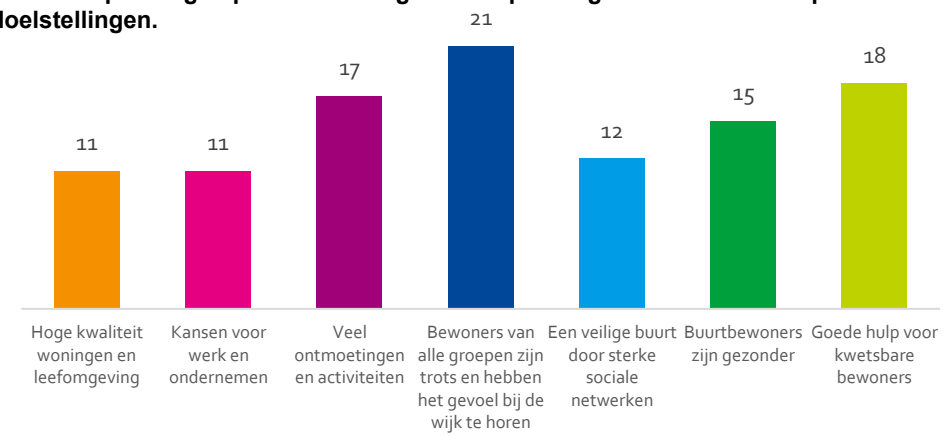

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Voortgang programma in beeld – totaal aantal inspanningen 36

Status inspanningen

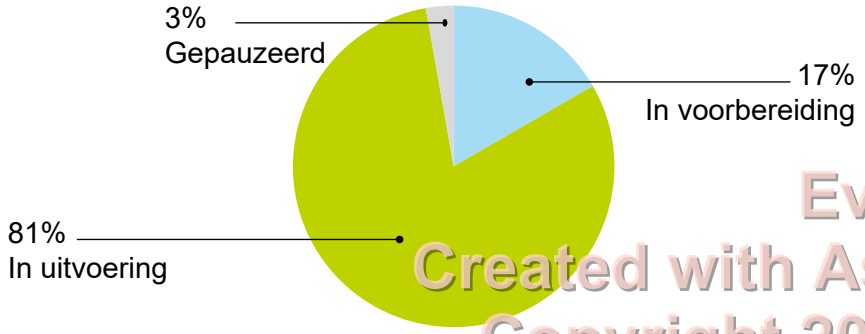

Type opbrengst

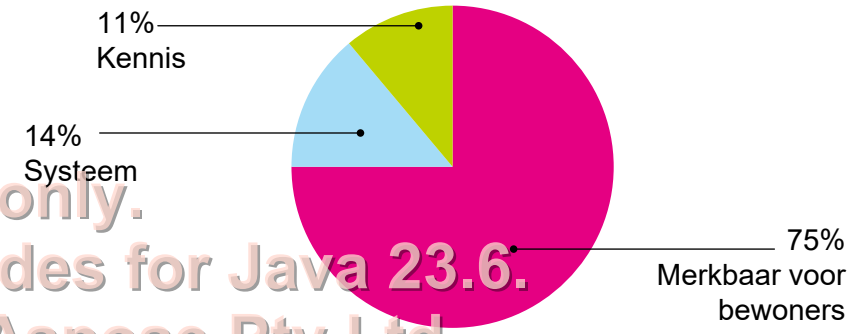

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Samenwerkingsvorm

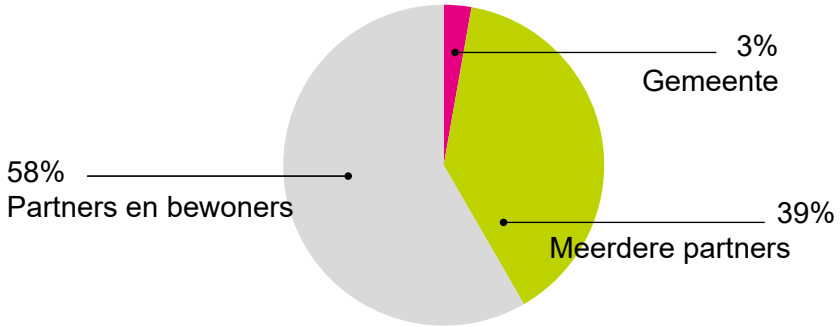

Type inzet

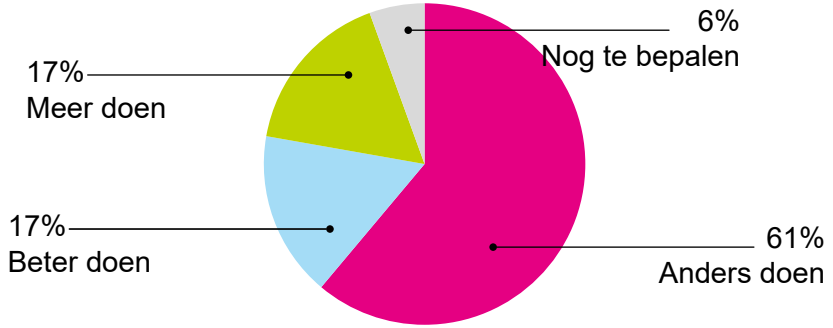


Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Programmalijn 1

Een fijne woon- en leefomgeving

Voortgang programmalijn 1: Een fijne woon- en leefomgeving

Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
1. Vernieuwing woningen Kolenkit M+N	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
2. Vernieuwing openbare ruimte Kolenkit M+N	In voorbereiding	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
2.1. Uitbreiding Speeltuin Wiltzanghlaan Kolenkit Noord	In voorbereiding	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Gemeente	
3. Schouwen openbare ruimte Kolenkit M+N	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Partners en bewoners	
4. Pilot buurtsamenwerking signalen en meldingen OR en wooncomplexen	In uitvoering	Anders doen	Kennis	Meerdere partners	
5. Interim plan afval Kolenkit M+N	In uitvoering	Beter doen	Systeem/voorwaarden	Meerdere partners	
6. Social Placemaking	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
7. Ondersteunen bewonersinitiatieven publieke ruimte, waaronder aanpak (zwerf)afval en moestuinen	In uitvoering	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
8. Buurtaanpak sociale veiligheid	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
9. Buurtaanpak Cruyff Court en omgeving	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	

Afgeronde/Geborgde Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
Kortetermijnaanpak door Rochdale om de kwaliteit van de woningen in Kolenkit Noord te verbeteren	Afgerond	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Partner	

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status
Programmalijn 1 telt tien inspanningen, waarvan er acht in uitvoering zijn en twee in voorbereiding. De twee inspanningen in voorbereiding betreffen de vernieuwing van de openbare ruimte in Kolenkit Noord en de uitbreiding van de speeltuin aan de Wiltzanglaan. De overige acht zijn in uitvoering, variërend van de woningvernieuwing en vernieuwing van de openbare ruimte in samenwerking met Rochdale tot de buurtaanpak rondom het Cruyff Court. De programmalijn bevindt zich daarmee in een actieve uitvoeringsfase, waarbij de concrete resultaten zichtbaar worden in de wijk.

Type opbrengst
De opbrengsten zijn breed zichtbaar in de buurt. In april is het [illegible] feestelijk van start gegaan met 32 beschikbare tuinen in de noordelijke blokken; alle plekken waren direct bezet. Tegelijkertijd is een nieuwe weggeefkast geopend in Kolenkit Noord, als laagdrempelige voorziening waar bewoners spullen kunnen delen en elkaar kunnen ondersteunen. Bij het Cruyff Court zijn drie speeltoestellen voor peuters en een picknicktafel geplaatst, om ontmoetingen te bevorderen en ouders beter toezicht te laten houden op spelende kinderen. Naast zichtbare opbrengsten voor bewoners levert de buurtsamenwerking via het Kolenkit Collectief ook kennis op. Partners bouwen gezamenlijk inzicht op in signalen, behoeften en knelpunten in de buurt, waardoor vraagstukken sneller kunnen worden opgepakt.

Samenwerkingsvorm
De inspanningen binnen programmalijn 1 worden overwegend in samenwerking met meerdere partners en bewoners uitgevoerd. Dit komt onder meer tot uiting in de schouw van de openbare ruimte, waarbij de gemeente, woningcorporaties, buurtwerk en bewoners gezamenlijk optrekken. Ook bij de woningvernieuwing werken gemeente, Rochdale, bewonerscommissies en sleutelpersonen nauw samen. Bewoners vervullen een actieve rol in de uitvoering van de inspanningen binnen programmalijn 1. Zo zijn zij betrokken bij de inrichting van het Cruyff Court en hebben input geleverd voor de openbare ruimte in aanloop naar de inspiratiesessie *Inclusief Ontwerpen*.

Status inspanningen



Type opbrengst



Type samenwerking



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Type inzet
Het merendeel van de inspanningen richt zich op het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe werkwijzen in de buurt, zoals de inspiratiesessie voor inclusieve inrichting van de openbare ruimte. Daarnaast wordt ingezet op het versterken van bestaande initiatieven, zoals de ondersteuning van bewonersinitiatieven als buurtmoestuinen en de Schoonste Straatwedstrijd. Ten opzichte van 2025 is het aantal bewoners met een moestuin gestegen van 17 naar 32. Ook is het aantal deelnemende straten aan de Schoonste Straatwedstrijd toegenomen van zeven in 2025 naar tien in de eerste periode van 2026. Deze groei laat zien dat steeds meer bewoners zich betrokken voelen bij een schone, leefbare en prettige buurt.

Type inzet



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.



Drie extra speelvoorzieningen en een picknicktafel op het Cruyff Court.

Inspanningen in 't kort:
- Bewonersbijeenkomst Rochdale & gemeente over de herhuisvesting en terugkeerregeling Sinjeur Semeynsstraat
- Inspiratiesessie *Inclusief Ontwerpen – Kolenkit Midden* heeft plaatsgevonden als voorbereiding voor de participatie en het ontwerp openbare ruimte
- Aanpak Cruyff Court en omgeving: plaatsing drie speeltoestellen voor peuters en een picknicktafel; 2 bewonersbijeenkomst met partners, bewoners en stadsdeel; Groen in de buurt-initiatief;
- Schouw openbare ruimte met bewoners en partners
- Schouw Schaapherderstraat met Afval & Grondstoffen
- Samenwerking met formele en informele partners zoals Kolenkit Collectief en Integraal Kolenkit Overleg om signalen uit de buurt sneller op te pakken
- Opening moestuinseizoen: 32 bewoners hebben een moestuin waar zij groente en fruit verbouwen, ondersteund door Rochdale, Combiwel Buurtwerk en gebiedsmakelaar
- Opening weggeefkast in Kolenkit Noord



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Programmalijn 2

Goed opgroeien in de Kolenkit

Voortgang programmalijn 2: Goed opgroeien in de Kolenkit

Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
1. Analyse, vormgeven en uitvoeren buurtaanpak vier leefwerelden	In uitvoering	Nog te bepalen	Kennis	Meerdere partners	
2. Inzet allerjongsten					
2.1. Baby Groente Tas	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
3. Stimuleren van deelname aan sport & bewegen en kunst & cultuuraanbod	In uitvoering	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
4. Realiseren en programmeren van aantrekkelijke plekken in de buurt voor talentontwikkeling	In uitvoering	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
5. Realiseren van laagdrempelige plekken voor vragen en workshops gericht op welzijn, zelfredzaamheid en werk	In uitvoering	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
6. Samenwerken jongerenpartners bij scholing, stage en werk	In uitvoering	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
7. Uitbreiden mogelijkheden voor jonge bewoners om zich uit te spreken en actief bij te dragen aan de buurt	In voorbereiding	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
8. Actieonderzoek jongeren in kwetsbare financiële situatie	In voorbereiding	Anders doen	Systeemvoorwaarden	Meerdere partners	

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Afgeronde/Geborgde Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
Spelinloop	Geborgd	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Partner	
Netwerk Eenoudergezinnen	Geborgd	Beter doen	Kennis	Meerdere partners	

Status
Programmalijn 2 omvat acht inspanningen. Hiervan zijn er zes in uitvoering en twee in voorbereiding. De twee inspanningen in voorbereiding betreffen het uitbreiden van mogelijkheden voor jongeren om zich uit te spreken en bij te dragen aan de buurt, en het actieonderzoek jongeren in een financieel kwetsbare positie. De overige zes inspanningen zijn in uitvoering, waaronder de Baby Groente Tas en het inloopspreekuur *Bos en Lommer Werkt!*. De inspanningen zijn voornamelijk gericht op het ondersteunen van bewoners in een kwetsbare positie en het versterken van gezondheid en welzijn. Binnen deze programmalijn ligt de nadruk op het vergroten van ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren, met als doel dat zij gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien in de Kolenkitbuurt.

Type opbrengst
Bij circa driekwart van de inspanningen binnen programmalijn 2 zijn de opbrengsten zichtbaar in de buurt. In de periode maart–april zijn vijf jongeren via *Bos en Lommer Werkt!* doorverwezen naar het Jongerenpunt, waar zij nog verder worden begeleid richting werk. Daarnaast zijn ook voor jonge kinderen concrete resultaten zichtbaar: in de periode januari–mei hebben circa 39 gezinnen uit de Kolenkitbuurt een Baby Groente Tas ontvangen. Het netwerk Kansrijke Start, dat vorig jaar naar aanleiding van de opgave in de Kolenkit is verkend, wordt nu als stadsdeelbreed netwerk voor het jonge kind en gezin uitgewerkt binnen de sociale basis en valt daarmee niet langer onder deze programmalijn. Hetzelfde geldt voor de spelinloop.

Samenwerkingsvorm
De meeste inspanningen worden uitgevoerd in samenwerking met meerdere partners en bewoners. Zo worden jongeren in samenwerking met DOCK, via een zakgeldproject actief betrokken als initiatiefnemer én deelnemer van buurtactiviteiten en leren ze kritisch nadenken over wat een goede wijk is en hun rol daarin. Een voorbeeld van een samenwerking met uitsluitend partners is de voorbereiding van het actieonderzoek jongeren in een financieel kwetsbare positie. In deze voorbereidingsfase werken interne partners zoals Buurteam en WPI en externe partners zoals als perMens en HvA samen aan de onderzoeksopzet. West Connect adviseert over de onderzoeksopzet en de interpretatie van de uitkomsten.

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status inspanningen



Type opbrengst



Type samenwerking



Type inzet
Binnen programmalijn 2 is sprake van een gemengde inzet. Een deel van de inspanningen is gericht op het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen, zoals het actieonderzoek naar jongeren in een financieel kwetsbare situatie. Daarnaast wordt binnen de begeleiding naar stage en werk via *Bos en Lommer Werkt!* gewerkt aan het verbeteren en doorontwikkelen van bestaande werkwijzen. Dit gebeurt onder meer door de verkenning van een maandelijks meidenspreekuur in samenwerking met Elance Academy.

Type inzet



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.



Inspanningen in 't kort:
- Baby Groente Tas: 39 gezinnen ontvingen een tas
- Speelgoedkist op het Nannoplein beheerd door bewoners en de Bos- en Lommerschool
- Talentontwikkeling georganiseerd door DOCK & JP Vision in buurtpunt de Kit
- Zakgeldproject in samenwerking met DOCK in voorbereiding

§ *Bos en Lommer Werkt!:* 5 jongeren doorverwezen naar Jongerenpunt en momenteel in begeleiding
§ Actieonderzoek jongeren in een financieel kwetsbare situatie in voorbereiding
§ Spelinloop in buurtpunt De Kit en het netwerk Kansrijke Start geborgd binnen de Sociale Basis



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Programmalijn 3

Gezondheid, welzijn en werk

Voortgang programmalijn 3: Gezondheid, welzijn en werk

Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
1. Laagdrempelige en toegankelijke contacten, informatie, voorlichting en ondersteuning	In uitvoering	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
2. Pilot kernteam ondersteuning bewoners in een kwetsbare situatie	In uitvoering	Beter doen	Kennis	Meerdere partners	
3. Verkenning kansrijke stedelijke en landelijke aanpakken en buurtpartners in aansluiting bij wensen en behoeften buurt					
3.1. Donutdeal Circulair Textiel	In uitvoering	Anders doen	Systeemvoorwaarden	Meerdere partners	
3.2. Bibliotheek der dingen	Gepauzeerd	Anders doen	Systeemvoorwaarden	Meerdere partners	
4. Buurtaanpak gezond eten en bewegen	In uitvoering	Beter doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
5. Ondersteunen van lokale maatschappelijke initiatieven op het gebied van gezondheid, welzijn en werk	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	
6. Onderzoek UMC/GGD bestaansonzekerheid en mentale gezondheid	In uitvoering	Anders doen	Kennis	Meerdere partners en bewoners	
7. Versterken wijkeconomie en ondernemerschap	In voorbereiding	Nog te bepalen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
8. Fietsen voor de Kolenkitbuurt	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners	

Afgeronde/Geborgde Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
Preventieve Huisbezoeken Kolenkit Noord	Afgerond	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status
Programmalijn 3 bestaat uit negen inspanningen. Hiervan zijn er zeven in uitvoering, één in voorbereiding en één gepauzeerd. De inspanning in voorbereiding is het versterken van wijkeconomie en ondernemerschap. De verkenning *Bieb der Dingen* is gepauzeerd, omdat het stedelijk team samen met de OBA in gesprek is over vervolgstappen. De inspanningen binnen deze programmalijn richten zich op het ondersteunen van kwetsbare bewoners en het stimuleren van participatie via werk en ondernemerschap. Daarmee zet de programmalijn in op het versterken van sociaaleconomische kansen en het bevorderen van gezondheid en welzijn, met aandacht voor bewoners die extra ondersteuning nodig hebben.

Type opbrengst
Binnen 'Gezondheid, welzijn en werk' is meer dan de helft van de resultaten direct merkbaar voor bewoners. Een voorbeeld van een direct merkbare opbrengst is *Fietsen voor de Kolenkitbuurt*, waarbij twee bakfietsen zijn overgedragen aan gezinnen in Kolenkit Zuid, met de ambitie om dit maandelijks te herhalen.
Daarnaast levert het UMC-onderzoek kennis op. Via systeemdenken en interviews met 15 initiatieven is een systeemkaart ontwikkeld over de relatie tussen bestaansonzekerheid en mentale gezondheid in de Kolenkitbuurt.
De *Donutdeal Circulair Textielnetwerk* draagt bij aan het verbeteren van systeemvoorwaarden door te werken aan de ontwikkeling van een textielcoöperatie voor vrouwen uit West en Nieuw-West.

Samenwerkingsvorm
Twee derde van de inspanningen wordt uitgevoerd in samenwerking met meerdere partners. Bij de overige inspanningen worden naast partners ook bewoners betrokken. Zo werken binnen de Werkgroep Dementie Combiwel, Buurtwerk & Buurtteam, Stichting Aminah, Cordaan en Stichting Mantelzorg en Dementie samen. Binnen het UMC-onderzoek worden ook bewoners en ervaringsdeskundigen actief betrokken.

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status inspanningen



Type opbrengst



Type samenwerking



Type inzet
Binnen programmalijn 3 ligt de nadruk op ‘anders doen’. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van het UMC, waarbij een nieuwe werkwijze op basis van systeemdenken wordt ontwikkeld om impactvolle interventies op het gebied van bestaansonzekerheid en mentale gezondheid te bepalen en in gang te zetten. Een voorbeeld van ‘beter doen’ is het *outreachend* werken binnen de inspanning “Laagdrempelige en toegankelijke contacten, informatie, voorlichting en ondersteuning”. In overleg met buurtpartners wordt continu gekeken waar de behoefte van bewoners ligt en hoe daarin kan worden voorzien.

Type inzet



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Inspanningen in ‘t kort:
- Wekelijkse inloopspreekuren van Combiwel Buurtwerk, Gebiedsmakelaar, Buurtteam (mantelzorgers), Eigen Haard en Vrouwen Vooruit georganiseerd in buurtpunt De Kit
- Buurtbakkie: aansluiting van buurtpartners en gemeente bij 5 bijeenkomsten in de periode maart-juni
- Pilot preventieve huis-aan-huisgesprekken afgerond
- Werkgroep Dementie: 2 werkgroepoverleggen (februari & mei) en start van een wekelijks algemeen inloopspreekuur van het Buurtteam bij Stichting Aminah
- Donutdeal Circulair Textielnetwerk: makersbijeenkomst georganiseerd en eerste deals gesloten, waaronder picknickdekens voor het Concertgebouworkest en tafelkleden voor Station Wildeman
- UMC-onderzoek: systeemkaart bestaanszekerheid en mentale gezondheid Kolenkit ontwikkeld
- Onderzoek ondersteuning ondernemers afgerond
- Fietsen voor de Kolenkitbuurt: 2 bakfietsen overgedragen aan gezinnen in Kolenkit Zuid



Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Programmalijn 4

Activiteiten, dialoog en ontmoeting

Voortgang programmalijn 4: Activiteiten, dialoog en ontmoeting

Inspanning	Status	Inzet	Opbrengst	Samenwerking	Doelstellingen
1. Realiseren en programmeren van een tijdelijke ontmoetingsplek	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
2. Benutten en creëren van ruimte voor dialoog, activiteiten en ontmoeting op locaties van buurtorganisaties	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
3. Monitoren en ondersteunen van de ontwikkelbehoefte van bewonersnetwerken en maatschappelijke initiatieven	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
4. Organiseren van dialoog en informatievoorziening actuele thema's, dilemma's en signalen uit de buurt					
4.1. Denk & Doetank	In voorbereiding	Anders doen	Systeemvoorwaarden	Meerdere partners en bewoners	
4.2. Netwerkbijeenkomst Kolenkit	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
5. Activiteiten en evenementen om verschillende bewonersgroepen kennis laten maken	In uitvoering	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
6. Vertellen van verhalen over de buurt en haar bewoners om de trots op de buurt te laten zien	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
7. Buurtcommunicatie versterken	In uitvoering	Anders doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	
8. Organiseren van laagdrempelig contact tussen bewoners, gemeente en buurtprofessionals in buurtpunt De Kit en op straat.	In uitvoering	Meer doen	Merkbaar voor bewoners	Meerdere partners en bewoners	

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status
Programmalijn 4 omvat negen inspanningen, waarvan er acht in uitvoering zijn en één in voorbereiding. Alle inspanningen dragen bij aan de zeven doelstellingen, met nadruk op het versterken van trots en verbondenheid onder bewoners en het stimuleren van ontmoetingen en buurtactiviteiten. Daarmee richt de programmalijn zich op het vergroten van betrokkenheid, verbinding en eigenaarschap van bewoners in de Kolenkitbuurt.

Type opbrengst
Vrijwel alle opbrengsten binnen programmalijn 4 zijn merkbaar voor bewoners. Zo vond in april de eerste Kolenkit netwerkbijeenkomst van dit jaar plaats in de vorm van een socratische dialoog, met 35 aanwezigen — een goede mix van bewoners en professionals. Het WhatsApp-kanaal voor de Kolenkitbuurt heeft inmiddels meer dan 400 volgers en groeit gestaag. Uit de evaluatie van buurtpunt De Kit blijkt dat het een gewaardeerde ontmoetingsplek is, waar bewoners en professionals prettig samenwerken aan activiteiten, ontmoeting en ondersteuning. Tegelijkertijd zijn er aandachtspunten, zoals het volle programma met bestaande activiteiten. Het blijft daarom belangrijk om ruimte te behouden voor nieuwe initiatieven en aansluiting te zoeken bij nieuwe bewonersgroepen. Met name in Kolenkit Noord wordt het buurtpunt nog niet door alle bewonersgroepen vanzelfsprekend als hun plek ervaren. Dit vraagt om doorontwikkeling van het aanbod en de verbinding met de wijk. In het najaar start daarom een bingoavond, geïnitieerd door een actieve bewoner uit het gebied, met als doel meer bewoners uit Kolenkit Noord te bereiken en hen te laten kennismaken met het buurtpunt. De nieuwe huiskamer op de begane grond draagt bij aan de toegankelijkheid voor bewoners die het buurtpunt nog niet kennen, en daarnaast zijn aanvullende buurtactiviteiten georganiseerd om verschillende bewonersgroepen kennis te laten maken met het buurtpunt, zoals een jongereniftar en de Kolenkit Buurtmarkt tijdens de Kom Buurten actiedagen.

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Status inspanningen



Type opbrengst



Samenwerkingsvorm
Alle inspanningen binnen programmalijn 4 worden uitgevoerd in samenwerking met meerdere partners én bewoners. Dit is zichtbaar in de brede coalitie van buurtorganisaties, woningcorporaties, professionals en bewoners die samen werken aan activiteiten, communicatie en dialoog. Een mooi voorbeeld is de boekpresentatie van *KOLENKIT*, waarbij verhalen en illustraties van acht vrouwen centraal stonden die moesten verhuizen als gevolg van de stadsvernieuwing en hun herinneringen wilden doorgeven aan toekomstige bewoners. Ook de tentoonstelling *Middenin De Kolenkit* in het buurtpunt liet zien hoe bewoners en organisaties samenwerken aan de buurt en gaf inzicht in persoonlijke verhalen, bestaande initiatieven en plannen die nog in ontwikkeling zijn — de opening werd bezocht door ruim 50 aanwezigen.

Type Inzet
Zeven inspanningen richten zich op het anders doen, door in te zetten op nieuwe werkwijzen. De Denk & Doetank is hiervan een voorbeeld. Met de Denk & Doetank, wordt een volgende stap gezet in de samenwerking tussen bewoners en buurtprofessionals en het verder benutten van de kracht van de gemeenschap als motor voor buurtontwikkeling.Via *Socratic Design* gaan bewoners, professionals en partners met elkaar in dialoog over wat er speelt in de buurt en over de onderliggende denkbeelden, waarden en gewoontes die bepalend zijn voor hoe we samenleven en samenwerken. Vanuit deze gesprekken wordt gewerkt aan collectieve wijsheid, een gedeeld wensbeeld voor de buurt en activiteiten en projecten om dat te realiseren. In 2026 ligt de nadruk op het vergroten van de groep enthousiaste bewoners, het opbouwen van gezamenlijke wijsheid en gedeelde wensbeelden.





Opening tentoonstelling Middenin De Kolenkit

Type samenwerking



Type inzet



Inspanningen in 't kort:
- Tussentijdse evaluatie buurtpunt De Kit: buurtpunt wordt gewaardeerd als ontmoetingsplek. Aandachtspunten: ook bezoekers van activiteiten bevragen naast organisatoren, ruimte behouden voor programmering en nieuwe initiatieven, en alle doelgroepen beter blijven bereiken
- Opening huiskamer in buurtpunt De Kit
- Tentoonstelling *Middenin De Kolenkit* in buurtpunt De Kit
- Boekpresentatie en buurtgesprekken *Een Liefdesverklaring aan mijn KOLENKIT* door Operatie Periscoop
- Ondersteuning bewonersgroep 'Kolenkit Genootschap' door Operatie Periscoop
- Denk & Doetank: dialogen en interviews met bewoners over een goed leven in een goede buurt, netwerkbijeenkomst met drie socratische dialogen, bewoner gestart als ambassadeur en trekker
- Buurtactiviteiten: jongereniftar en Kom Buurten actiedagen inclusief Buurtmarkt Kolenkit in buurtpunt De Kit
- WhatsApp-kanaal gestart met ruim 400 volgers

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

Financiën

De Gebiedsopgaven, waar de Aanpak Kolenkitbuurt onderdeel van uitmaakt, zijn in 2026 op 125% gebudgetteerd. Voor het programma Aanpak Kolenkitbuurt is de totale begroting €320.000 (125%). In de praktijk betekent dit een beschikbaar budget van €256.000 (100%). Op dit moment is ongeveer €125.000 van het beschikbare budget besteed. We liggen op schema om in de tweede helft van het jaar het resterende budget volledig te besteden aan verschillende inspanningen binnen de programmalijnen.

Evaluation only.
Created with Aspose.Slides for Java 23.6.
Copyright 2004-2023 Aspose Pty Ltd.

