Planning Cluster Taxi

concept dd 17-1-11

layout: Taxicluster

17-Jan-11 15:23

Activity ID	Activiteit	Start	Finish	Original Duration	Verantwo...
	Taxi Algemeen	01-Dec-10	25-Mar-11	82	
	Organisatie	01-Dec-10	25-Mar-11	82	
	Interne goedkeuring werving tijdelijke informatiebeheerder	01-Dec-10	30-Dec-10	22	Mica
	Profiel tijdelijke informatiebeheerder	17-Dec-10	17-Jan-11	22	Mica
	Werving informatiebeheerder	18-Jan-11	14-Feb-11	20	Mica
	Start (tijdelijke) Informatiebeheerder	17-Mar-11		0	Mica
	Werving coördinator toezicht en Handhaving	01-Dec-10	21-Jan-11	38	Mica
	Start Coördinator	25-Mar-11		0	Mica
	Financiën	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Afronding 2010	01-Dec-10	14-Jan-11	33	
	(uren)Begroting 2011	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	Uitwerken projecten 2011	01-Feb-11	28-Feb-11	20	
	Beleid	01-Dec-10	25-Jul-12	431	
	Nieuwe wetgeving / G4-overleggen	01-Dec-10	02-May-11	109	
	Taxiwet door Tweede + Eerste Kamer	01-Dec-10	31-Jan-11	44	Kuné
	Uitwerking impact voor Amsterdam	01-Feb-11	02-May-11	65	Kuné
	Opstelling BIBO-beleidslijn	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Beleidsplan	01-Dec-10	25-Jul-12	431	
	Beleidsfase	01-Dec-10	25-Jan-12	301	
	Concept plan	01-Dec-10	07-Apr-11	91	
	Beschrijving model nieuwe taxiwet	01-Dec-10	31-Jan-11	44	Kuné
	Onderbouwing invoering eisen groepsvorming	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	Onderbouwing gebied	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	Inhoudel. eisen+voorschriften taxigroepen en taxichauffeurs	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	1e contouren handhavingssystematiek	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	1e contouren org.inrichting&werkprocessen	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	1e contouren samenwerking ts partijen op toez.&handhaving	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	1e contouren financien	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	Informatie- en communicatieplan	01-Feb-11	28-Feb-11	20	
	Benodigde infrastructuur	01-Dec-10	02-Mar-11	66	
	Hoofdpuntennotitie Beleidsplan in wethouderstaf	07-Feb-11*		0	
	Hoofdpuntennotitie Beleidsplan in Bestuurlijk team	07-Feb-11		0	
	Hoofdpuntennotitie Beleidsplan in B&W	01-Mar-11		0	
	Hoofdpuntennotitie Beleidsplan in Commissie	31-Mar-11		0	
	Concept uitwerking handhavindssystematiek	01-Feb-11	18-Mar-11	34	
	Concept uitwerking org inrichitng&werkprocessen	01-Feb-11	18-Mar-11	34	
	Concept Uitwerking samenwerking ts partijen op toez.&hh	01-Feb-11	18-Mar-11	34	
	Concept Uitwerking financiën	01-Feb-11	18-Mar-11	34	
	Aanpassen n.a.v. bestuurlijk traject	24-Mar-11	06-Apr-11	10	
	Concept beschikbaar tbv afstemming+draagvlak	07-Apr-11		0	
	Afstemming&draagvlak	22-Mar-11	23-May-11	45	
	Ambtelijk overleg / Handhavingsplatform	22-Mar-11	18-Apr-11	20	Kuné
	Taxibrancheoverleg	22-Mar-11	18-Apr-11	20	
	(commentaarronde) belanghebbendenoverleg	22-Mar-11	18-Apr-11	20	
	Verwerking commentaren	12-Apr-11	25-Apr-11	10	
	Directeurenoverleg	26-Apr-11	09-May-11	10	
	Bestuurlijk team	10-May-11	23-May-11	10	
	Definitief concept Beleidsplan	17-May-11	07-Jun-11	15	
	Verwerking afstemmingronde	17-May-11	06-Jun-11	15	Kuné
	Definitief concept beleidsdocument	07-Jun-11		0	
	Besluitvorming inkl inspraak	07-Jun-11	25-Jan-12	167	
	Staf Taxi	07-Jun-11	20-Jun-11	10	Kuné
	Driehoek + B&W	21-Jun-11	11-Jul-11	15	
	Vrijgave voor inspraak door B&W	12-Jul-11		0	
	Inspraakperiode	12-Jul-11	19-Sep-11	50	
	Verwerking inspraak / nota van beantwoording	20-Sep-11	31-Oct-11	30	
	Staf Taxi	08-Nov-11		0	
	B&W	22-Nov-11		0	
	(NB: = december Cie mbt Begroting 2012)	15-Dec-11*		0	
	Cie	19-Jan-12*		0	
	(NB:= december Raad mbt Begroting 2012)		21-Dec-11	0	
	Gemeenteraad		25-Jan-12	0	
	VASTEGESTELD TAXIBELEIDSPLAN		25-Jan-12	0	
	Detailuitwerkingsfase	12-Jul-11	30-Nov-11	102	
	DETAILUITWERKING: NADER UIT TE WERKEN	12-Jul-11	30-Nov-11	102	
	Implementatiefase	26-Jan-12	25-Jul-12	130	
	Nemen mandaatsbesluiten	26-Jan-12	29-Feb-12	25	BRANCHE
	Uitvoering draaiboek	26-Jan-12	25-Jul-12	130	BRANCHE
	A'damse verordening	01-Dec-10	22-Feb-12	321	
	Opstellen concept Verordening	01-Dec-10	19-Apr-11	100	BJZ
	Bestuurlijke vaststelling verordening Staf/BT/B&W	22-Nov-11*	02-Jan-12	30	
	Vaststelling verordening door Cie+Raad	26-Jan-12	22-Feb-12	20	

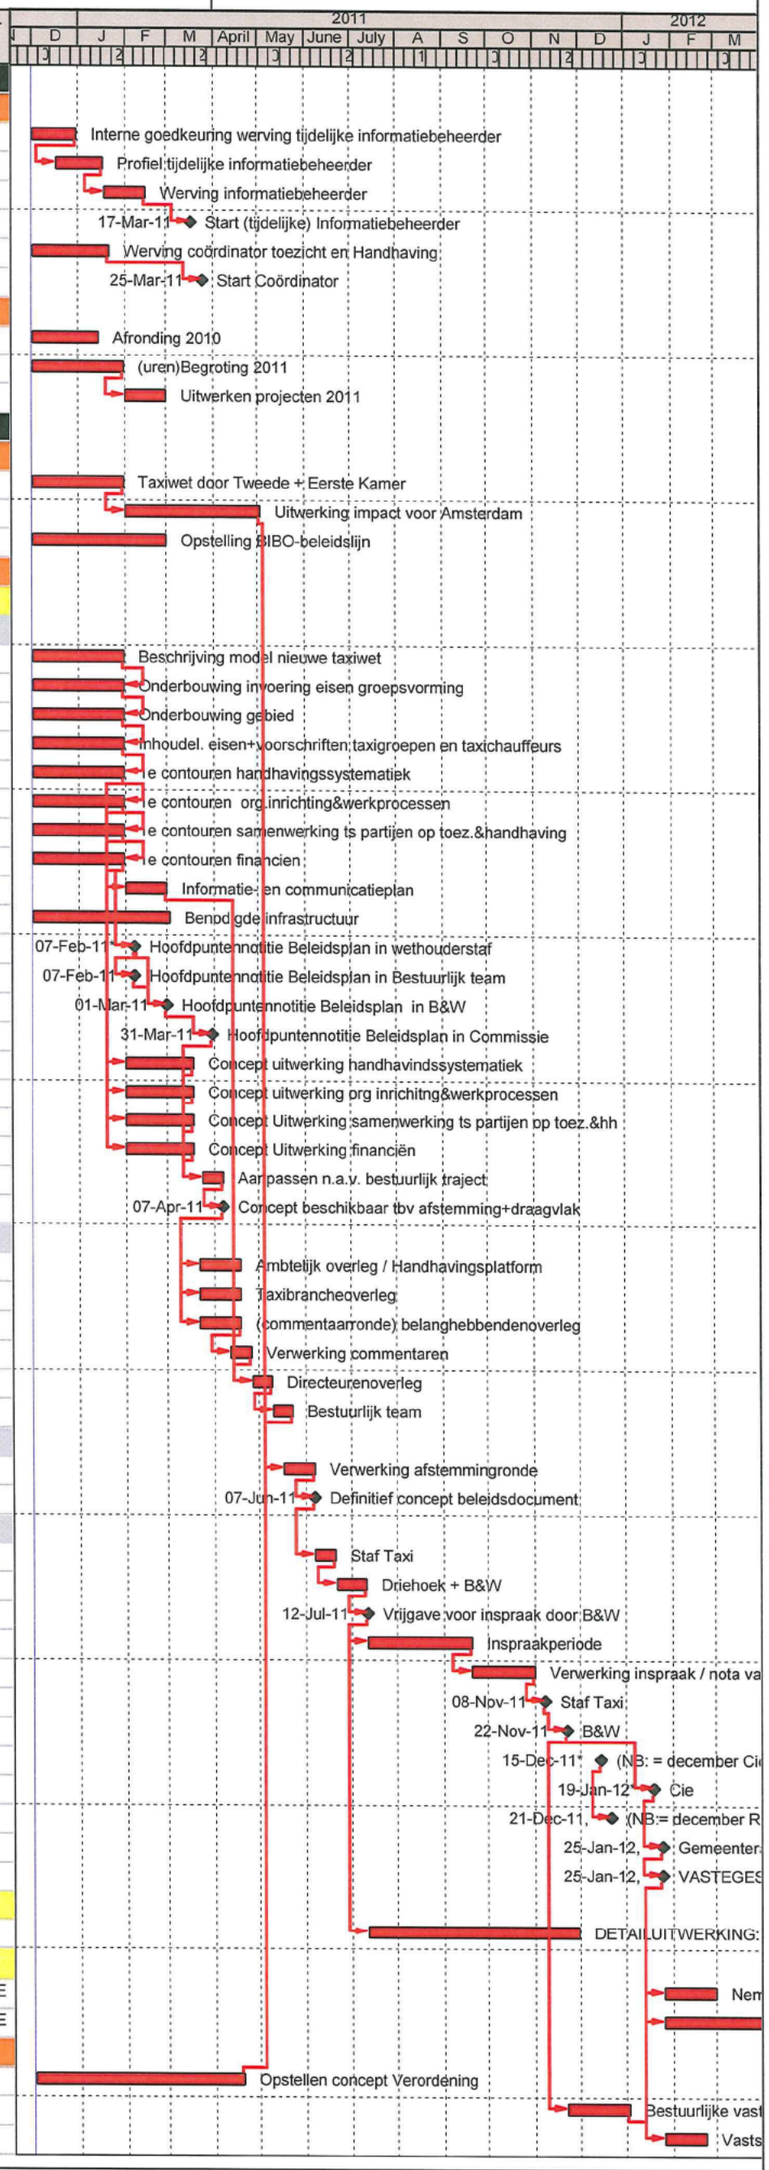

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer

Planning Cluster Taxi

concept dd 17-1-11

layout: Taxicluster

17-Jan-11 15:24

Activity ID	Activiteit	Start	Finish	Original Duration	Verantwo...
	Handhaving	01-Dec-10	01-Jul-11	152	
	Handhaving Algemeen	01-Dec-10	25-Apr-11	104	
	Opzetten standaardrapportages	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Maandrapportage Handhaving	01-Dec-10	28-Feb-11	64	v.Westing
	Kwartaalrapportage Handhaving	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Beleidaanscherpen RVB	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Top 30 overlastgevende chauffeurs	01-Dec-10	31-Mar-11	87	
	Uitv/begeleiden aanpak overlastgevende chauffeurs	01-Dec-10	31-Mar-11	87	v.Westing
	CCV	01-Dec-10	25-Apr-11	104	
	Opstellen nieuwe beleidslijn chauffeurs CCV-certificaat	01-Dec-10	14-Feb-11	54	Kuné
	Opzetten vergoedingenregeling chauffeurs	01-Dec-10	14-Feb-11	54	
	Informatie naar chauffeurs	15-Feb-11	28-Feb-11	10	
	Nieuwe beleidslijn in Staf + B&W	01-Mar-11	28-Mar-11	20	
	Nieuwe beleidslijn in Cie + Raad	29-Mar-11	25-Apr-11	20	
	DST	01-Dec-10	28-Feb-11	64	
	Afspraken stallen voertuigen	01-Dec-10	31-Jan-11	44	v.Westing
	Procesbeschrijvingen	01-Dec-10	31-Jan-11	44	
	Contracten aanpassen/opstellen	01-Feb-11	14-Feb-11	10	
	Besluitvorming contracten intern	15-Feb-11	28-Feb-11	10	
	Contracten definitief		28-Feb-11	0	
	Standplaats Centraal Station	01-Dec-10	21-Jun-11	144	
	Keet CS : regelen elctra, infozuil, c.a.	01-Dec-10	31-Jan-11	44	v.Westing
	Uitwerken Algemeen beheer	24-Jan-11*	28-Feb-11	26	
	Opzetten procedure "overlastgevende chauffeurs CS"	01-Mar-11	29-Apr-11	44	
	Facelift CS	01-Dec-10	01-Mar-11	64	
	Uitwerken voorstel	01-Dec-10	17-Jan-11	34	v.Westing
	Besluitvorming door Wethouder	18-Jan-11	31-Jan-11	10	
	Communceren naar stakeholders	01-Feb-11	28-Feb-11	20	
	Start uitvoering plan	01-Mar-11		0	
	Verplaatsing taxistandplaats naar noordzijde IJSEI	01-Mar-11	21-Jun-11	80	
	Uitwerking voorstellen????	01-Mar-11*	09-May-11	50	v.Westing
	Besluitvorming????	10-May-11	20-Jun-11	30	
	Start uitvoering plan ?????	21-Jun-11		0	
	Standplaats Leidseplein	01-Dec-10	01-Jul-11	152	
	Advisering verplaatsing	01-Dec-10	11-Mar-11	73	Witte
	PvE nieuwe taxistandplaats	01-Dec-10	31-Dec-10	23	
	Voordringprobleem	01-Dec-10	01-Jul-11	152	
	Onderzoek probleem	01-Dec-10	31-Mar-11	87	Mica
	Uitwerken voorstel	01-Dec-10	31-Mar-11	87	
	Besluitvorming	01-Apr-11	02-May-11	22	
	Vastgesteld voorstel		02-May-11	0	
	Start uitvoering plan	01-Jul-11		0	
	Informatiebeheer	01-Dec-10	02-Jan-12	283	
	Ontwikkeling Informatiemangement	01-Dec-10	02-Jan-12	283	
	Opstellen Plan van Aanpak	01-Dec-10	31-Jan-11	44	Mica
	Brainstorm kenniscentrum taxi	01-Dec-10	30-Dec-10	22	
	Besluitvorming opstarten project	03-Jan-11*	31-Mar-11	64	
	Ond. mogelijkheden samenwerking en informatiedelen	01-Apr-11	28-Apr-11	20	
	Opstellen PvE pakket informatiebeheer	29-Apr-11	26-May-11	20	
	Opstellen PvA	27-May-11	16-Jun-11	15	
	Uitwerking motivatie/onderbouwing aanschaf pakket	17-Jun-11	28-Jul-11	30	
	Besluitvorming via Staf / B&W / Raad (NB Zomerreces!!)	29-Jul-11	29-Sep-11	45	
	Uitvoering programma van eisen	30-Sep-11	30-Dec-11	66	
	Implementeren P v A (t/m overdr. vaste medewerker)	04-Nov-11	30-Dec-11	41	
	Opstellen futy informatiebeheerder	16-Sep-11	29-Sep-11	10	
	Werving vaste medewerker informatiebeheer	30-Sep-11	29-Dec-11	65	
	Opstart applicatie Taxi / start vaste medewerker	02-Jan-12		0	
	Communicatie	03-Jan-11	31-Oct-11	216	
	Organisatie Taxi-winterconferentie	17-Jan-11*	04-Mar-11	35	Papa
	Taxi-winterconferentie		10-Mar-11	0	
	Taxiflits februari		14-Feb-11*	0	
	Taxiflits juni		30-Jun-11*	0	
	Taxiflits oktober		31-Oct-11*	0	
	Ontwerp en porductie servicekaart	03-Jan-11*	21-Feb-11	36	
	Ingebruikname sevickaart		28-Feb-11	0	

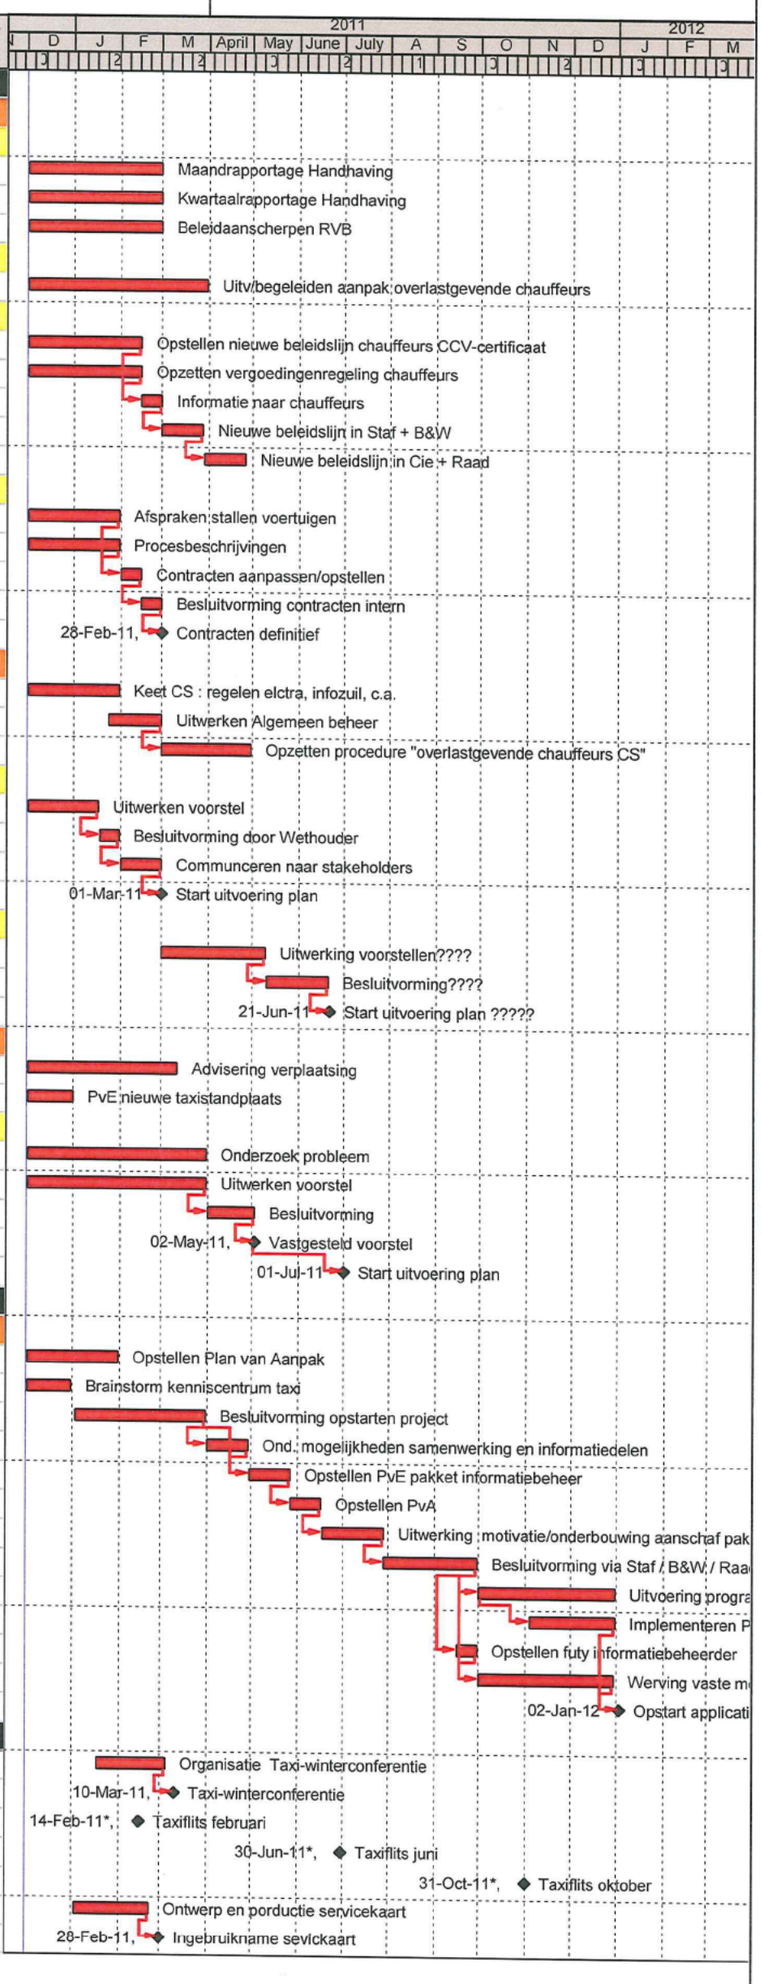

Actual Work
Remaining Work
Critical Remaining Work
Milestone

[redacted]

Gemeente Amsterdam
Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer
