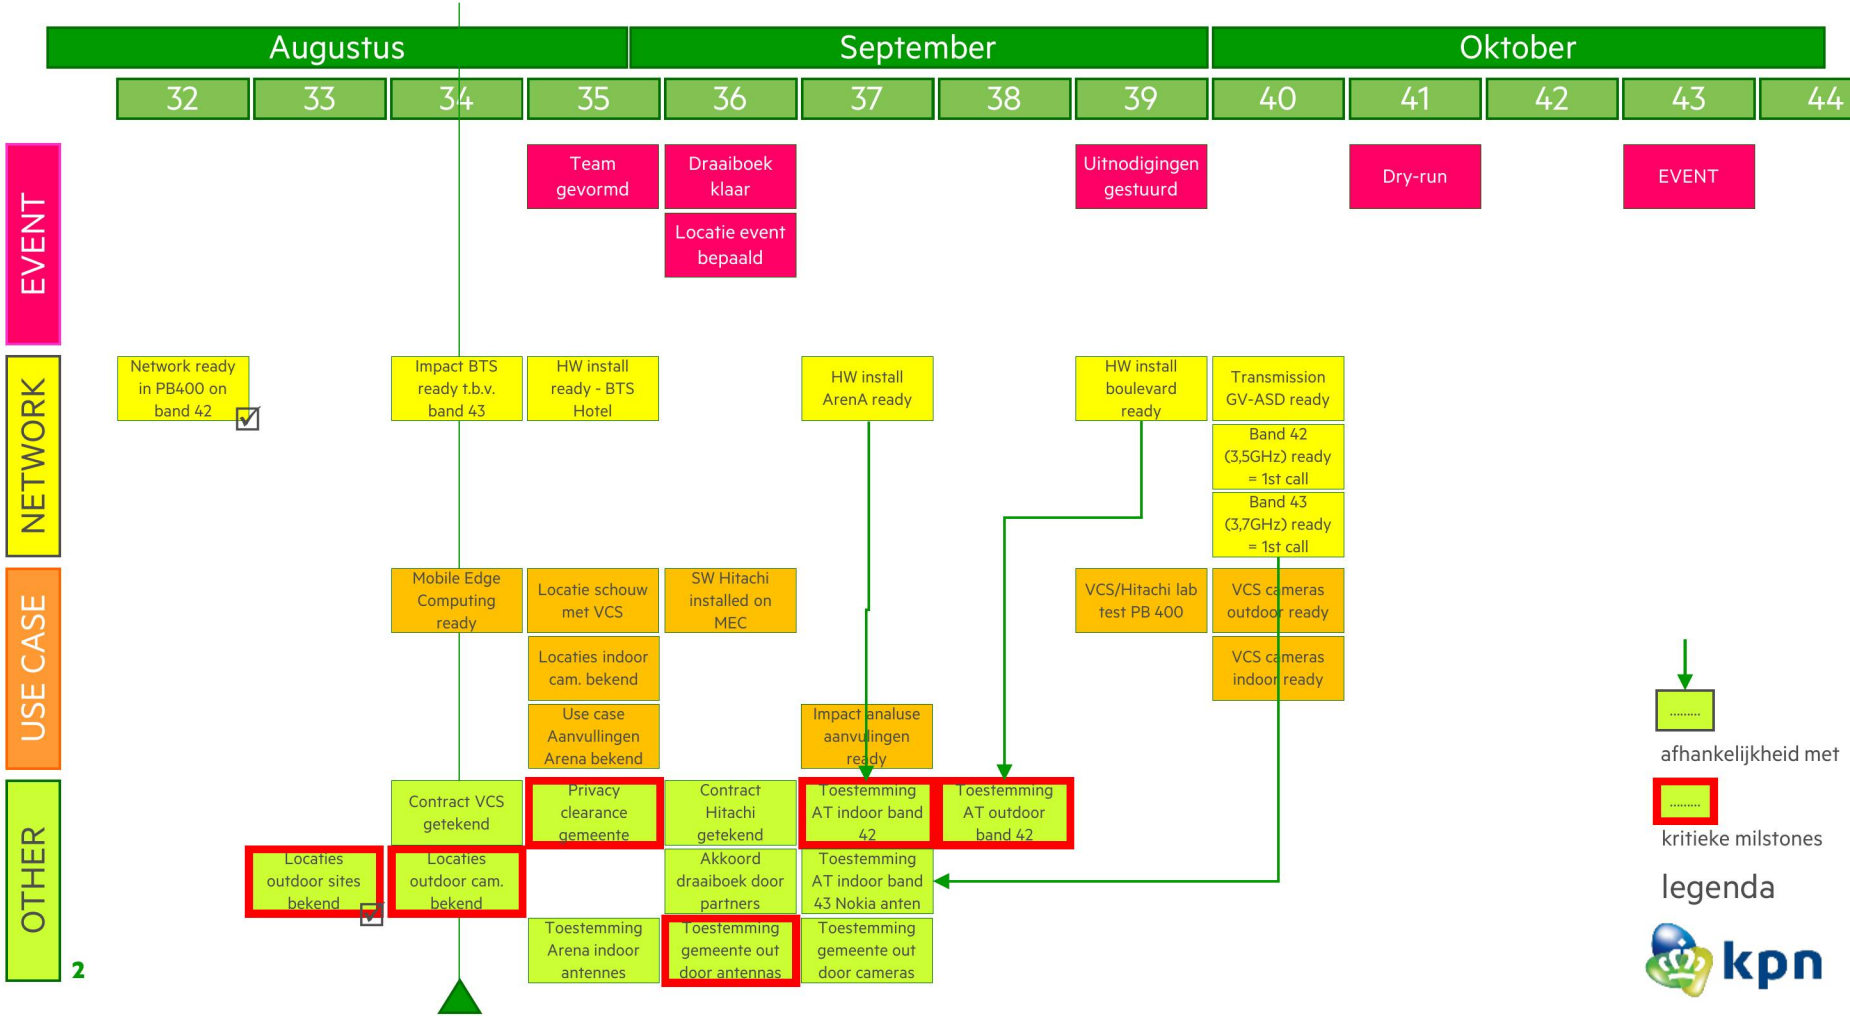
Planning Crowd Control

5G Field lab Amsterdam

August 2018


Augustus
September
Oktober
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
EVENT
NETWORK
USE CASE
OTHER
Team gevormd
Draaiboek klaar
Locatie event bepaald
Uitnodigingen gestuurd
Dry-run
EVENT
Network ready in PB400 on band 42
Impact BTS ready t.b.v. band 43
HW install ready - BTS Hotel
HW install ArenA ready
HW install boulevard ready
Transmission GV-ASD ready
Band 42 (3,5GHz) ready = 1st call
Band 43 (3,7GHz) ready = 1st call
Mobile Edge Computing ready
Locatie schouw met VCS
SW Hitachi installed on MEC
VCS/Hitachi lab test PB 400
VCS cameras outdoor ready
Locaties indoor cam. bekend
VCS cameras indoor ready
Use case Aanvullingen Arena bekend
Impact analuse aanvullingen ready
Contract VCS getekend
Privacy clearance gemeente
Contract Hitachi getekend
Toestemming AT indoor band 42
Toestemming AT outdoor band 42
Locaties outdoor sites bekend
Locaties outdoor cam. bekend
Akkoord draaiboek door partners
Toestemming AT indoor band 43 Nokia anten
Toestemming Arena indoor antennes
Toestemming gemeente out door antennas
Toestemming gemeente out door cameras
afhankelijkheid met
kritieke milstones
legenda
kpn
