Gemeente Amsterdam

Convenant voor werkwijze aanleg openbaar elektronische glasvezel-communicatienetwerken 'Fiber to the Home' gemeente Amsterdam, 24 mei 2023 .

Deze werkwijze vervangt de *Werkwijze aanleg glasvezelnetwerken binnen gemeente Amsterdam 7 oktober 2019*

ONDERGETEKENDEN:
- De publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Amsterdam, hierna te noemen 'de gemeente' te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Alexander Scholtes, daartoe aangewezen door de burgemeester van Amsterdam krachtens artikel 171 Gemeentewet, handelende ter uitvoering van het besluit ex artikel 160, eerste lid, onder d., Gemeentewet van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Amsterdam, hierna de noemen "de gemeente",
enerzijds, en
- KPN B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan de Wilhelminakade 123, 3072 AP te Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27124701, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Joost Steltenpool,
en
- Open Dutch Fiber B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende aan Kosterijland 50, 3981 AJ te Bunnik, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81920717, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Floris van den Broek en Mathijs van den Nieuwenhuijzen,

hierna de noemen de "telecomaanbieders",
anderzijds
de gemeente en de telecomaanbieders hierna gezamenlijk te noemen "partijen".

OVERWEGENDE DAT

FttH netwerken van belang zijn voor het maatschappelijk en economisch functioneren van de gemeente;
het voor alle Amsterdammers belangrijk is snel te worden aangesloten op de FttH netwerken en daarmee ook digitale ongelijkheid wordt weggenomen;
een efficiënte en effectieve uitrol van FttH netwerken waarbij ook de administratieve lasten en de (maatschappelijke) kosten beperkt blijven, daarom belangrijk is;
deze effectieve en efficiënte uitrol mogelijk wordt gemaakt door deze werkwijze en het daaraan verbonden uitrolschema;
Deze werkwijze nadrukkelijk niet in strijd is met de verordening en Nadere Regels WIOR 2021 (afstemmingsproces) en de bepalingen van de Telecommunicatiewet.

5.1.2,e

HEBBEN GEMEENTE EN GLASVEZELAANBIEDERS DE VOLGENDE AFSPRAKEN GEMAAKT

Artikel 1: Algemeen

A. De gemeente faciliteert de telecomaanbieders bij het doorlopen van het WIOR-proces.
B. De telecomaanbieders stemmen in met per kalenderjaar opgestelde uitrolschema's. De uitrolschema's zijn op basis van de Amsterdamse wijkverdeling waarbij de wijken in de stad worden verdeeld tussen de telecomaanbieders op basis van input telecomaanbieders. Zie bijlage 1 voor het uitrolschema 2023 en bijlage 2 voor de Amsterdamse wijkverdeling.
C. Het instemmingsbesluit wordt verleend per wijk. Ook de minder rendabele adressen binnen de wijk, worden door de houder van het instemmingsbesluit voorzien van glasvezel zodat alle inwoners en bedrijven van Amsterdam gebruik kunnen maken van betaalbare, snelle en betrouwbare dataverbindingen.
D. De aanleg geschiedt op basis van de BIS (Basis Infra Structuur) methodiek waarbij adressen waarvan eigenaar/bewoners aangeven aansluiting te wensen, direct worden aangesloten HAS (Huis Aan Sluitingen). Adressen waarbij eigenaar/bewoners op een later moment aangeven te willen worden aangesloten committeren telecomaanbieders zich om deze zo spoedig mogelijk aan te sluiten.
E. Huisaansluitingen die niet zijn gerealiseerd binnen de termijn van het per wijk verleende instemmingsbesluit van het uitrolschema, volgen het reguliere WIOR-proces, worden in VICTOR gemeld en qua impact beoordeeld volgens de criteria van de Nadere Regels WIOR (klein, middelgroot, groot) met dien verstande dat voor meerdere huisaansluitingen de verkorte procedure middelgrote vergunning wordt gevolgd waarbij niet wordt geconsulteerd, geen tracé akkoord wordt verlangd en kan worden volstaan met een summier BLVC (intakeformulier).
F. Telecomaanbieders zorgen voor zo min mogelijk hinder door werkzaamheden (tegengaan verminderde bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid).
G. Ter voorkoming van oponthoud door onrust in de omgeving over nieuwe Point of Presence (PoP) gebouwtjes communiceert de telecomaanbieder met de omgeving over zowel de inpassing in de openbare ruimte als de uitvoering van de werkzaamheden. De gemeente ondersteunt dit door te adviseren op de communicatie brieven en adressen die geïnformeerd dienen te worden.
H. Bovengrondse voorzieningen (kasten en PoP's) moeten zo min mogelijk beslag leggen op de openbare ruimte (inpandig, medegebruik, (half)verdiept) en als zij toch in de openbare ruimte moeten worden geplaatst dit niet mag leiden tot vermindering van de kwaliteit en gebruik van de openbare ruimte. De gemeente ondersteunt het zoeken naar een juiste locatie en vormgeving.
I. Het maaiveld wordt na afloop van de werkzaamheden door de telecomaanbieder zelf minimaal in oude staat hersteld en er is een garantieperiode van één jaar op het herstelde maaiveld. Bij tweede aanleg, herstraat de tweede telecomaanbieder en geldt hiervoor een nieuwe garantieperiode van één jaar.
J. Specifieke civieltechnische werkzaamheden zoals boringen worden zoveel mogelijk gezamenlijk na overleg uitgevoerd. Boring locaties van telecomaanbieders worden in het operationeel overleg gedeeld.
K. In het stadsdeel Centrum, leggen de telecomaanbieders de FttH netwerken gezamenlijk aan. Zie bijlage 3 demarcatie stadsdeel Centrum
L. Het Amsterdamse credo 'werk met werk maken' zal op redelijke gronden (artikel 7 WIOR) bij de aanleg van glasvezel met betrekking tot gecombineerd uitvoeren met nutswerkzaamheden, vaak niet mogelijk zijn.
M. Bij problemen met andere belanghebbenden (nutsbedrijven, coöperaties etc.) bemiddelt de gemeente (Nadere regels WIOR).



Artikel 2. Overleg

A. De telecomaanbieders voeren tweemaandelijks op strategisch managementniveau overleg met de gemeente over de voortgang van de uitrol. Op verzoek van een van de partijen kan eerder overleg worden ingelast.
B. De partijen wijzen contactpersonen aan voor zowel de operationele (locatiebepaling bovengrondse voorzieningen, knelpunten over de kwaliteit van uitvoering, de wijze van herstel etc.) als de beleidsmatige ondersteuning (het coördinatie en regieproces (WIOR), van de uitrol. Via deze contactpersonen vinden ook de escalaties plaats.
C. Escalatie vindt plaats in het tweemaandelijks strategisch managementoverleg
D. Partijen overleggen tweewekelijks op tactisch-operationeel niveau.
E. De gemeente regisseert de gezamenlijke uitrol in stadsdeel Centrum of bij conflicten waar men kort achter elkaar werkzaamheden uitvoert.

Artikel 3: Programmering

A. De telecomaanbieders leveren hun (lange termijn) plannen in bij de gemeente (Stadsregie van de gemeente Amsterdam) op basis van de wijkinrichting van de gemeente. Stadsregie behandelt de plannen vertrouwelijk.
B. De gemeente maakt op basis van input telecomaanbieder de programmering van aanleg uitrol glasvezel FttH per wijk (uitrolschema). Dit wordt per kalenderjaar opgesteld en openbaar gemaakt.
C. Eventuele afwijkingen van de einddatum instemmingsbesluit door onvoorziene omstandigheden of overmacht worden besproken in het twee-maanden strategisch managementoverleg en leiden niet automatisch tot aanpassing van het uitrolschema, eventueel kan door onvoorziene omstandigheden of overmacht in uiterste geval het instemmingsbesluit worden verlengd. Afwijkingen moeten zo vroeg mogelijk schriftelijk (mail) aan Stadsregie gemeld worden.
D. In het tweemaandelijks strategisch managementoverleg wordt de 'overlap' van plannen besproken en komen de mogelijkheden van samenwerking en afstemming aan de orde.
E. In overleg wordt de programmering opgesteld en aan de plannen een bindend tijdslot verbonden wat wordt overgenomen in het instemmingbesluit.
F. Telecomaanbieders melden hun werkzaamheden in VICTOR aan op basis van de opgestelde uitrol schema's.
G. Na het verstrijken van de einddatum van het afgeven instemmingsbesluit hanteert de gemeente ter voorkoming van (maatschappelijke) schade een reële periode van graafrust van minimaal een jaar na afronding van de eerdere werkzaamheden. Tenzij gezamenlijk anders overeengekomen.
H. Zodra de telecomaanbieder de interne voorbereiding voor de betreffende wijken op orde heeft conform dit convenant, wordt het initiatief aangemeld in VICTOR en wordt het reguliere WIOR-proces doorlopen.
I. De aanmeldingen in VICTOR vinden plaats per wijk. Aanmeldingen die reeds zijn gedaan vallen hier niet onder.

Artikel 4: Instemmingsbesluit

A. Voor de aanleg wordt per aanleggende telecomaanbieder één instemmingsbesluit per wijk genomen.

5.1.2,e

Artikel 5: Communicatie

A. Na intern akkoord binnen de gemeente over de locatie en vormgeving van PoP-gebouwtjes communiceren de telecomaanbieders nog vóór het Tracé-akkoord (verordening WIOR artikel 1 onder S) met de belanghebbenden in het gebied over de plaatsing van de bovengrondse voorzieningen. Het DB (de portefeuillehouder) van het betreffende stadsdeel moet hiermee instemmen.
B. Naar aanleiding van de reactie uit de buurt kan de gemeente samen met de telecomaanbieder binnen de technische grenzen besluiten tot een alternatieve locatie of vormgeving.
C. Op basis van de uitkomst van de communicatie neemt het DB van het betreffende stadsdeel (de portefeuillehouder) een definitief besluit.
D. Over de daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden communiceren de telecomaanbieder volgens het door de gemeente vastgestelde BLVC-plan (verordening WIOR artikel 1 onder T)

Artikel 6: Uitvoering & herstel maaiveld

A. Na afloop van de werkzaamheden herstellen de glasvezelaanbieders het maaiveld (de straat, berm etc.).
B. Huisaansluitingen die niet zijn gerealiseerd binnen de termijn van het per wijk verleende instemmingsbesluit van het uitrolschema, volgen het reguliere WIOR-proces, worden in VICTOR gemeld en qua impact beoordeeld volgens de criteria van de Nadere Regels WIOR (klein, middelgroot, groot) met dien verstande dat voor meerdere huisaansluitingen de verkorte procedure middelgrote vergunning wordt gevolgd waarbij niet wordt geconsulteerd, geen tracé akkoord wordt verlangd en kan worden volstaan met een summier BLVC (intakeformulier).
C. Asfalt en sierbestrating als hardsteen worden na overleg met de gemeente in principe hersteld door de telecomaanbieder.
D. De straat is 's avonds altijd hersteld en goed en veilig begaanbaar, de afzettingen zijn verwijderd.
E. Als het voor snelle uitvoer van werkzaamheden nodig is, kan na expliciete goedkeuring toezichthouder gekozen worden om de straat één nacht 'open' te laten liggen.
F. De telecomaanbieders zullen op basis van nacalculatie van opgebroken bestrating de degeneratie- en beheerkosten vergoeden aan de gemeente op basis van de jaarlijks in het Strategisch Overleg Coördinatiestelsel vastgestelde Amsterdamse herstraattarieven.
G. De telecomaanbieders zetten een kwaliteits- en toezichtsysteem op en verzorgen het toezicht op de werkzaamheden van hun aannemers en maakt voor de gemeente inzichtelijk hoe de kwaliteit van straatwerk geborgd is (inclusief verdichtingsproeven). Telecomaanbieders investeren in extra (externe) toezichthouders. Dit systeem bevat ook een adequate opschalingsprocedure in geval de gemeentelijke toezichthouders constateren dat in afwijking van de regels is gewerkt.
H. Het te herstellen maaiveld wordt voor, tijdens en na de werkzaamheden vastgelegd door de aannemer in overleg met de HOOR-coördinator.
I. De telecomaanbieders hebben een onderhoudstermijn van één jaar voor het herstelde maaiveld (bestrating en groen).
J. Indien sprake is van ernstige verzakking van het herstelde maaiveld (bij een kwaliteitsdaling naar of onder CROW D dan herstellen de telecomaanbieders dit zo spoedig mogelijk. Als de reparatie niet binnen 7 werkdagen wordt uitgevoerd, dan herstelt de gemeente op kosten van de telecomaanbieder het maaiveld.

5.1.2,e

K. Zowel na 6 maanden als na 12 maanden controleert de FttH aanlegger de kwaliteit van het straatwerk en koppelt zijn bevindingen terug aan de HOOR-coördinator zodat onvolkomenheden alsnog door de telecomaanbieders kunnen worden hersteld.
L. Werk van de telecomaanbieders op privéterreinen (bv. voortuinen bewoners) worden door de telecomaanbieders georganiseerd in samenwerking met de bewoners en eigenaren. De gemeente is hierin geen partij.
M. De telecomaanbieders nemen toezichthouder(s) in dienst die toezicht houden op de werkzaamheden van haar aannemer zodat de kabels en (bovengrondse) voorzieningen op de afgesproken locatie worden aangelegd, de werkzaamheden volgens het BLVC-plan en andere vigerende wetgeving worden uitgevoerd.
N. De toezichthouders van de telecomaanbieders zijn aanspreekpunt voor de toezichthouders van de gemeente Amsterdam.
O. Afwijking van het instemmingsbesluit (voorschriften, data, etc.) kan alleen in overleg met de gemeente (team ondergrond, Stadsdeelregisseur).
P. Stolpersteine, het messing steentje waarop de gegevens van een slachtoffer van het nationaal-socialisme tijdens de Tweede Wereldoorlog staan en dat is aangebracht voor de woning van het slachtoffer, worden ruim vóór aanvang van de werkzaamheden gemeld bij de betreffende HOOR-coördinator waarna in samenspraak het correct verwijderen en terugplaatsen van de Stolpersteine wordt geregeld.

Artikel 7 Toetreding, wijziging en uittreding.

A. Indien in de toekomst andere telecomaanbieders concrete plannen hebben om in Amsterdam glasvezel uit te rollen, worden zij door de gemeente gestimuleerd om deel te nemen aan dit convenant en kunnen zij tot deze overeenkomst toetreden.
B. Voor toetreding tot dit convenant is instemming van de gemeente noodzakelijk, waarbij de gemeente de instemming en de toetreding schriftelijk meldt bij de overige deelnemende partijen.
C. Voor wijziging van dit convenant is instemming van alle deelnemende partijen noodzakelijk.
D. Een deelnemende partij kan de deelname aan dit convenant beëindigen door hiervan schriftelijk en aangetekend mededeling te doen aan de overige deelnemende partijen.

Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend op 12 juli 2023
Gemeente Amsterdam, het college van burgemeester en wethouders,
namens dezen,

de wethouder ICT en digitale stad

5.1.2,e

Alexander Scholtes

5.1.2,e

KPN B.V.
namens deze,

5.1.2,e

Joost Steltenpool
Executive Vicepresident KPN Netwerk

Open Dutch Fiber B.V.
namens deze,

5.1.2,e

Floris van de Broek, CEO

Open Dutch Fiber B.V.
namens deze,

Mathijs van den Nieuwenhuijzen , CFO

Bijlage 1: Uitrolschema's 2023 ODF & KPN

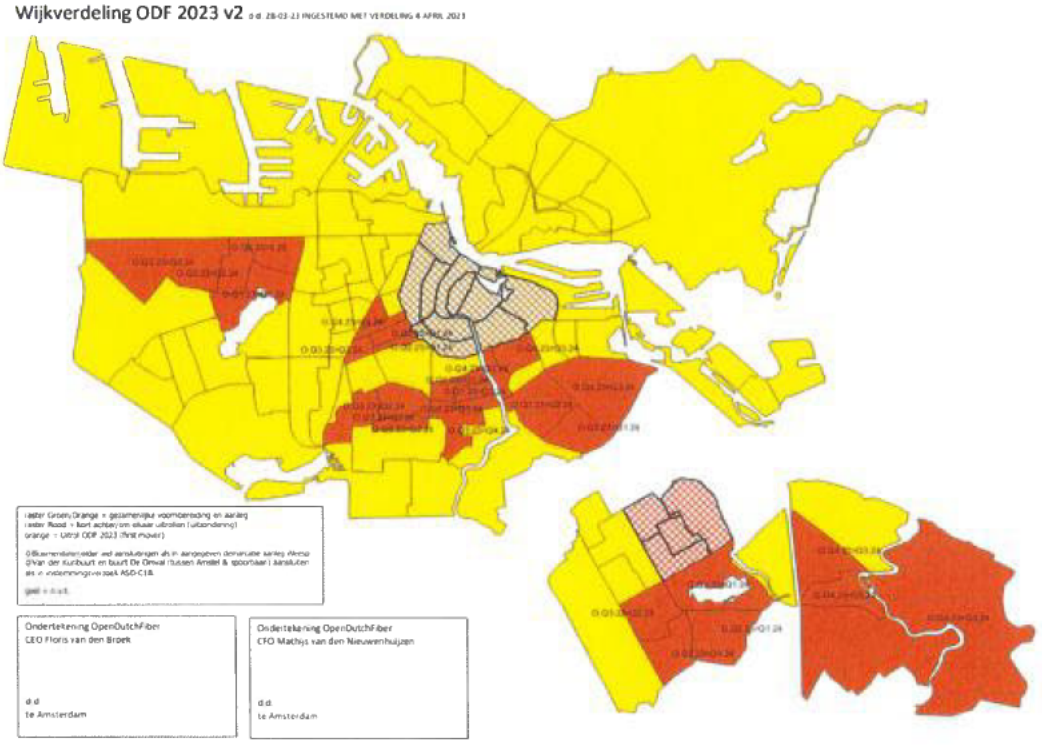

5.1.2,e

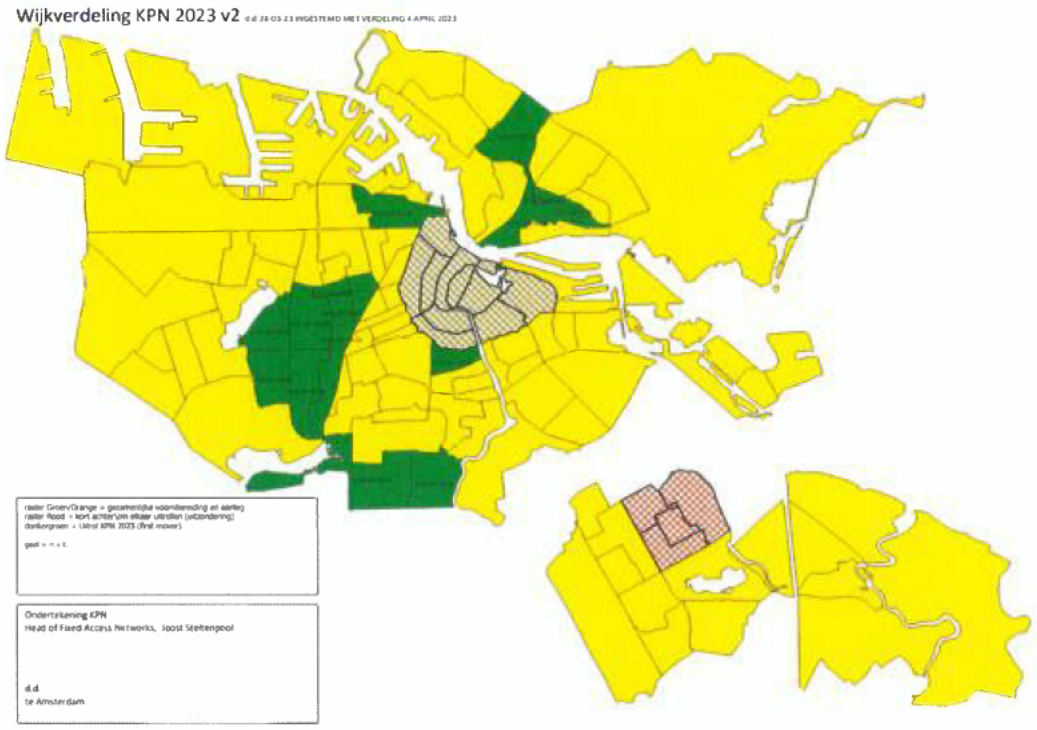

Bijlage 2: Gehanteerde Amsterdamse wijkverdeling

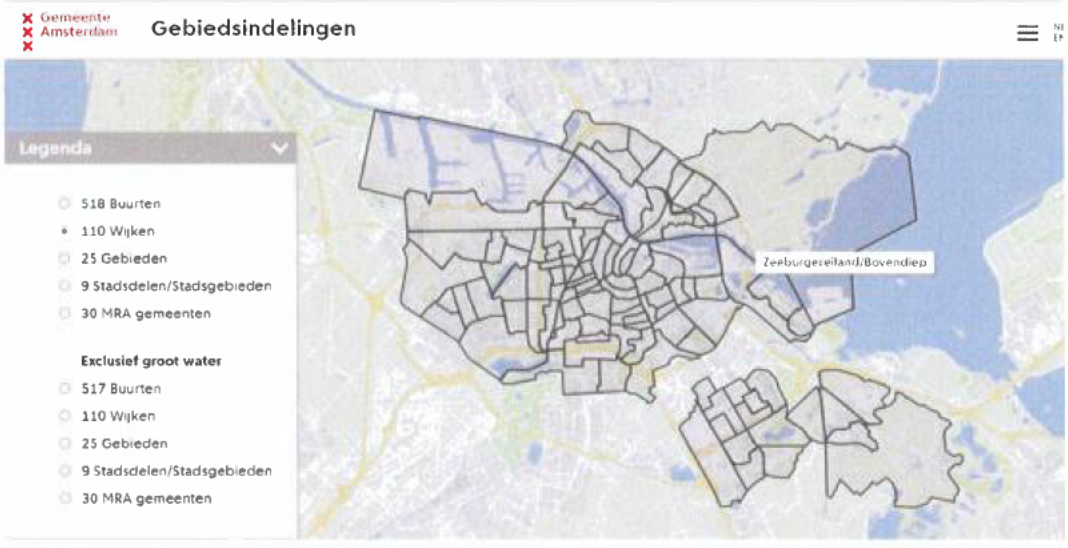

Bijlage 3: Demarcatie stadsdeel Centrum



5.1.2,e
