GGD
Amsterdam

Doorstart ademtest – update Regiegroep Corona

11 maart 2021

Dit rapport is uitsluitend bestemd voor gebruik door de cliënt. Niets uit dit rapport mag worden verspreid, geciteerd of gereproduceerd voor distributie buiten de eigen organisatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gupta Strategists. Dit materiaal werd gebruikt door Gupta Strategists tijdens een mondelinge presentatie, en is niet het volledige verslag van de gevoerde discussie.

Agenda

CONCEPT

Planning

Bijlage

Voorstel is 26 maart starten met dubbeldraaien op Noord en vervolgens wekelijks doorstart op een nieuwe locatie

CONCEPT

Globale planning Doorstart Ademtest
[NB optimistisch scenario wanneer elke evaluatie succesvol is[1]]

Planning ligt nu bij Breathomix en GGD GHOR NL met vraag of dit haalbaar is

Voorbereiding | Training | Intensief monitoren (100% dubbeldraaien) | Evaluatie | Reguliere operatie

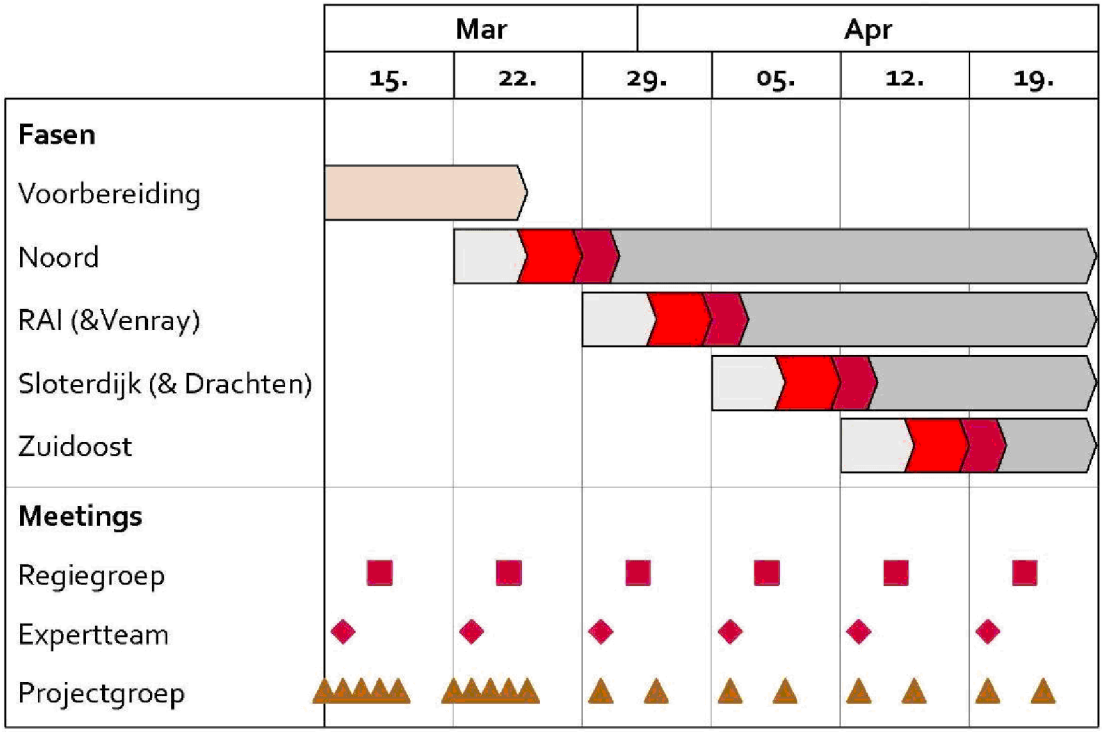

Starten voor 26 maart lijkt niet haalbaar

- Voldoen aan externe randvoorwaarden om Doorstart te kunnen beginnen kost tijd (zie slide 4)
- Breathomix heeft beperkte tijd voor overleg, stukken aanscherpen, etc.
- Team Corona kan op zijn vroegst over twee weken voldoende afnemers beschikbaar maken

1) Wanneer de vooraf gestelde doelstelling m.b.t. het aantal vals-negatieven wordt behaald. Indien dit niet het geval is worden er nieuwe maatregelen ingezet en gaat het dubbeldraaien door. Opvolgende activiteiten worden dan ook uitgesteld.

Komende twee weken staan in het teken van voorbereiding en training

CONCEPT

Planning komende twee weken Doorstart Ademtest

Voorbereiding Training Intensief monitoren (100% dubbeldraaien)

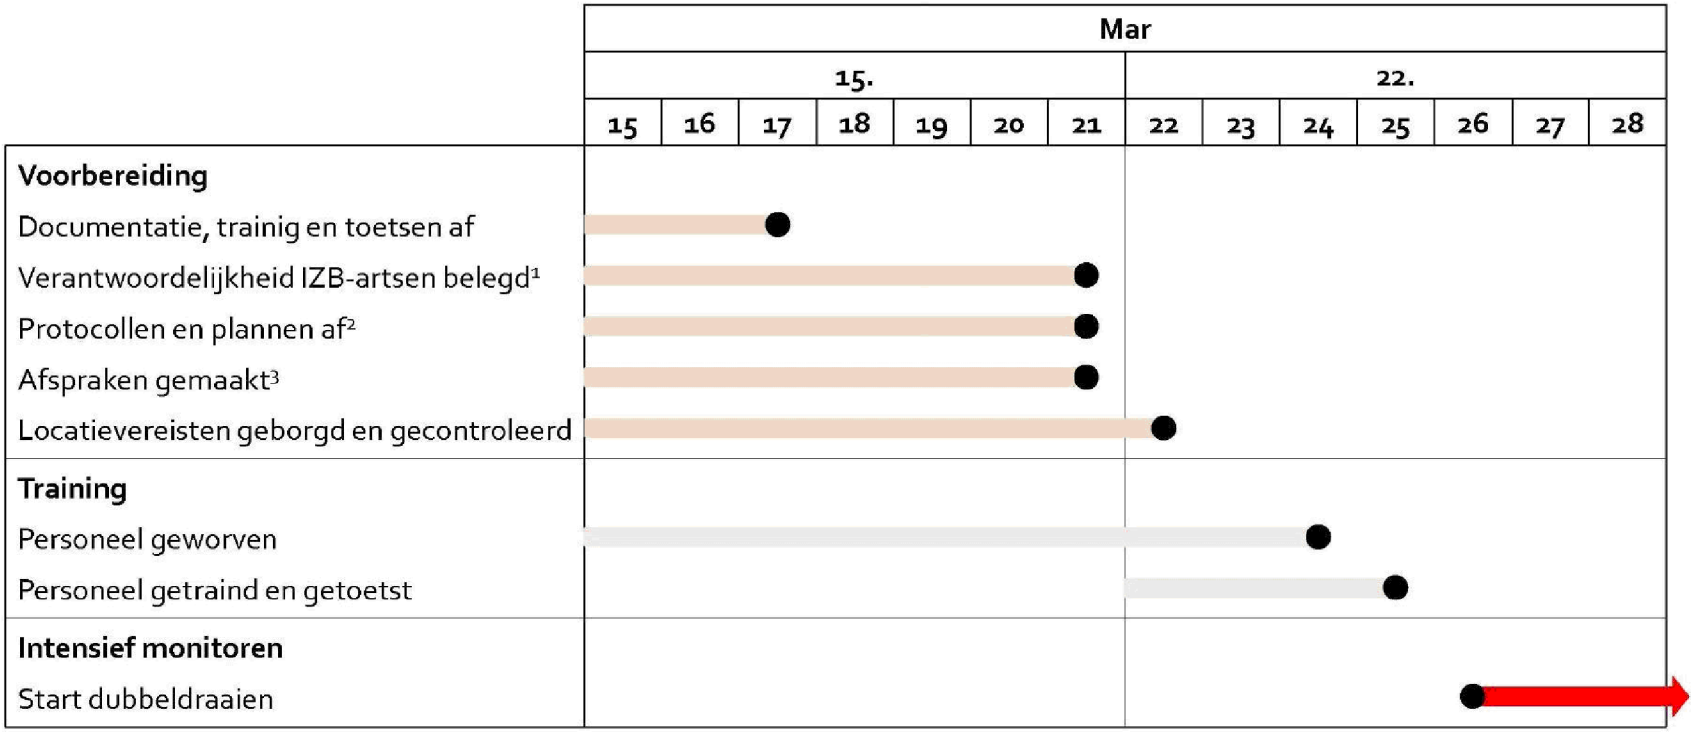

1) Op basis van bovenstaande documentatie, training en toetsen.
2) Onder andere voor: communicatie met de cliënt, rollen en verantwoordelijkheden op de teststraat, dubbeldraaien, back-up plan ICT, etc.
er andere over: communicatie naar buiten, rapportagevorm, etc.

Beleggen eindverantwoordelijkheid, 'go' van IGJ en duidelijkheid over kaders dubbeldraaien nodig om Doorstart te kunnen beginnen

CONCEPT

Externe randvoorwaarden bij Doorstart Ademtest
[belangrijkst; niet uitputtend]

Beleggen medische eindverant-woordleijkheid	• IZB-artsen krijgen eindverantwoordelijkheid over afnameproces en interpretatie uitslagen[1]; goed meenemen van artsen in stukken en proces kost tijd[2] • Deel stukken (intepretatiedocumenten, trainingen, etc.) is nog niet voldoende bevonden en vraagt aanscherping van Breathomix (en input GGD GHOR NL)
Verkrijgen 'go' van van IGJ	• IGJ vereist contract tussen Dienst Testen & Breathomix voor reguliere inzet • Contract bevat ook medische verantwoordelijkheid: dus afhankelijk van bovenstaand punt
Duidelijkheid succes en omvang dubbeldraaien	• Projectgroep heeft landelijk Expertteam gevraagd te adviseren over benodigd aantal samples dubbeldraaien en acceptabele 'cumulatieve senstiviteit'[3] • Expertgroep heeft doorgezet naar OMT, waardoor kaders onduidelijk zijn

1) Hiermee legt Breathomix meer verantwoordelijkheid bij de artsen dan voor de doorstart het geval was.
2) Dit gebeurt in eerste instantie met een kernteam van artsen van de GGD's betrokken bij de uitrol, vervolgens worden deze uitkomsten gedeeld in het LOI.
3) apparaat + afnameproces.

11580007 0001
