00963

Gemeente Amsterdam

IMPLEMENTATIE UITGIFTE EN ERFPACHT
Planning op hoofdlijnen

Status concept vs 2 december, bijeenkomst 10 nov 2015
[redacted]

1 okt 2015 — 1 jul 2016

1-12 BT Alle stukken Klaar AB + Aanv.
16-12 BT AB vrijgave belastingdienst
12-1 B&W Akkoord Methode GWC
10-2 Raad Akkoord Methode GWC
23-2 B&W Vrijgave AB + Aanv. beleid
27-4 BT ? Akkoord AB + Vrijgave overstap
17-5 B&W Akkoord AB en aanv. Beleid + Vrijgave overstap
27-5 Aanleveren
22-6 RAADSBESLUIT AB + AANVULLEND BELEID
15-6 CIE

kerst | 21-1 BT | 11-2 BT | krokus | 10-3 BT | mei | mei

1-11 | 1-12 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6

AB + AANV.: AFRONDEN BELEIDSTUKKEN INCL. REDACTIE EN TOETS
AB: VOORBEREIDEN INSPRAAK incl akkoord BT
AB+ AANV.: INSPRAAK & VERWERKING
BESLUITVORMING AB + AANV + GRONDPRIJZENBRIEF
AB: TOETS BELASTINGDIENST

AB + AANVULLEND BELEID + GRONDPBRIEF

CONCEPT BELEID *WS beleid*
Impl. Paragraaf vrijgave beleid
Impl. Paragraaf vrijgave beleid
Akkoord MOI

PLANNING AANPASSEN WERKINSTRUCTIES EN BRIEVEN OP HOOFDLIJNEN

Werk instructies: Verbetertraject sinds 2013
verbetertraject
Analyseren werkprocessen: wat wijzigt?
Overzicht wijzigingen werkprocessen
Verwolg verbetertraject + aanpassen werkprocessen nav AB 2016
Vernieuwde werkinstructies klaar
Akkoord MOI
Redactie, toets JZ en communicatie
Akkoord MT
Werk instructies klaar
START Onderhandelingen met nieuwe AB
Standaard brieven
Sessie: verschillen in werkinstructies i.s.m. afdeling uitgifte en advisering GPB incl. ICT en administratie
Start
Aanpassen brieven (joe lang?)
Brieven uitgifte AB2016 proef
Akkoord MOI
Redactie, toets JZ en communicatie
Akkoord MOI
Standaard brieven klaar

ICT-OPGAVE

(10)(2e)
Inventarisatie huidige systemen
Analyseren ICT en middelen: wat wijzigt?
Impact Analyse Op hoofdlijnen
keuze
Raming kosten, driptijd op hoofdlijnen
Akkoord begroting MOI
Inventarisatie wijzigingen (detail) Selectie ontwikkelaar
Start uitvoering
UITVOERING ONTWIKKELJAAR MIN 6 wkn (uitsplitsen per module)
einde uitvoering
Start testen
TESTEN 6 wkn
ICT systemen klaar

Pleister plakken of definitieve wijzigingen

TRAINING EN COMMUNICATIE

Training (10)(2e)
Communicatie intern en extern (10)(2e)

Onderzoek doelen en doelgroepen
inventarisatie training middelen
Onderzoek (dynamische) middelen
Grove raming
Grove raming
Voorstel hoe te zorgen dat Instructies gebruikt worden
Voorstel gebruik instructies
voorbereiden informatiebijeenkomsten
start
Informatiebijeenkomsten 'zoek de verschillen'
middelen voor diverse doelgroepen
Bijlage voor erfpachter *)
*) met communicatieve uitleg over stelsel en afkoop

PROCESBEHEERSING

toetsing beleid op uitvoerbaarheid (10)(2e)
risicomanagement (10)(2e)
Begroting en capaciteit (10)(2e)

begin nov Inhouds-Opgave
Analyseren uitvoerbaar-heid
Overige Toetsitems?
Uitvoeren RA
Rapport RA
Doorlopend monitoren beheersmaatregelen
Uitvoeren RA op beheer
Rapport RA beheer
Inschattingen bemensing (ICT/opleiding/instructies/communicatie)
Begroting op hoofdlijnen
Akkoord begroting MOI
Doorlopend monitoren en bijsturen begroting
Begroting gedetailleerd

TRAINING ON THE JOB

1-10 | 1-11 | 1-12 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7

76766

00963

Gemeente Amsterdam

IMPLEMENTATIE UITGIFTE EN ERFPACHT
Planning per beleidsonderdeel

Status concept vs 2 december, bijeenkomst 10 nov 2015
[redacted]

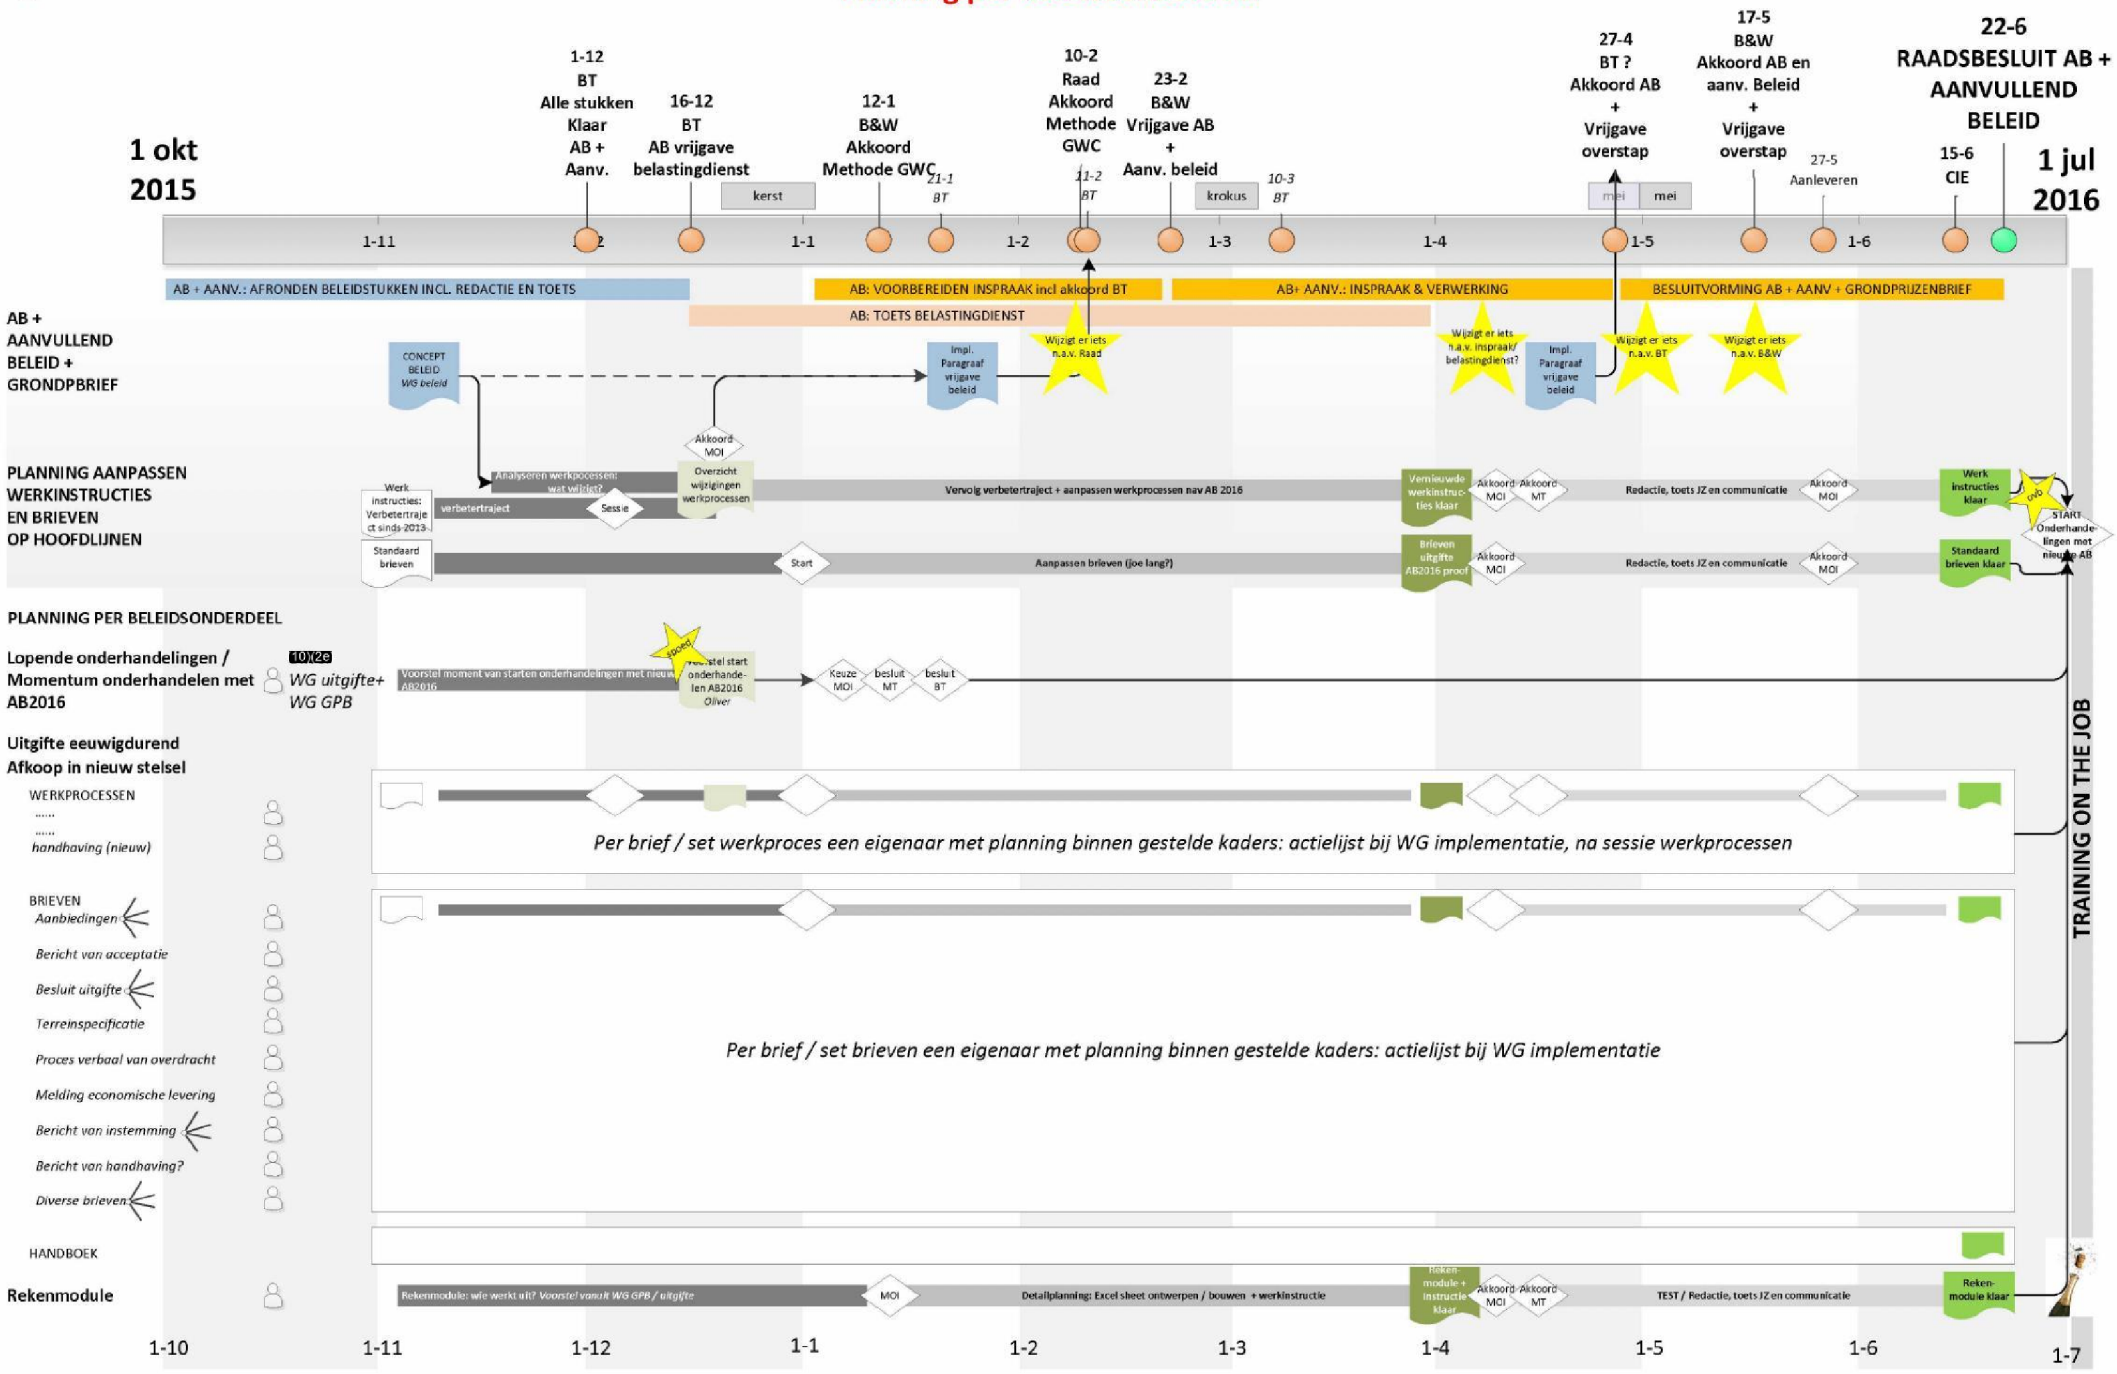

76766
