
Andreas Bonnstraat bouwdeel A (CONCECPT)

2-5-2025 | Eigenhaard / ELK | JB | elk®

Regel	Omschrijving	Duur	Start	Eind
	(Geen)			
	Planning bouwdeel A			
1	**Huurders**	**184,0d**	**13-1-2025**	**31-10-2025**
2	1e bewonersavond Bouwdeel A	5,0d	13-1-2025	17-1-2025
3	Feed back bewoners vertegenwoordiger / commissie??	10,0d	20-1-2025	31-1-2025
4	(Bewoners) Plan overleg EH / ELK	55,0d	27-1-2025	11-4-2025
5	**(Bewoners) Eerste conceptplan opstellen**	13,0d	14-4-2025	2-5-2025
6	Opname + scan bestaande constructie	5,0d	24-2-2025	28-2-2025
7	Oprichting bewoners commissie	25,0d	3-2-2025	7-3-2025
8	2e bewonersavond (bevindingen opname en conceptplan)	1,0d	12-5-2025	12-5-2025
9	Terugkoppeling bewoners commissie	9,0d	13-5-2025	23-5-2025
10	Verder uitwerken hoofdstructuur (schachten, m.k., constructie)	19,0d	26-5-2025	24-6-2025
11	3e bewoners avond (indelen plattegronden)	15,0d	30-6-2025	18-7-2025
12	Terugkoppeling bewoners commissie	20,0d	18-8-2025	12-9-2025
13	(Bewoners) Plan definitief maken	32,0d	18-8-2025	30-9-2025
14	4e bewonersavond (presenteren definitief plan + plattegronden)	23,0d	1-10-2025	31-10-2025
15	PEILDATUM aanvragen stadsvernieuwing	5,0d	15-9-2025	19-9-2025
16	Afgifte peildatum	2,0d	27-10-2025	27-10-2026
17	**Draagvlak meeting**	**10,0d**	**17-11-2025**	**28-11-2025**
18	Getekende akkoordverklaring	1,0d	15-12-2025	15-12-2025
19	Begeleiden en herhuisvesten van bewoners	256,0d	1-10-2025	30-10-2026
20	aanbieden wisselwoning	80,0d	15-6-2026	30-10-2026
21	verhuizen en leeg opleveren woning	20,0d	5-10-2026	30-10-2026
22	Sleutels BOG	5,0d	5-10-2026	9-10-2026
23	Sleutels woningen	5,0d	2-11-2026	6-11-2026
24	Start bouw	5,0d	2-11-2026	6-11-2026
25	**Ontwerpteam**	**457,0d**	**11-11-2024**	**6-11-2026**
26	Contact stedenbouwkundige / welstand	50,0d	11-11-2024	31-1-2025
27	Offerte + opdrachtverstrekking architect + constructeur	30,0d	11-11-2024	20-12-2024
28	Uitwerken bestaande constructie	15,0d	10-3-2025	28-3-2025
29	VO fase bouwkundig	20,0d	31-3-2025	29-4-2025
30	VO fase constructief	17,0d	30-4-2025	23-5-2025
31	Spiegelen concept plan aan kosten raming	40,0d	30-4-2025	30-6-2025
32	Indiening welstand	40,0d	1-7-2025	22-9-2025
33	Indiening ontwerp besluit	1,0d	1-7-2025	1-7-2025
34	Termijn ontwerp besluit	24,0d	1-7-2025	29-8-2025
35	Contracteren ketenpartners (installatie + casco)	20,0d	1-9-2025	26-9-2025
36	Advies installaties	20,0d	30-4-2025	28-5-2025
37	Advies bouwfysica (bouwfysische maatregelen)	40,0d	29-9-2025	21-11-2025
38	NUTS bespreking	40,0d	31-3-2025	28-5-2025
39	**DO fase bouwkundig**	42,0d	1-9-2025	20-11-2025
40	DO fase constructief	25,0d	15-9-2025	30-10-2025
41	Set omgevingsvergunning	40,0d	2-1-2026	26-2-2026
42	Procedure omgevingsvergunning	120,0d	27-2-2026	16-9-2026
43	calculatie definitieve begroting	50,0d	27-2-2026	11-5-2026
44	check kosten deskundige	25,0d	12-5-2026	17-6-2026
45	Samenstellen uitvoeringsbesluit	57,0d	26-5-2026	9-9-2026
46	Uitvoeringsbesluit	40,0d	10-9-2026	4-11-2026
47	Ondertekenen realisatieovereenkomst	5,0d	5-11-2026	11-11-2026
48	**NUTS**	**470,0d**	**12-2-2025**	**16-2-2027**
49	Capaciteits check vanuit ontwerp	14,0d	2-6-2025	20-6-2025
50	Besluitvorming noodzakelijke capaciteit	2,0d	10-2-2025	11-2-2025
51	Offerten NUTS	60,0d	12-2-2025	9-5-2025
52	Opdrachtverstrekking NUTS	5,0d	12-5-2025	16-5-2025
53	Engeneering installatie	245,0d	16-5-2025	4-6-2026
54	Werkmappen gereed voor start werk (3 tot 6 maanden)	90,0d	15-6-2026	13-11-2026
55	Aanpassen hoofdtrace in de straat	65,0d	16-11-2026	16-2-2027

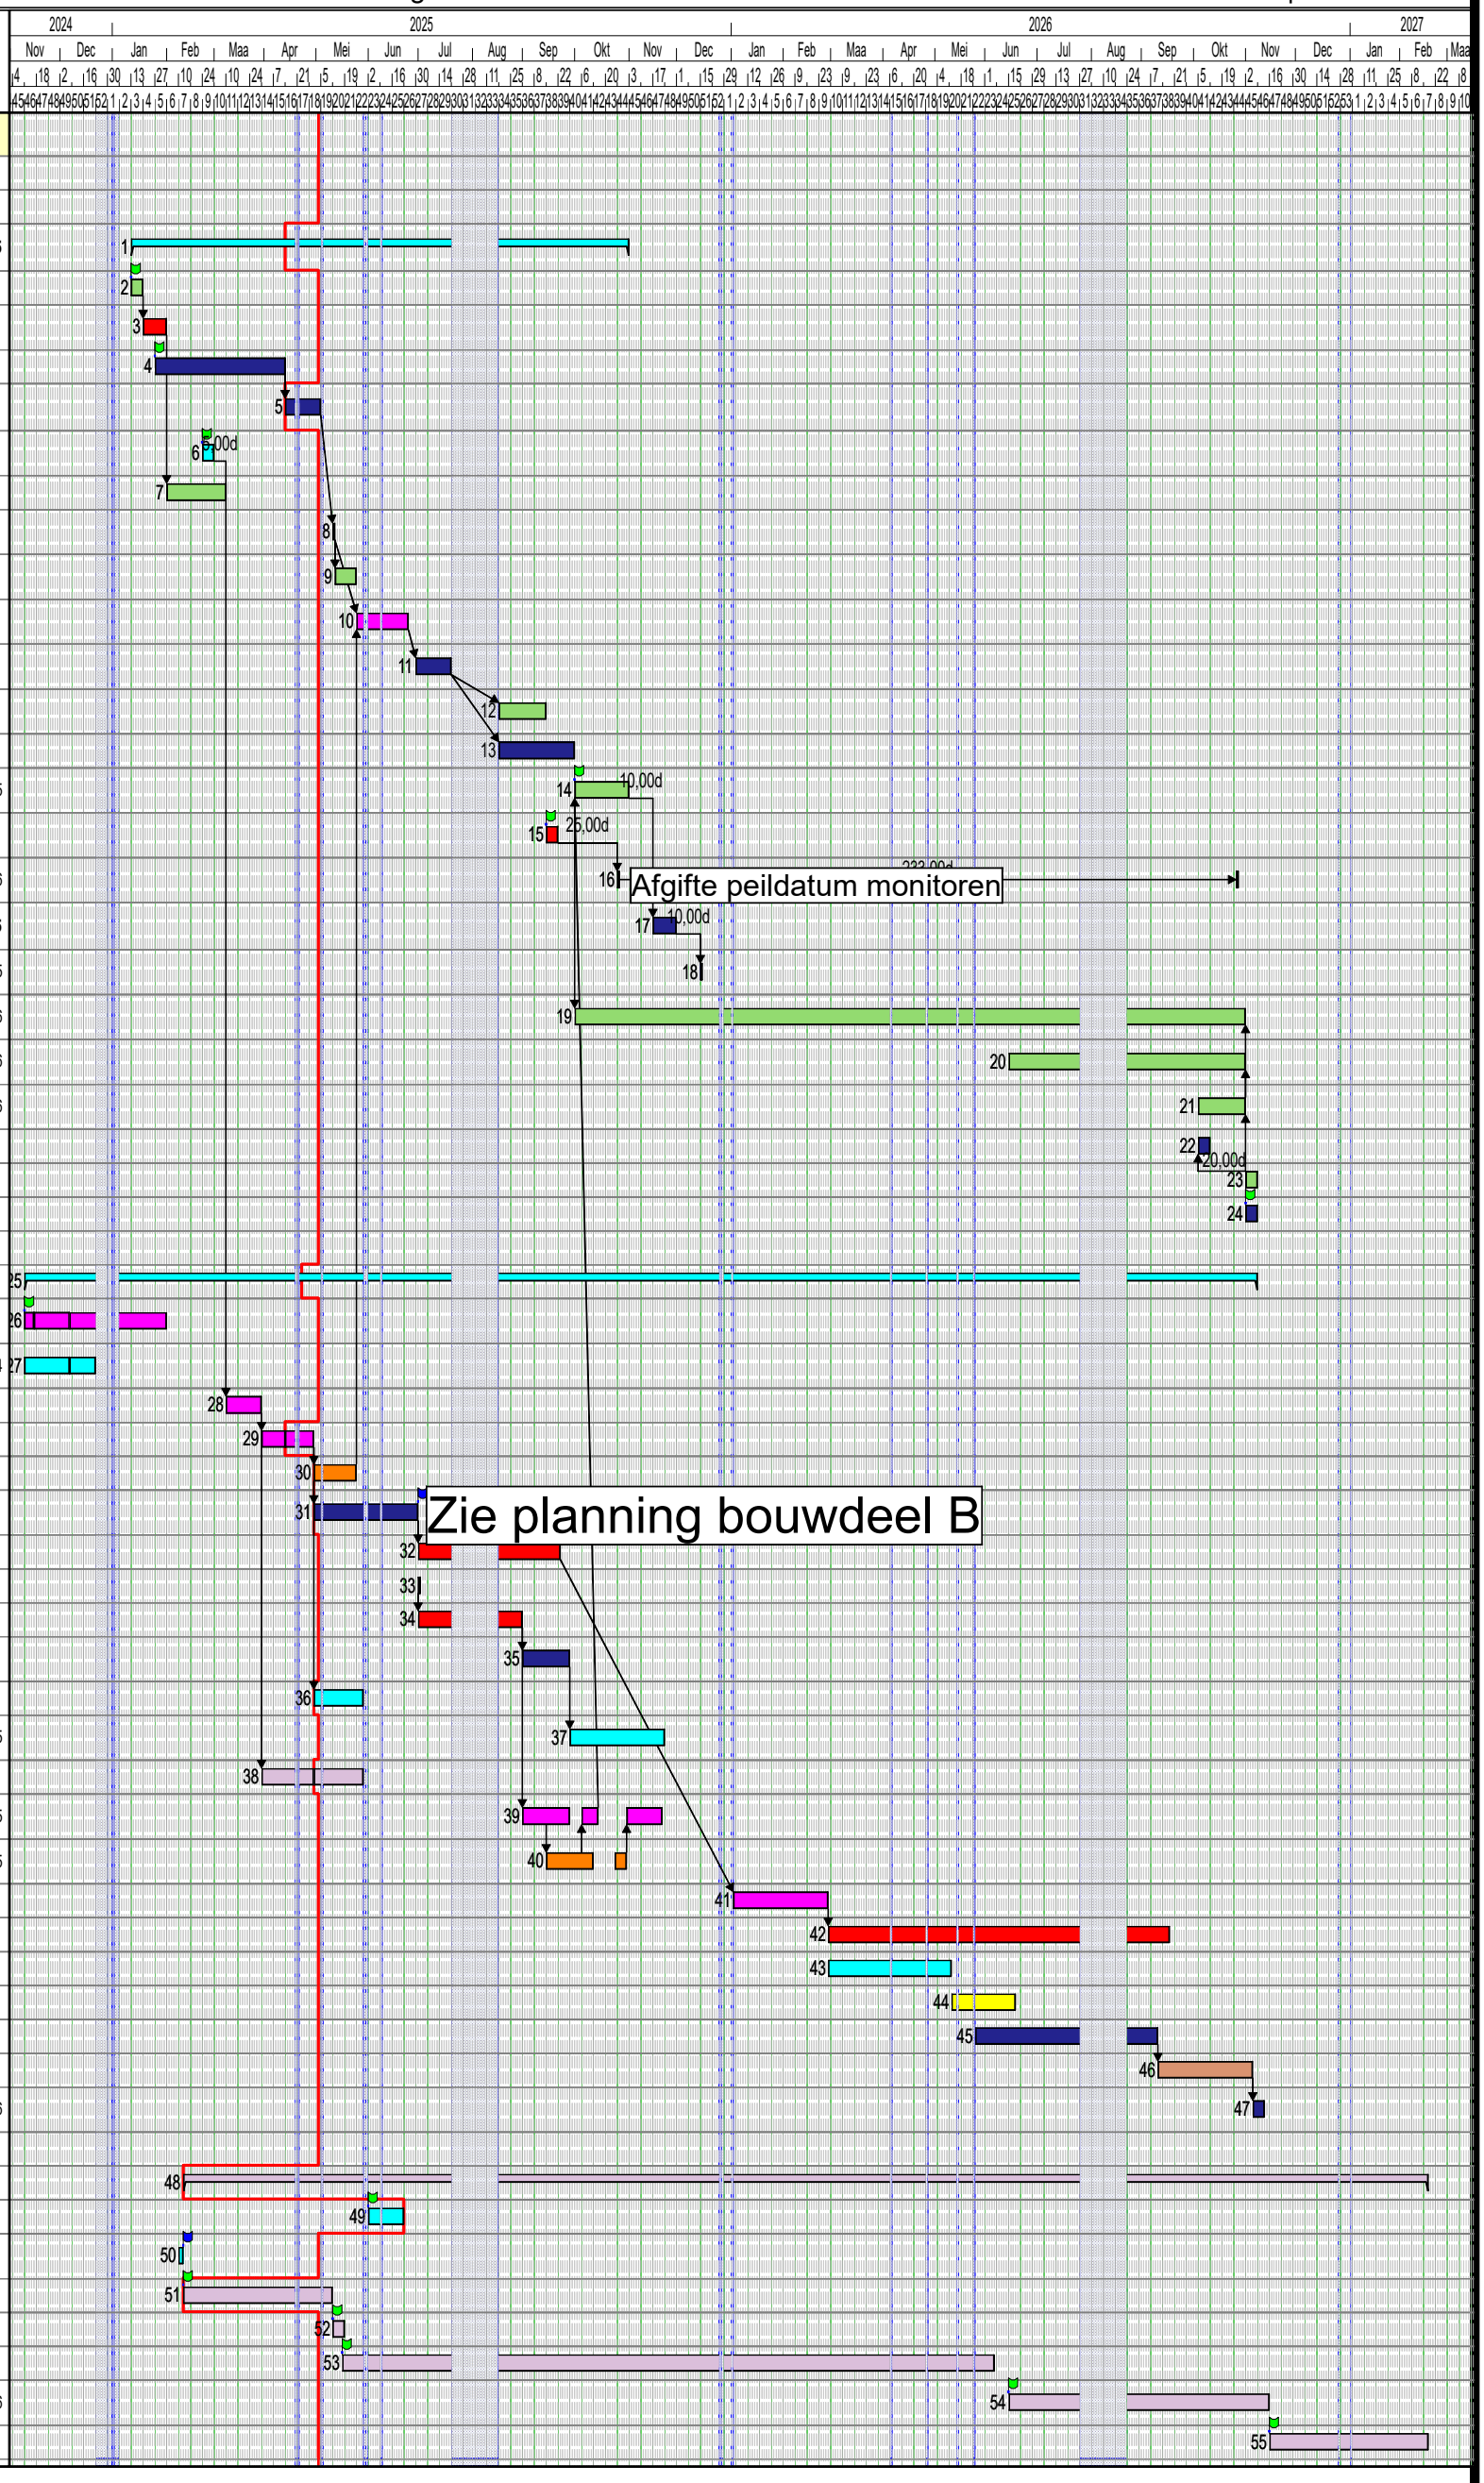

Bouwdelen

Ketenpartner | Bewonersparticipatie | Eigenhaard | Team + Ketenpartner | Architect / tekenbureau | Gemeente / BoWoTo | Constructeur | NUTS | Kosten deskundige | besluiten

Getekend door: JB | Werk Nr. 2401296 | Rev. Nr. | Opm:

Project Ref. G:\Amsterdam\CALCULATIEMAP\CALCULATIEMAP 2024\0000000 - Calculatie Bouwteam EigenHaard\2401296 EH Andreas Bon, Van Musbroekenstraat\00 Planvorming\Planningen\Planning planvoorbereidi
