Collega's,

We hebben in het werkdocument voorgesteld om het proces als volgt te organiseren:

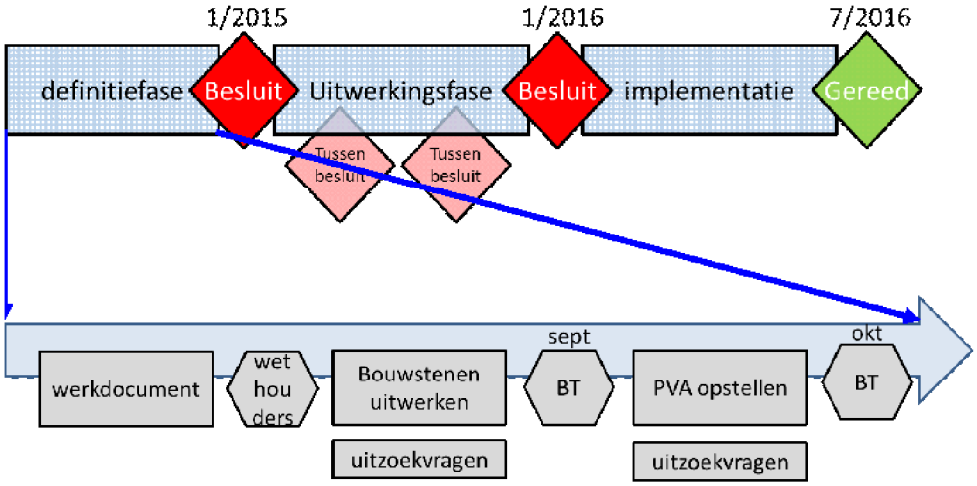

Dat betekent dat we de tijd nemen om de opdracht goed te formuleren. Wellicht lijkt dat in eerste instantie een ruim tijdspad maar dat is het niet omdat we ten behoeve van die definitiefase veel werk moeten verzetten en dat natuurlijk ook zorgvuldig moet omdat we er anders in het vervolgproces tegen aan zullen lopen. Wat moeten we doen:

- Bouwstenen globaal uitwerken (financieel, juridisch, uitvoering) zodat het BT in september een goed besluit kan nemen over de bouwstenen
- Mogelijk zullen er uitzoekvragen op ons af komen naar aanleiding van de bespreking van het werkdocument
- Uitvoeren krachtenveldanalyse
- Uitwerken plan van aanpak, hetgeen betekent dat we inzicht moeten gaan krijgen in wat er precies moet gebeuren per onderdeel, dit vertalen in een planning en bemensing.

In oktober zouden we in staat moeten zijn om een goede voorspelling te doen over de doorlooptijd en de risico's die die doorlooptijd kunnen beïnvloeden.

Ten behoeve hiervan heb ik een eerste lijstje gemaakt van activiteiten voor de komende periode die ik samen met jullie verder wil uitwerken. Vanmiddag vindt ik het belangrijk dat we zorgen dat we de activiteiten bemensen en afspraken maken over de planning.

	projectleider/trekker	betrokkenen	
Organisatie			
regulier inhoudelijk overleg (hele team)			
regulier voortgangsoverleg (kernteam)			
communicatieadviseur			gereed
Planner			uitgezet
Bemensen van de inhoudelijke opgaven			
in beeld brengen externe expertise			
ervaringen andere steden ontsluiten			
evaluatie vorig proces			
in beeld brengen werkgroepen + deelnemers vorig proces			

Bouwstenen, globale uitwerking

Financiele effecten gemeente			
Financiele effecten erfpachter			
Juridische effecten/risico's			
Effecten uitvoerbaarheid (proces, ICT, inzet)			
Effecten op de omgeving (krachtenveld)			

Aanpassing van de AB

bundelen relevante stukken afgelopen proces			
inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

Aanpassing aanvullend beleid

in beeld brengen alle aanvullend beleid incl. eigenaren			
inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

Overstap en overgangsregeling

inventariseren gewijzigd overgangsbeleid vorig proces			
inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

Grondwaarde systematiek

verzamelen opdracht aan vorige cie en andere stukken			
inventarisatie van de activiteiten			
voorstel voor het wervingsproces commissie			
opdrachtomschrijving commissie			
inrichten opdrachtgeverschap gemeente			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

Implementatiescenario's

inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

ICT omgeving geschikt maken

inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			
opstellen planning			

Communicatie

verzamelen communicatiedocumenten vorig proces			
Opstellen communicatiestrategie (in/extern)			
inventarisatie van de activiteiten			
Uitwerken tot uitvoerings communicatieplan			
opstellen planning			

Toetsing en beheersing

inventarisatie van de activiteiten			
inventariseren van de teamleden en PL			
inventariseren externe expertise			
in beeld brengen deelproducten			
in beeld brengen beslismomenten			

Overall planning opstellen, kritieke pad			
Krachtenveldanalyse uitvoeren, vorige krachtenanalyse			
Dwarskijksessie werkdocument organiseren			
Risico analyse uitvoeren			
