Gemeente Amsterdam

Hamerkwartier

Bestemmingsplan A0 t/m A3 eigen Haard

Activiteitnaam	Duur	Begin	Eind	Trekker
Hamerkwartier A0 t/m 3 Eigen Haard	335w	04-Jul-22 A	30-Nov-28	
Bestemmingsplan	79w	01-Feb-23 A	07-Aug-24	
Onderzoeken	26w	01-Feb-23 A	28-Jul-23	
Onderzoek EV, geur, bedrijven en milieuzonering	4w	01-Mrt-23 A	31-Mrt-23 A	Eigen Haard
Onderzoek Verkeersgeneratie	2w	03-Apr-23*	14-Apr-23	Eigen Haard
Onderzoek Bezonning en HER	2w	03-Apr-23*	14-Apr-23	Eigen Haard
Aanpassing onderzoek lucht en geluid (indien nodig)	3w	17-Apr-23*	05-Mei-23	Eigen Haard
Stikstofdepositieonderzoek	3w	17-Apr-23*	05-Mei-23	Eigen Haard
Aanvullend ecologisch onmderzoek	26w	01-Feb-23 A	28-Jul-23	Eigen Haard
Van concept BP naar voorontwerp BP	10w	11-Apr-23	16-Jun-23	
Overleg: bespreken 1e concept (dinsdag 11 april)	0w		11-Apr-23*	Gezamenlijk
Overleg: bespreken 2e concept (dinsdag 25 april)	0w		25-Apr-23*	Gezamenlijk
Overleg: bespreken 3e concept (dinsdag 9 mei)	0w		09-Mei-23*	Gezamenlijk
Overleg: bespreken Concept Voorontwerp (dinsdag 23 mei)	0w		23-Mei-23*	Gezamenlijk
Aanleveren Concept Voorontwerp BP voor interne R&D toets	0w		25-Mei-23*	Eigen Haard
Interne R&D toets	1w	26-Mei-23	05-Jun-23	Amsterdam
Overleg: bespreken interne R&D toets (dinsdag 6 juni)	0w		06-Jun-23*	Gezamenlijk
Aanpassen tot Voorontwerp	2w	07-Jun-23	16-Jun-23	Eigen Haard
Opstellen Bestuurlijke voordracht Wethouder en SD	4w	19-Mei-23	16-Jun-23	Amsterdam
Voorontwerp BP & voordracht gereed voor wethouder	0w		16-Jun-23*	Gezamenlijk
Vrijgave voorontwerp door wethouder	4w	19-Jun-23	17-Jul-23	
Deadline Screening (maandag 17 uur)	0w	19-Jun-23*		Amsterdam
Screening (uitslag vrijdag)	1w	19-Jun-23	23-Jun-23*	Amsterdam
Evt aanpassen stukken	1w	26-Jun-23	30-Jun-23	Gezamenlijk
Aanleveren Bestuurszaken (deadline maandag 9 30uur)	0w	03-Jul-23		Amsterdam
Map Wethouder	0w		04-Jul-23*	Amsterdam
Uitslag Map (Wethouder akkoord)	0w		10-Jul-23*	Amsterdam
Evt aanpassen stukken & 2e map wethouder	1w	11-Jul-23	17-Jul-23*	Amsterdam
Indien nodig Staf RO (3 juli of 17 juli)	0w		17-Jul-23*	Amsterdam
Vooroverleg	15w	19-Jun-23	02-Okt-23	
Publicatie 1.3.1.	1w	12-Jul-23*	18-Jul-23	Amsterdam
Vooroverleg (3.1.1. periode)	6w	19-Jul-23	29-Aug-23	Amsterdam
Participatie ntb	6w	19-Jul-23	29-Aug-23	Amsterdam
Voorbereiden advies Stadsdeel met bestuursadviseur	3w	19-Jun-23	07-Jul-23	Amsterdam
Advies stadsdeel (6wkn excl. reces)	12w	11-Jul-23	02-Okt-23	Amsterdam
Ontwerp bestemmingsplan t/m vrijgave B&W	16w	30-Aug-23	19-Dec-23	
Verwerken reacties vooroverleg & aanpassen BP	9w	30-Aug-23	27-Okt-23	Gezamenlijk
Opstellen bestuurlijke voordracht	3w	09-Okt-23	27-Okt-23	Amsterdam
Ontwerp BP & voordracht gereed voor bestuur	0w		27-Okt-23*	Gezamenlijk
Screening bestuurlijke stukken	1w	30-Okt-23*	03-Nov-23	Amsterdam
Staf en/of map wethouder	2w	06-Nov-23*	15-Nov-23	Amsterdam
Aanleveren aangepaste stukken voor B&W	0w		17-Nov-23*	Amsterdam
B&W besluit (1 na laatste B&W voor kerstreces)	0w		28-Nov-23*	Amsterdam
Indien nodig: laatste mogelijkheid B&W in 2023	0w		19-Dec-23*	Amsterdam
Publicatie ter inzagelegging	1w	29-Nov-23	06-Dec-23	Amsterdam
Start terinzagelegging	0w	07-Dec-23		Amsterdam
Tervisielegging	0w			

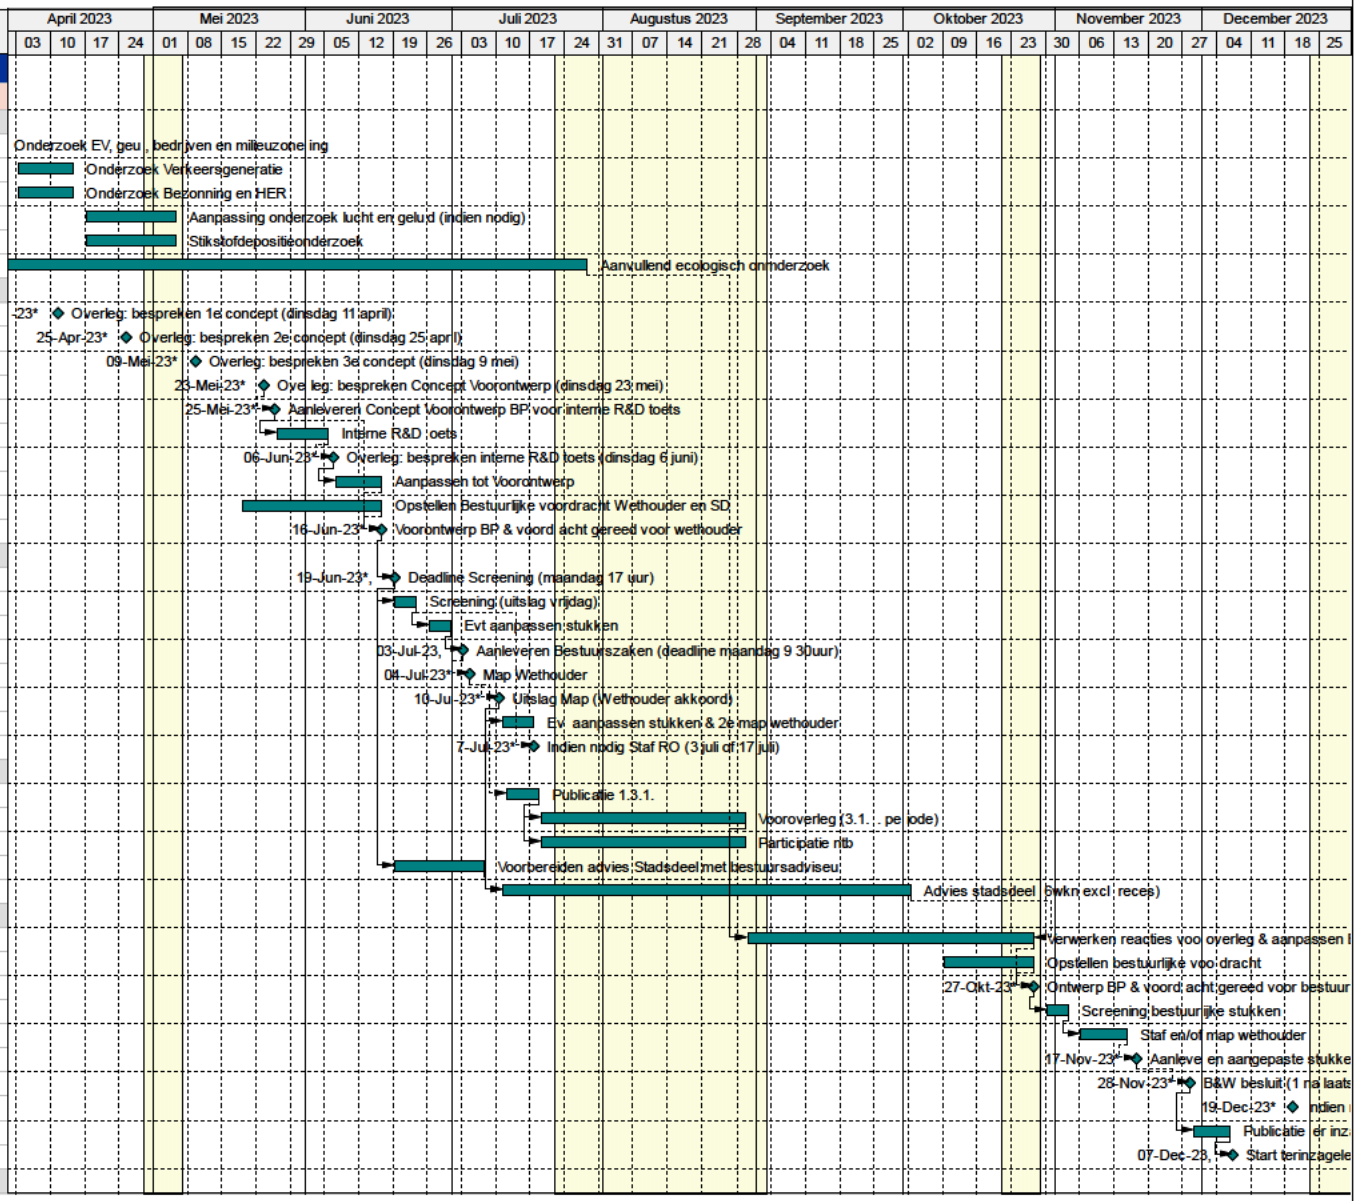

Ontwikkelveld A0 t/m A3 Hamerkwartier
Conceptversie ter bespreking
Aan deze planning kunnen geen rechten worden ontleend.

Werk gepland
Werk gereed
Mijlpaal gepland
Mijlpaal gereed

Planningsadviseur: 5.1-2-e
Printdatum: 30-Mrt-23
Standlijndatum: 01-Apr-23
