

**From:** "5.1.2,e"  
**Sent:** Mon, 23 Jan 2023 09:59:52 +0100  
**To:** "5.1.2,e" <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Subject:** FW: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

5.1.2,e  
5.1.2,e  
Ingenieursbureau

M 5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 16:29  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** RE: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

Hey!

Ik verwacht dat de netwerkeffecten meer aan de oostkant zullen zitten (S100 oost, A10 oost en de s-wegen tussen A10 en S100 aan de oostkant), daar wil je dus echt geen werkzaamheden. Aan de westkant is hoe verder hoe beter:

- Dat maakt de periode na 10 november het meest aantrekkelijk, maar dan wil je wel zeker een week wegblijven van kerstvakantie. Dat geeft je maar 5 weken in plaats van de gewenste 6 weken. Lastig is denk ik dat deze periode richting de sint- en kerstinkopen niet zo best is voor het draagvlak onder de centrumondernemers.
- Daarna de periodes met werkzaamheden aan de Stadhouderskade/Nassaukade (half april tot 20 juli). Hierbij geldt hoe verder de werkzaamheden naar het westen zijn en hoe minder ingrijpend (alleen weekend afsluitingen is natuurlijk niet zo erg) hoe minder de verstoring van het onderzoek. In het geval dat je hier voor gaat is het wel nodig dat je O&K (5.1.2,e) na laat denken over het modelmatig corrigeren van de netwerkeffecten van deze verstoringen. Hij kan het beste inschatten of dat te doen is of niet.
- Met de Amstedijk en/of Berlagebrug gestremd wordt het wel echt moeilijk iets zinvols te zeggen over de Wibautstraat, het is geen absolute no go maar ik denk dat je dat niet moet willen.
- Stremming op de Kattenburgerstraat is inderdaad geen optie, daar verwacht ik aanzienlijke effecten van de knip. Idem voor de werkzaamheden rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, Borneostraat.

Ik mis de oostertoegang in dit overzicht, vanaf wanneer zou die in twee richtingen dicht zijn? Volgens mij willen we dat ook echt niet combineren.

Groet,

5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 15:54  
**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** FW: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2,e

Wil jij alvast een blik werpen op onderstaande tabel van 5.1.2,e Er is eigenlijk altijd wel iets tegelijkertijd met een eventuele pilot, kan jij een inschatting maken welke projecten wel en welke niet gelijktijdig zouden kunnen?

Groet,

5.1.2,e

5.1.2,e

Ingenieursbureau

M 5.1.2,e

---

**Van:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 15:33

**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

Kleine correctie in de tabel.

Van de 4 projecten die in de tabel bij de periode half april tot eind mei staan zijn er namelijk naar verwachting maar 2 in te passen.

Groeten,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

 *Ingenieursbureau Amsterdam*

E-mail: 5.1.2,e@amsterdam.nl

Telefoon: 5.1.2,e

Ingenieursbureau Amsterdam  
Weesperstraat 430, Amsterdam

---

**Van:** 5.1.2,e

**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 15:30


**Aan:** 5.1.2,e <5.1.2,e@amsterdam.nl>

**Onderwerp:** RE: Tijdsslot Pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2,e

Aanvullend over de werkzaamheden bij de Amsteldijk:

Het gaat om het kruispunt Amsteldijk bij de brug en de Amsteldijk ten zuiden daarvan:

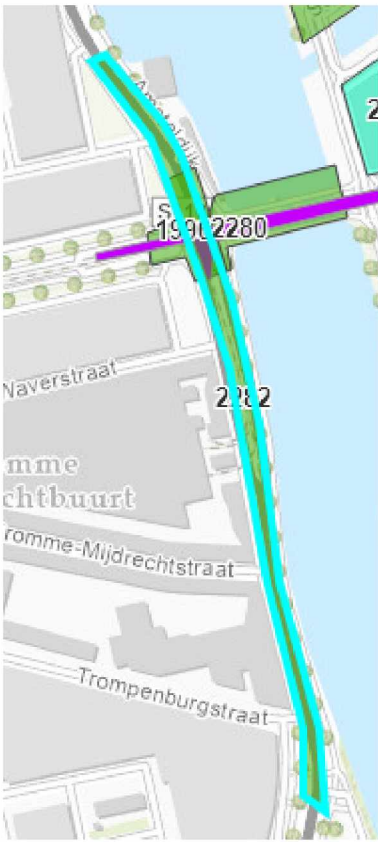

Vanaf 24 juli gaan de Amsteldijk en Berlagebrug vierkant dicht. Je kan dan wel nog vanuit het noorden rechtsaf de Vrijheidslaan op.  
Vanaf 3 september is de Amsteldijk weer beperkt beschikbaar, dat betekent dat er 1 rijbaan in elke richting is (dus 2x1 i.p.v. normaal 2x2, een reductie van 50%)  
Vanaf 10 november is de Berlagebrug weer open en de Amsteldijk weer op volle capaciteit.

En qua projecten eerder in 2023, ik heb de tabel hieronder aangevuld.  
Conclusie is: Er zijn eigenlijk constant wel ergens werkzaamheden op de S100. Ik kan niet inschatten of het samen kan gaan.

Groeten,

5.1.2.e  
5.1.2.e 5.1.2.e

 *Ingenieursbureau Amsterdam*

E-mail: 5.1.2.e [@amsterdam.nl](mailto:5.1.2.e@amsterdam.nl)

Telefoon: 5.1.2.e

Ingenieursbureau Amsterdam  
Weesperstraat 430, Amsterdam

---

**Van:** 5.1.2.e  
**Verzonden:** vrijdag 20 januari 2023 14:24  
**Aan:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**CC:** 5.1.2.e <5.1.2.e@amsterdam.nl>  
**Onderwerp:** Tijdslot Pilot knip Weesperstraat

Hoi 5.1.2.e

Zonet heb ik 5.1.2.e gesproken, ik belde je net om het even toe te lichten. Bij deze per mail.

@ 5.1.2,e mocht ik iets fout zeggen of vergeten, ik hoor het graag.

5.1.2,e heeft gekeken naar de 2<sup>e</sup> helft van 2023 en 1<sup>e</sup> helft van 2024.

- De Berlagebrug en Amsteldijk starten tegelijkertijd. Vanaf 3 september is de Amsteldijk weer beschikbaar (met minder capaciteit). De Berlagebrug blijft tot 10 november gestremd.
- 10 november tot 1 januari staan er geen gekke projecten op de S100 in de omgeving. Wel wordt er vanaf 10 november op de Nassaukade gewerkt t.h.v. de Zaagpoort (brug 161). Het gaat om een volledige stremming.
- In 2024 wordt er veel in Oost gewerkt, rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, en kruising Borneostraat. Ook is er (ik geloof vanaf maart) tot mei werk op de Stadhouderskade.

Periode	Werkzaamheden	Conclusie
Tot eind maart 2023	Kattenburgerstraat gestremd.	Niet mogelijk.
Eind februari – begin april 2023	Stadhouderskade t.h.v. Museumbrug gestremd.	
Half april – eind mei 2023	Naar verwacht maximaal 2 van de volgende 4: 1. Kruising Nassaukade – Kinkerstraat 2. Kruising Nassaukade – Bosboom Toussaintstraat 3. Kruising Nassaukade – Overtoom 4. Kruising Stadhouderskade – Leidseplein	
1 juni – 20 juli 2023	Kruising Stadhouderskade – Van Woustraat Noord	
23 juli – 3 september 2023	Berlagebrug gestremd. Amsteldijk gestremd.	Niet mogelijk.
3 september – 10 november 2023	Berlagebrug gestremd. Amsteldijk beperkte capaciteit.	Extra check nodig door 5.1.2,e bij collega's. Check nodig op impact op data.
10 november – 31 december 2023	Geen projecten op S100 in directe omgeving. S100 (t.h.v. Zaagpoort) volledig gestremd. Kerstvakantie, mogelijk minder/ander verkeer.	Check nodig op: 1) impact kerstvakantie op data, 2) impact stremming Zaagpoort op knelpunten.
1 januari – maart 2024	Werkzaamheden rondom Zeeburgerdijk, Mauritskade, Borneostraat	Niet mogelijk.
Maart – mei 2024	Werkzaamheden aan Stadhouderskade	Niet mogelijk.
Mei 2024 en verder	Nog niet bekeken	Nader uitzoeken.

Groeten,

5.1.2,e

5.1.2,e

5.1.2,e

 Ingenieursbureau Amsterdam

E-mail: 5.1.2,e @amsterdam.nl

Telefoon: 5.1.2,e

Ingenieursbureau Amsterdam

Weesperstraat 430, Amsterdam
