


# Specificatie Wijzigingsprotocol

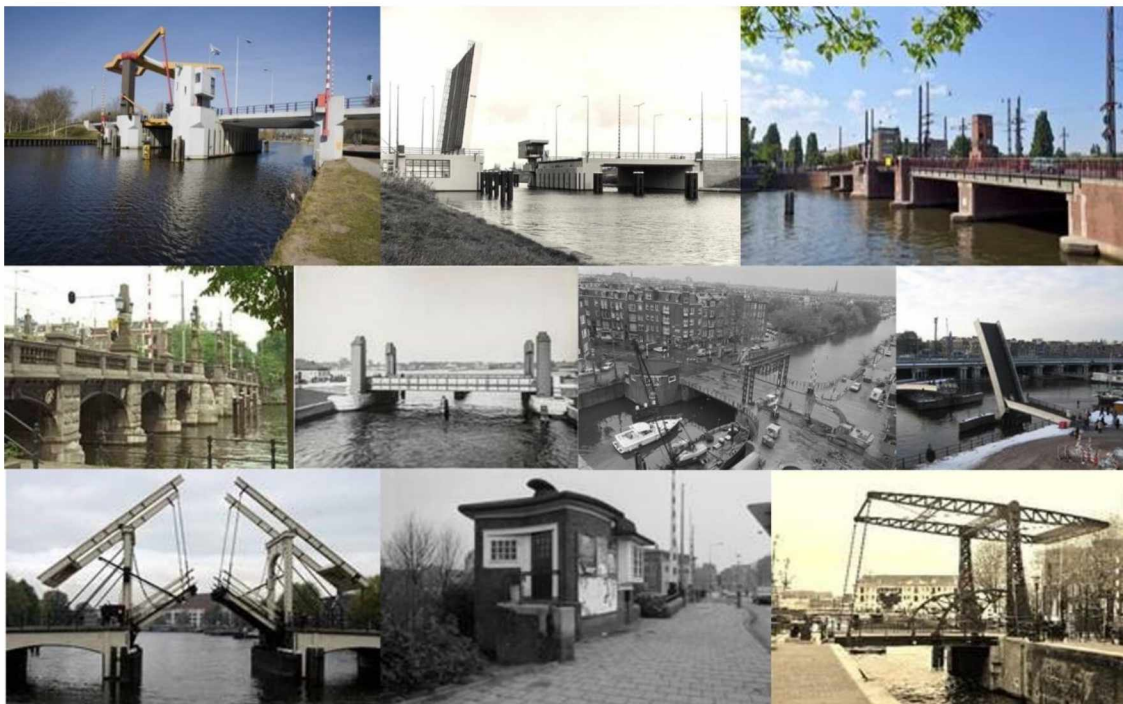

## Documentgegevens

Auteur:	V&OR
Document:	Specificatie Wijzigingsprotocol
Revisie:	F2.0
Status:	Definitief
Datum:	21-8-2019

---

### Algemeen

Projectnaam /Objectnaam

Kenmerk

VTW-nummer

Datum

Titel

Proceseigenaar  
(Superpoortwachter  
Projectbeheersing)

Soort wijziging

Initiator

Dagelijks Onderhoud

Project

Derden

Verkorte weergave aanleiding

Gerelateerde risiconummer(s)  
(vanuit Servoy)

---

### Opstellen en indienen VTW

Opsteller en indiener VTW

Functie	Naam	Datum	Paraaf
<input type="checkbox"/> Teamleider			
<input type="checkbox"/> Werkvoorbereider			
<input type="checkbox"/> Technisch manager			
<input type="checkbox"/> Contractmanager			
<input type="checkbox"/> Bouwmanager			
<input type="checkbox"/>			

Interne toetsing VTW

Functie	Naam	Datum	Paraaf

---

### Toets en Advies VTW

Manager Projectbeheersing	Naam	Datum	Paraaf
Advies	<input type="checkbox"/> Goedkeuren	<input type="checkbox"/> Afkeuren	<input type="checkbox"/> Aanhouden/Escalatie
Korte toelichting integraal advies			

---

### Toets en Advies VTW

#### Geraadpleegde adviseurs/ specialisten

Functie	Naam	Datum	Paraaf
Financieel adviseur			
Planningsadviseur			
Scope-adviseur			
Kostendeskundige			

---

### Besluit VTW

Functie	Naam	Datum	Handtekening
<input type="checkbox"/> Projectmanager			
<input type="checkbox"/> Assetmanager			
Beperkende voorwaarden	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja	Namelijk:	

---

### Algemene kenmerken VTW

Aard van de VTW	<input type="checkbox"/> Technische wijziging	<input type="checkbox"/> Anders namelijk
	<input type="checkbox"/> Claim ( <i>naam</i> )	
Is dit voorstel reeds eerder in een overleg besproken	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja ( <i>naam overleg + datum</i> )	
Leidt goedkeuring van deze VTW tot het aangaan van verplichtingen jegens derden ( <i>aannemer, ingenieursbureau</i> )	<input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> Ja ( <i>naam derde/ contractnummer</i> )	
Aanleiding tot deze VTW en voorgestelde oplossingsrichting t.b.v. wijziging	<i>(Waarom deze wijziging?/ waar vloeit deze wijziging uit voort?)</i>	
Overig ( <i>Vrije tekst</i> )		

---

### Effect op SCOPE

<input type="checkbox"/> Geen effect
<input type="checkbox"/> Wijziging technische werking/component
<input type="checkbox"/> Werken voor derden
Toelichting op technische effecten

---

### Effect op TIJD

<input type="checkbox"/> Geen effect
<input type="checkbox"/> Wijziging mijlpalen ( <i>PBI-besluiten of geplande startdatum uitvoering of geplande einddatum uitvoering</i> )
<input type="checkbox"/> Wijziging planning, zoals door college van B&W/gemeente is vastgesteld
Toelichting op tijd-effecten

---

### Effect op KWALITEIT

<input type="checkbox"/> Geen effect
<input type="checkbox"/> Wijziging kwaliteit
<input type="checkbox"/> Wijziging kwaliteit, zoals door college van B&W / gemeente is vastgesteld

---

**Effect op KWALITEIT**

---

---

**Effect op Geld**

---

Geen effect

Wel effect

Onderbouwing

Schatting

Kostenraming

Offerte

Second Opinion

Bedrag in € exclusief BTW

Prijspijl

Bandbreedte

Financiering/dekking van de  
wijziging

Onttrekking budget Stadswerken

Onttrekking budget V&OR

Derden, namelijk .....

Extra middelen Gemeente Amsterdam

Budget neutrale overheveling binnen project

anders, namelijk .....

Toelichting op de geldeffecten

---

**Effect op RISICO**

---

Geen effect

Wel effect

Toelichting op (kwalitatieve  
beschrijving van) verandering van  
het risico

**Beheersmaatregel:**

---

**Bijlagen (bijvoorbeeld raming, planning, kaart of overeenkomst derden)**

---

1

2
